

T.C.
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ



2011 MALİ YILI
FAALİYET RAPORU



”...Hususi idareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını arttıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin ederek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salâhiyetlerini tam kullanmalıdır.”

K. Atatürk

SUNUŞ

İl Özel İdareleri; bir yandan 5302 sayılı kanun ve diğer kanunlarla kendilerine verilen görevleri yürütürken, bir yandan da merkezi idarenin ilimizdeki yatırımlarını yürütmektedir. İl Özel İdareleri; bir mahalli idare birimi olmanın ötesinde genel idare kuruluşlarının neredeyse tüm yatırımlarını planlayan, programlayan, ihale edip uygulayan ve canlı yeni bir yapıya kavuşturmaktadır.

İl Özel İdaresi, ildeki yaşam kalitesini ve refah seviyesini yükseltmek için; görev ve sorumluluk alanında bulunan yerel kalkınmaya yönelik tüm hizmetleri etkin ve verimli olarak sunmayı vizyon ve misyon edinmiştir.

Diğer taraftan da hizmetlerin sunulmasında, ihtiyaç odaklı, şeffaf, hesap verilebilir ve ulaşılabilir bir İl Özel İdaresi ile Bartın'ımızı geleceğe taşımak hedeflenmiştir. İl Özel İdaresi hedeflerini gerçekleştirirken yaptığı tüm faaliyetlerini, kanunların ve diğer mevzuatların yanında ayrıca kalite yönetim sisteminin getirdiği ilke ve standartlar ışığında hayata geçirmiş ve uygulamaya koymuştur.


Bu anlayışla hazırlanan İl Özel İdaresi 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu, İl Genel Meclisimizde görüşülüp değerlendirilecek ve kamuoyuna da duyurulacaktır. Böylelikle; sunulan hizmetler ve rapor, halkımız tarafından da incelenecek ve halkımızın faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. İl Özel İdaresinin bir yıllık süreçte gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri bu tür raporlarla ortaya koyması ve kamuoyuna sunması, faaliyet sonuçlarını çok daha verimli hale getirecektir.

Böylece; 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu, siz değerli İl Genel Meclis Üyelerimizin ve halkımızın talep, öneri ve eleştirilerine sunulacak ve konu hakkındaki görüşleriniz değerlendirilerek, ileriki zamanlarda yapılacak olan hedef, plan, program ve çalışmalarımıza ışık tutacaktır.

2011 mali yılı faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde ve hizmetlerin sunumunda, yapılan tüm iş ve işlemlerdeki başarılı çalışmalardan dolayı İl Genel Meclisimizin Değerli Başkan ve Üyelerine, İl Encümen Üyelerine, kaymakamlıklara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür ederim.

Bundan sonrada, ilimizin kalkınmasına yönelik olarak yapılacak hizmetler için, daha ileri düzeyde hedefler belirlenmesinde ve bu hedeflere ulaşabilmek adına yapılacak olan tüm çalışmalarda başarılar diliyorum.

İsa KÜÇÜK
Vali

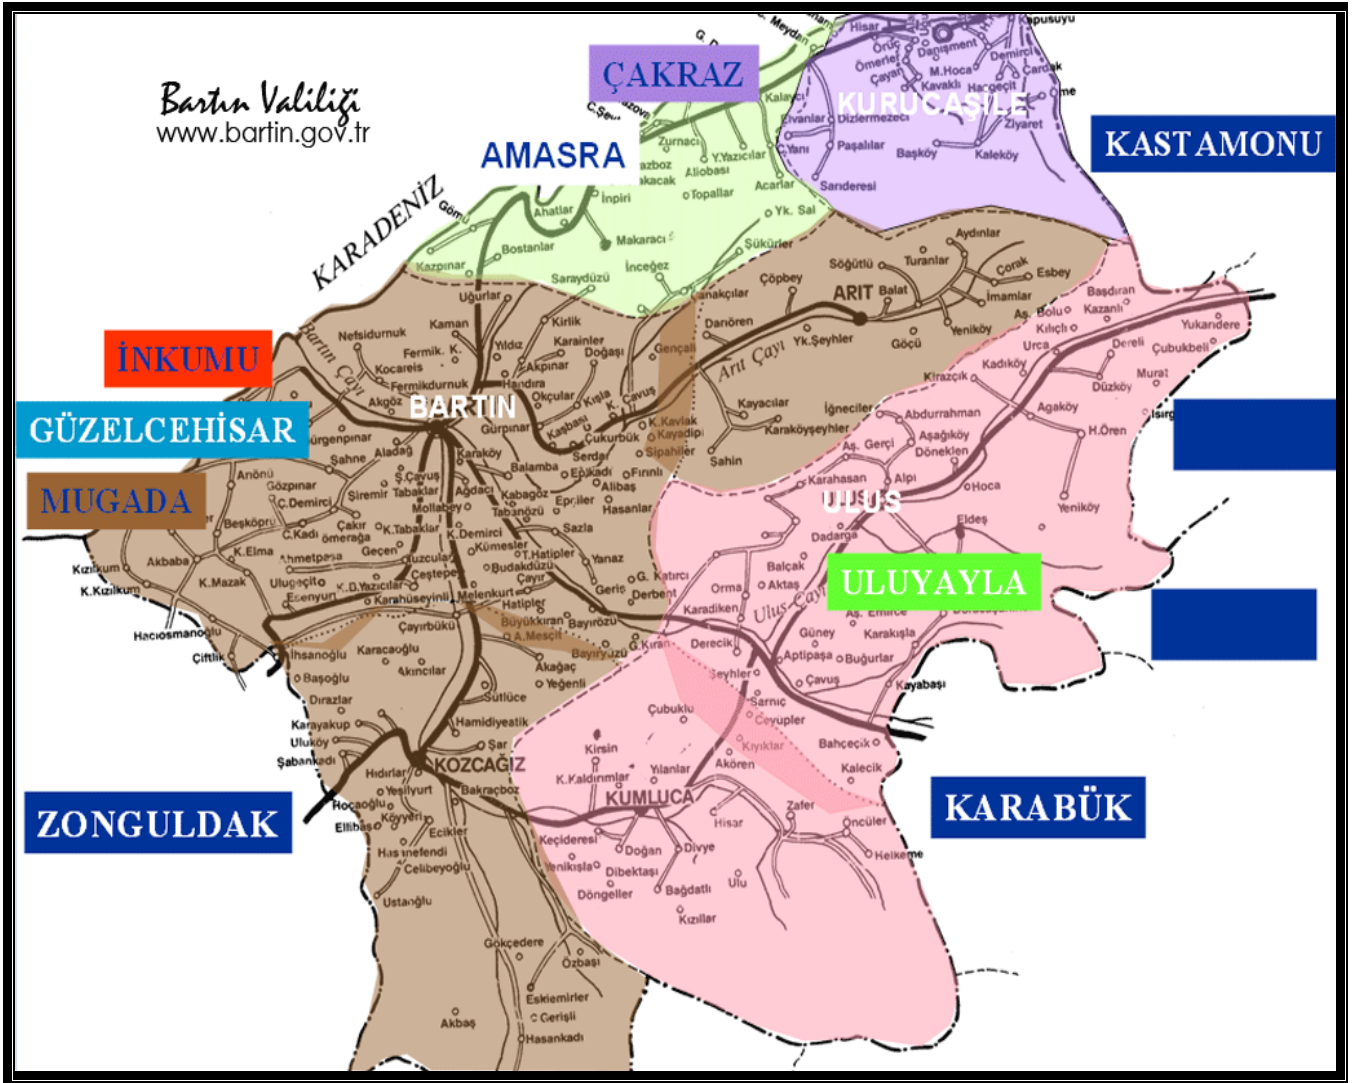

Bartın İlimiz 07.09.1991 tarih ve 20984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.08.1991 tarih ve 3760 sayılı kanun ile il statüsüne kavuşmuştur.

Bartın İlimizin;

- Merkez İlçe, Amasra İlçesi, Kurucaşile İlçesi ve Ulus İlçesi olmak üzere 4 adet İlçesi,
- Arıt, Kozcağız, Kumluca, Abdipaşa ve Hasankadı Belde Belediyeleri ile birlikte 9 adet belediyesi,
- 262 adet de köyü vardır.

Bartın ilinin nüfusu 187.291 olup, nüfusun % 35,16'ü (65.856) şehirde, % 64,84'si (121.435) kırsal kesimde yaşamaktadır.

2011 MALİ YILI

İDARE FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I- İİ ÖZEL İDARESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon	1
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
C- İdareye İlişkin Bilgiler	2
1- Fiziksel Yapı	2
2- Örgüt Yapısı	3
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynakları	5
4- İnsan Kaynakları	7
5- Sunulan Hizmetler	7
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	10
D- Diğer Hususlar	11

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri	11
B- Temel Politikalar ve Öncelikler	13

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları	13
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	13
3- Mali Denetim Sonuçları	17

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

▪ Mali Hizmetler Müdürlüğü	18
▪ Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	20
▪ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	29
▪ Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	32
▪ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	39
▪ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	59
▪ Dış İlişkiler Müdürlüğü	66
a) Eğitim Faaliyeti	
b) Gençlik ve Spor Faaliyeti	
c) Emniyet Faaliyeti	
d) Jandarma Faaliyeti	
e) Kültür ve Turizm Faaliyeti	
▪ Encümen Müdürlüğü	85
▪ Yazı İşleri Müdürlüğü	87
▪ Sağlık İşleri Müdürlüğü	93
a) Sağlık Faaliyeti	
b) Sosyal Hizmet Faaliyeti	
▪ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	99
▪ Hukuk Müşavirliği	103

2- Performans Sonuçları Tabloları

▪ Dış İlişkiler Müdürlüğü	105
a) Eğitim Hizmetleri Performans Sonuçları Tablosu	
b) Kültür ve Turizm Hizmetleri Performans Sonuçları Tablosu	
c) Spor Hizmetleri Performans Sonuçları Tablosu	
d) Emniyet Hizmetleri Performans Sonuçları Tablosu	
▪ Yol ve Ulaşım Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu	109
▪ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu	110
▪ Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu	111
▪ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu	115
▪ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu	116
▪ Sağlık İşleri Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu	119

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

EKİ:

İç Kontrol Güvence Beyanı (14 adet)

I- İL ÖZEL İDARESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Görev alanlarımızdaki hizmetlerimizi; mevzuatlar ve ISO 9001 Uluslar arası Kalite Yönetim Sistemi standartları doğrultusunda sunmak ve halkın refah seviyesini yükseltmektir.

VİZYONUMUZ

AKTİF KATILIMCI,
İHTİYAÇ ODAKLI,
VERİMLİLİK ESASLI,
HESAP VERİLEBİLİR VE ULAŞILABİLİR
BİR ÖZEL İDARE İle BARTIN'I GELECEĞE TAŞIMAKTIR.

İLKELERİMİZ

İl Özel İdaresi, tüm personeli ile hizmet verdiği halkımızın beklentilerine karşılık verebilmek için;

Liderlik	Eşitlik ve adalet
Dürüstlük	Kalite duyarlılığı
Şeffaflık	Hizmette standardizasyon
İş ahlakı	Sürekli gelişme
Çağdaşlaşma ve ilerıcilik	Etkili ve ekonomik

olarak belirlediğimiz ilkelerimiz doğrultusunda özverili bir şekilde çalışmaktadır.

B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Sağlık, Gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- FİZİKSEL YAPI


Bartın İl Özel İdaresi Hizmet Binası



İl Özel İdaresinin Merkez İlçede 1 adet İl Özel İdaresi Hizmet Binası ve Vali Konağı Hizmet Binası, 2 adet Memur Lojmanı Binası, 3 adet kiraya verilen binası, 1 adet İl Özel İdaresi Eski Hizmet Binası, Kurucasıle ve Ulus İlçelerinde Hizmet Binası ve Kaymakam Lojmanları Binaları, 1 adet Amasra Kaymakam Lojmanı, ilçeler dahil 4 adet Şantiye Binası bulunmaktadır. Merkez İlçe Ağdacı Köyü mevkiinde 1 adet Hizmet Binası ve Sosyal Tesis Binası ve bunun dışında İnkumu Mevkiinde İl Özel İdaresi Eğitim ve Dinlenme Tesisi mevcuttur. Ayrıca; 1 adet Arıt Şehit Necdet İ.Ö.O. Memur Lojmanı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binası mevcuttur.


2- ÖRGÜT YAPISI

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

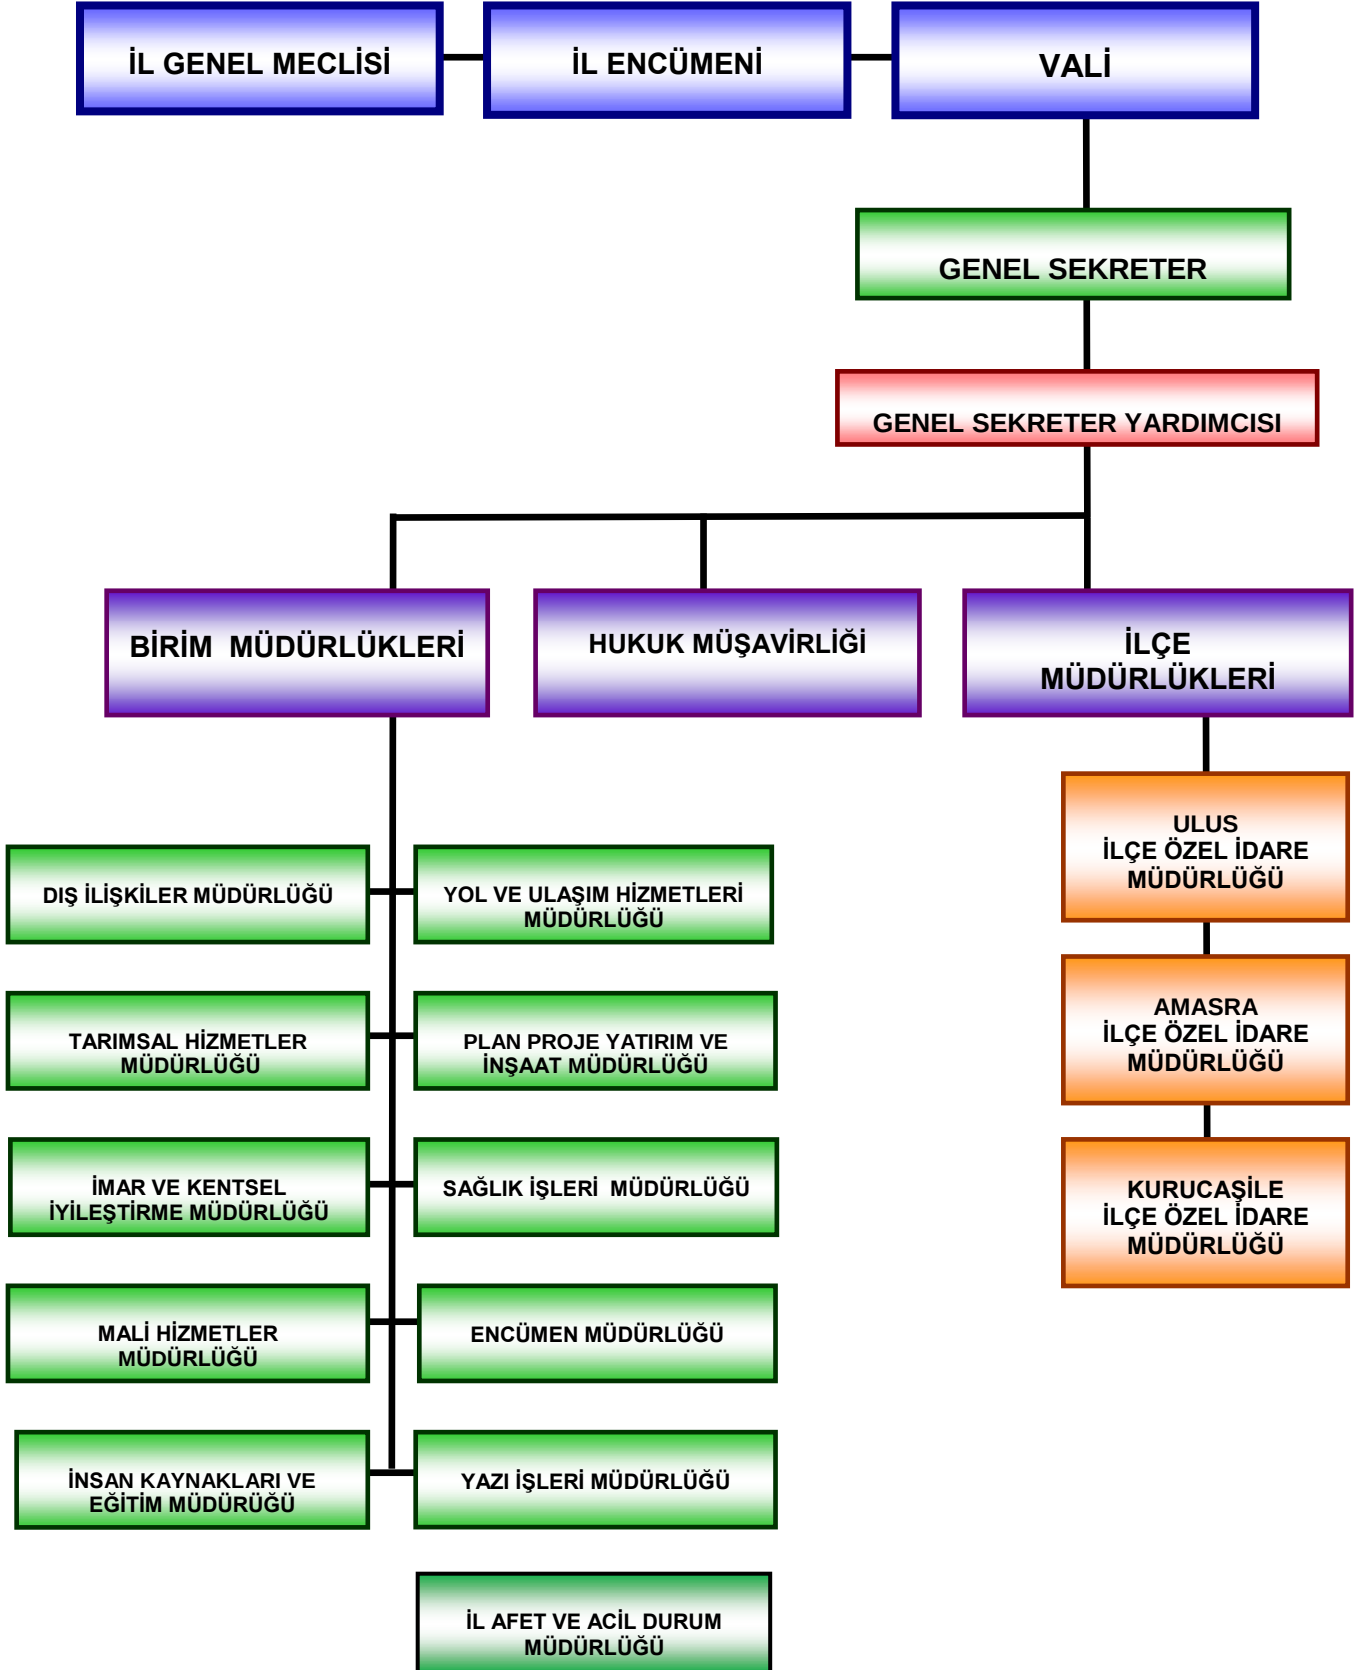

İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI:

İl Özel İdaresinin organları; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali'dir. İl Genel Meclisi ve İl Encümeni karar organı, Vali ise yürütme organıdır. Karar ve icra organları görev ve yetkileri kapsamında işlevlerini sürdürmekte ve hizmetlerini yürütmektedir.

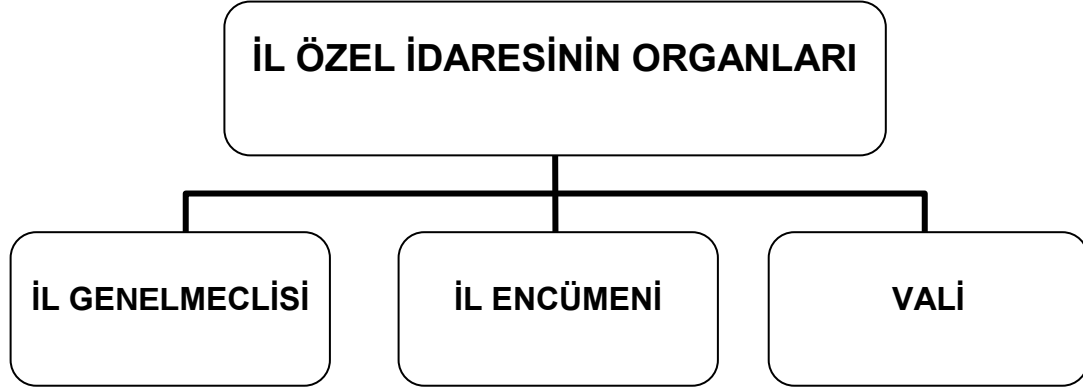

İL GENEL MECLİSİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun İl Genel Meclisi başlıklı 9. maddesi gereğince, İl Genel Meclisi İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri, meclis başkanlık divanı, meclis toplantıları, gündem, toplantı karar yeter sayısı, meclis kararlarının kesinleşmesi, İhtisas komisyonları ve denetim komisyonları v.b. konular 5302 sayılı kanun ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde açıklanmıştır.

İLÇELER :	Üye Sayısı
Merkez İlçe	5
Amasra İlçesi	2
Kurucaşile İlçesi	2
Ulus İlçesi	2
TOPLAM:	11

İL ENCÜMENİ:

İl Encümeni Valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. İl Özel İdaresinin icra organıdır.

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. İl Encümeni, Valinin başkanlığında, **5 seçilmiş üye ve 5 atanmış üye olmak üzere 11 üyeden oluşmaktadır.**

İl Encümeni Seçilmiş Üyeleri:

İlçeler :	Üye Sayısı
Merkez İlçe	3
Amasra İlçesi	-
Kurucaşile İlçesi	1
Ulus İlçesi	<u>1</u>
TOPLAM:	5

İl Encümeni Memur Üyeleri:

Mali Hizmetler Müdürü
Encümen Müdürü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Dış İlişkiler Müdürü
Tarımsal Hizmetler Müdürü olmak üzere
TOPLAM : 5

VALİ:

Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. İl Özel İdaresinin icra organıdır. Hizmetlerin, diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon vali tarafından sağlanır. Vali, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, vali yardımcılara, yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileri ile ilçelerde kaymakamlara devredebilir. Vali, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

3- BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Bartın İl Özel İdaresi sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili tüm çalışmalarını kamuoyuna duyurmak üzere elektronik ortama taşıyarak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşlarımızın hızlı ve aracısız bir şekilde bilgi almalarını sağlamak üzere Web sayfası kurulmuştur.

İdareimizce, 2006 yılında itibaren uygulanan Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Programı ve İhale işlemlerinde kullanılan DİYOS İhale Programı kullanılmaktadır.

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan e-İçişleri (e-Bakanlık) Projesi, İl Özel İdareimizin yürütmüş olduğu tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılması ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla idareimiz tarafından kullanılmaktadır.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

KAYNAĞIN ÇEŞİTİ	KAYNAĞIN ADEDİ
Masa Üstü Bilgisayar	95
Dizüstü Bilgisayar	25
Yazıcı	75
Tarayıcı	21
Fotokopi Makinesi	6
Teksir Makinesi	1
Faks Cihazı	3
Projeksiyon	2
Dijital Kamera	2
Fotoğraf Makinesi	4

Ayrıca, etüt ve proje hizmetlerinde kullanılan teknik nitelikte ve kalibrasyona tabi cihazlar mevcut olup, teknik cihazların çeşitleri ve adetleri aşağıda belirtilmiştir.

Etüt ve Proje Kaynakları

ÇEŞİTİ	ADEDİ
Hp designjet 500 ps prother yazıcı	1
Leica marka arazi ölçüm cihazı	1
Nivo arazi ölçüm cihazı	1
Mlr marka gps	1
Magellan marka gps	1
Arazi ölçümünde kullanılan mira	4
Arazi ölçümünde kullanılan leica marka aletin reflektörleri	3

Araçlara Ait Envanter Cetvel

Kullanıldığı Yer	Binek	Toplu Taşıma Araçları	Kamyon / Kamyonet	İş Makineleri	TOPLAM
Valilik Hizmetleri	4	--	--	--	4
İl Özel İdaresi Hizmetleri	7	3	38	56	104
TOPLAM	11	3	38	56	108

Gayrimenkullere Ait Cetvel

Sıra No	Bulunduğu Yer	Gayrimenkulün Cinsi		TOPLAM
		Bina	Arsa-Arazi	
1	Merkez İlçe	26	18	44
2	Amasra İlçesi	5	7	12
3	Kurucaşile İlçesi	5	-	5
4	Ulus İlçesi	7	1	8
TOPLAM		43	26	69


4- İNSAN KAYNAKLARI

Merkez ve ilçeler itibariyle idarelerimizde;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi toplam 119 adet kadro bulunmaktadır. Bu kadrolardan, dolu kadro sayısı **46 adet** ve boş kadro sayısı ise 73 adettir.

- 4857 sayılı İş Kanununa tabi toplam **118 adet daimi işçi** görev yapmaktadır.

- **16 adet sözleşmeli personel** çalışmaktadır.

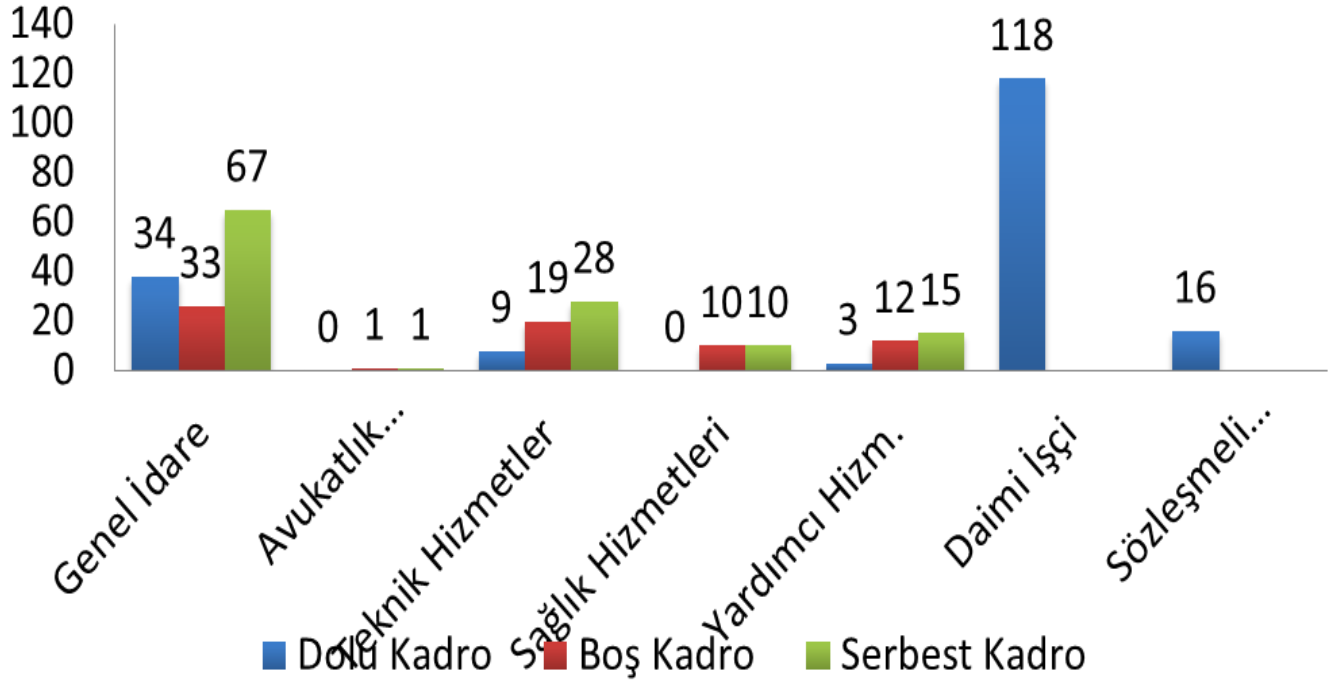

Merkez ve 3 İlçe Özel İdaresi dâhil 119 mevcut memur kadrosu bulunmakta olup, Bu kadroların 67'si Genel İdare Hizmetleri, 1'i Avukatlık Hizmetleri, 28'i Teknik Hizmetler, 10'u Sağlık Hizmetleri ve 15'i Yardımcı Hizmetlerdir. Dolu kadro sayısı 46 ve boş kadro sayısı 73'dir. İdarelerimizde ayrıca, 118 daimi işçi 16 Sözleşmeli Personel kadro karşılığı çalıştırılmaktadır. **Memur, işçi ve sözleşmeli personel çalışan kişi sayısı toplamda 180 personeldir.**

5- SUNULAN HİZMETLER

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 6 ncı maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklarımız ile diğer mevzuatlar gereği yapmak zorunda olduğumuz görev ve sorumluluklarımız için yapılan tüm iş ve işlemler ile yürütülen hizmetler, tabi olduğumuz kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ v.b. hükümlerine göre yerine getirilmektedir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Özel İdaresi teşkilatı başlıklı 35. maddesi gereğince, İdarelerimizde genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, encümen, yazı işleri, yol ve ulaşım, plan proje yatırım ve inşaat, dış ilişkiler ve hukuk işleri birimleri kurulmuştur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi İl Genel Meclisinin Kararıyla yapılmıştır. Ayrıca, İlçelerde, Özel İdare işlerini yürütmek amacıyla Kaymakama bağlı olarak Amasra, Kurucaşile ve Ulus İlçe Özel İdare Müdürlükleri kurulmuştur.

İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanarak 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda idarelerimizde kurumsallaşma tamamlanmıştır..

İl Özel İdaresinin kadrolarının iptali, ihdası ve değiştirilmesi İl Genel Meclis kararıyla yapılmakta, İl Özel İdaresi personeli vali tarafından atanmakta ve ilk toplantıda İl Genel Meclisinin bilgisine sunulmaktadır.

İlimiz İl Özel İdaresi kadroları, 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda oluşturularak İl Genel Meclisine sunulmuş, İl Genel Meclisinin muhtelif tarih ve sayılı kararıyla gerekli ihdaslar yapılmıştır.

Hukuk Müşavirliği

- İdarenin tüm birim müdürlükleri tarafından talep edilen konularda hukuki görüş vermek.
- İdareye ait her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra işlemlerini ait olduğu yargı organı ve dairelerde ikame ve takip etmek.
- İdare ve bağlı birimlerin ihale kanunları ve ihale sözleşme tasarıları ile ilgili inceleme yapmak ve görüş bildirmek.
- Her türlü yargı organı ve icra daireleri ile noterler tarafından İl Özel İdaresi'ne izafeten İl Özel İdaresi Tüzel Kişiliği'ne yapılan tebligatları kabul ile gereğini yerine getirmek.
- Sendika ile toplu iş sözleşmeleri görüşmelerine katılmak.
- Vali, Genel Sekreter ve mevzuatın verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak
- Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili, stratejik plan doğrultusunda aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.
- Birimi ile ilgili dönemler halinde Faaliyet Raporları hazırlamak ve Üst Makama sunmak,
- Birimi ile ilgili dönemler halinde Birim Performans Planını hazırlamak ve Üst Makama sunmak,
- Birimi ile ilgili Yıllık Yatırım Programı hazırlamak ve Üst Makama sunmak.

İlçe Müdürlükleri

- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda hizmetleri yürütmek.
- 5018 sayılı kanun gereği muhasebe yetkilisi görevlerini yürütmek.
- Mevzuat gereği, Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.
- İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek.
- İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak.

Birim Müdürlükleri

1) Mali Hizmetler Müdürlüğü

- Muhasebe Hizmetleri
- Bütçe
- Gelir
- Taşınır ve Taşınmaz İcmal Hesabı
- Stratejik Plan
- Ön Mali Kontrol

2) Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

- Yol ve Ulaşım Hizmetleri
- Satın alma
- Makine İkmal Bakım ve Onarım
- Maden İşleri
- KÖYDES Projesi

3) İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

- İmar İskân
- Çevre Koruma, Kontrol
- KUDEP
- Emlak
- Binalar
- Yapı Ruhsat Kontrol ve Denetim

4) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

- Veterinerlik
- Bitki Koruma
- Kontrol ve Destek
- Hayvan Sağlığı
- Çiftçi Eğitim
- Toprağın Korunması ve Erozyon
- Tahlil ve Analiz
- Sulama İşleri
- İşyeri Ruhsat ve Denetim
- Park ve Bahçe İşleri
- İçme suyu hizmetleri

5) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

- Özlük
- Atama
- Personel İşleri
- Eğitim
- Bilgi İşlem - BİMER
- Basın ve Halkla İlişkiler
- İşçi Sağlığı ve Güvenliği
- Mikro Kredi

6) Dış İlişkiler Müdürlüğü

- Eğitim Hizmetleri
- Gençlik ve Spor Hizmetleri
- Kültür ve Turizm Hizmetleri
- Emniyet Hizmetleri
- Jandarma Hizmetleri
- Çevre ve Orman Hizmetleri
- Sanayi ve Ticaret Hizmetleri
- Organize Sanayi Hizmetleri

7) Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

- İnşaat inceleme ve kontrol
- Makine inceleme ve kontrol
- Elektrik inceleme kontrol
- Etüt-Proje
- Yapı Kontrol ve Denetim
- İçme suları inceleme kontrol
- Köylere Yardım

8) Encümen Müdürlüğü

- İl Encümeni iş ve işlemleri

9) Yazı İşleri Müdürlüğü

- İl Genel Meclisi iş ve işlemleri
- Evrak Kayıt İşlemleri
- Arşiv
- Özel Kalem İş ve İşlemleri
- Sosyal Tesisler

10) Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü

- Sağlık Hizmetleri
- Sosyal Hizmetleri

11) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Ön Malî Kontrol başlıklı 58 inci maddesi

“Ön Malî Kontrol Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar.

Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

Kamu idarelerinde ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.

Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak asgarî kontroller, malî hizmetler birimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacak malî karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığınca belirlenir. Kamu idareleri, bu standart ve yöntemlere aykırı olmamak şartıyla bu konuda düzenleme yapabilir. “ hükmü,

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin Ön Mali Kontrol Süreci başlıklı 12 inci maddesi “ Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemten önceki işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur.” hükmü gereğince, idareimizce Süreç Akış Şeması düzenlenmiştir.

İdareimiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenerek, Valilik Makamının 15.01.2008 tarih ve 246 sayılı Olur’ları ile yürürlüğe giren Süreç Akış Şemasına göre, mali hizmetler ve harcama birimlerince yapılan iç kontrol ve ön mali kontrol işlemleri devam etmektedir.

D- DİĞER HUSUSLAR

17 Haziran 2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun ilgili hükümlerine göre; idaremiz bünyesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kurulmuştur. Müdürlüklerin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır. Harcamalarda, İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine verilen yetkiler vali tarafından kullanılır. Müdürlüklerin personel harcamaları ve personel ile ilgili diğer harcamaları Başkanlık bütçesinden karşılanır.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça belirlenir. Başkanlıkça belirlenecek norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak bu müdürlüklerin kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin işlemler, il özel idarelerinin tabi olduğu hükümler çerçevesinde yürütülür. Ancak, İl Özel İdarelerinde kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin olarak İl Genel Meclisine verilmiş olan yetkiler, bu müdürlükler açısından valiler tarafından kullanılır ve bu müdürlüklerin kadroları, il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir.

2011 Mali Yılı Performans Planı, Yatırım ve Çalışma Planı ve Gider Bütçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün plan, program ve ödeneği yer almaktadır.

Ayrıca; 6111 sayılı kanun hükümleri gereğince, idaremizde görev yapmakta olan 51 adet daimi işçinin muhtelif kuramlara atanmaları ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır.

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

KURUMSAL YAPILANMA	1- Kurumda tüm çalışanların yetkinliklerini, bilinç düzeylerini, organizasyon ve yönetme kabiliyetlerini, kişisel gelişimlerini, araç ve gereç kullanma artırmak, bilinç düzeylerinin Liderlik uygulamalarını üst düzeye çıkarmak amacıyla, işlerin zamanında etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi için yöneticilerin otoritelerini, yaptırım güçlerini ve iş yaptırma yeteneklerini artırmak. 2- Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu kamunun ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla bina yapımı ve onarımı, tesisat bakım onarım çalışmaları yürütülecektir.

BEŞERİ KALKINMA	1- Yoksullara özellikle kadınlara küçük sermayeler vererek gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak. 2- Korunmaya,bakıma veya yardıma muhtaç aile çocuk sakat,yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine süratli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak. 3- Eğitimle ilgili yatırım ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak, mevcut bina, tesislerin bakım ve onarımını yapmak. 4- İlimizde spor faaliyetlerini daha geniş kitlelere yaymak,spor tesisi sayılarını ihtiyaçlar doğrultusunda çoğaltmak,mevcut spor tesislerimizi günümüz şartlarına uygun hale getirmek için bakım, onarım ve tamiratlarının yapılarak hizmete sunup,daha çok federasyon spor faaliyeti organize edip,ilimize maddi ve manevi spor turizmi girdisini artırmak. 5- İl’de sosyal, kültürel ve sanat yaşamını zenginleştirmek ve kent kültürünü geliştirmek; unutulmaya yüz tutmuş folklorik değerleri araştırarak tespitini yapmak ve güncel yaşama kazandırmak. 6- Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gereklerine uyumlu, kır- kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır. 7- Afet öncesi hazırlığı ve müdahaleyi etkili kılmak, Afet Yönetiminde bireylerin kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almalarını vurgulamak, Sivil Savunma hizmetlerinde gönüllü personellerin artırılarak afet çalışmalarında başarı grafiğinin yükseltilmesini sağlamak. 8- Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması
KIRSAL KALKINMA	1- İnsan sağlığını ön planda tutan ,çevreyle uyumlu kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek. 2- Ulusal Tarım Politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. Kent–kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir. 3- Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsalda kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. 4- Kent ve çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemlerinin oluşturulması, kaçak yapılaşmayı maksimum düzeyde engellemek sureti ile kontrollü ve yerel mimari özelliklere bağlı estetik kaygı gözeterek yapılaşmanın aynı düzeyde sağlanması

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

İl Özel İdaresinin görev alanındaki hizmetlerimizi tabi olduğumuz mevzuatlar doğrultusunda sunmak ve halkın refah seviyesini yükseltmek temel politikamızdır. İl Özel İdaremiz kıt kaynaklarına rağmen, yapmış olduğu tüm hizmetleri tecrübeli ve bilinçli personeli ile yürütmekte ve modern bir Bartın için çalışmalarını sürdürmektedir. Hizmetlerimizin etkili, ekonomik ve verimli olabilmesi için; ihtiyaçlarımızdan öncelikli olanları tespit etmekte ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütmekteyiz. Bartın İlinin, sosyal, ekonomik, turizm ve tarım potansiyeli göz önünde bulundurularak, nüfus projeksiyonlarına göre temel politikalarımızın önceliklerini belirlemek.

Ayrıca, İl Özel İdaresi olarak, Stratejik Plan, Performans Planı, Çalışma ve Yatırım Programı, Faaliyet Raporları, Denetim Raporları, yapılan iş ve işlemler ile yürütülen hizmetler İdaremiz sitesinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2011 mali yılı tahmini bütçesi 18.445.000,00 TL. olarak düzenlenmiş, önceki yıldan devir olunan 11.982.157,69 TL. Bakanlıklardan tahsisli olarak aktarılan ödenek 32.305.037,02 TL olmak üzere 2011 yılı itibariyle toplam 62.824.194,71 TL. bütçe ödeneği gerçekleşmiş ve % 73,51 oranında harcama yapılmıştır.

2011 mali yılına ait gelir, gider ve ödeneklerle diğer mali bilgileri içeren tablolar aşağıda sunulmuştur.

5- Temel Mali Politikalara İlişkin Açıklamalar

GELİR - GİDER BÜTÇESİ BİLGİLERİ

GİDERLER		GELİRLER	
Personel Giderleri	5.664.052,76	Vergi Gelirleri	-
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	712.763,44	Sermaye Gelirleri	3.119.000,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.980.142,72	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	861.000,00
Faiz Giderleri	10.000,00	Alınan Bağış ve Yardımlar	-
Cari Transferler	1.514.722,00	Diğer Gelirler	14.465.000,00
Sermaye Giderleri	7.007.594,08		
Sermaye Transferleri	-		
Borç Verme	40.000,00		
Yedek Ödenekler	515.725,00		
Toplam	18.445.000,00		18.445.000,00

GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ 4. DÜZEY GERÇEKLEŞMESİ

01.6.9.99	Diğer Harçlar	7.885,00
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	39.022,90
03.1.2.36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	13.808,62
03.1.2.59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	148.515,17
03.1.2.60	Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler	69.697,00
03.1.2.99	Diğer hizmet gelirleri	42.612,50
03.6.1.01	Lojman kira Geliri	83.105,94
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	384.950,42
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	1.194.751,59
05.2.1.03	Madenlerden Devlet Hakkı	152.504,59
05.2.2.51	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	12.464.759,82
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	27.808,64
05.3.4.01	Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	4.231,04
05.3.9.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	74.777,68
05.9.1.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	1.756,80
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	4.316,97
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	503.705,70
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		15.218.210,38
04.2.1.51	Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan	1.414.512,00
04.2.1.99	Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	15.063.640,08
04.2.2.01	Hazine yardımı	3.405.642,00
04.2.2.52	Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan	3.200.134,00
04.2.2.99	Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	7.965.650,48
04.4.2.02	Kişilerden alınan yardım ve bağışlar	93.000,00
04.5.2.09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	32.826,47
05.2.4.99	Diğer Harcamalara Katılma Payları	1.151.849,85
DIŞ KAYNAKLAR TOPLAMI		31.177.135,03
GENEL TOPLAM		46.395.345,41

2011 MALİ YILI GİDER CETVELİ

KOD	GİDER TÜRÜ	BÜTÇE ÖDENEĞİ	2011 YILI TOPLAM ÖDENEK	ÖZ KAYNAK HARCAMASI	ORANI %	DIŞ KAYNAK HARCAMASI	ORANI %	TOPLAM HARCAMA	ORANI %
1	PERSONEL GİDERLERİ	5.664.052,76	13.007.356,29	5.006.958,47	33	8.593.277,19	28	13.600.235,66	29
2	SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	712.763,44	2.311.279,94	824.085,16	5	1.348.745,09	4	2.172.830,25	5
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.980.142,72	11.375.096,83	2.753.404,37	18	8.542.276,32	28	11.295.680,69	24
4	FAİZ GİDERLERİ	10.000,00	29.672,64	9.301,08	0	20.409,45	0	29.710,53	0
5	CARİ TRANSFERLER	1.514.722,00	1.596.576,70	746.683,83	5	22.898,40	0	769.582,23	2
6	SERMAYE (Yatırım) GİDERLERİ	7.007.594,08	28.533.371,36	5.877.670,69	39	12.388.520,96	40	18.266.191,65	40
7	SERMAYE TRANSFERLER	-	-	-	-	-	0	-	0
8	BORÇ VERME	40.000,00	19.500,00	-	-	-	0	-	0
9	YEDEK ÖDENEK	515.725,00	-	-	-	-	0	-	0
GENEL TOPLAM		18.445.000,00	56.872.853,76	15.218.103,60	100	30.916.127,41	100	46.134.231,01	100

GELİR – GİDER İCMAL CETVELİ		
GELİRİN ÇEŞİDİ	GELİR	GİDER
ÖZ KAYNAK	15.218.210,38	15.218.103,60
DIŞ KAYNAK	31.177.135,03	30.916.127,41
TOPLAM KAYNAK	46.395.345,41	46.134.231,01

HARCAMLARA AİT ÖZET BİLGİ

ÖZ KAYNAK HARCAMALARI İCMALİ		
PERSONEL GİDERLERİ	5.831.043,63	% 38
CARİ GİDERLER	3.316.273,45	% 22
SERMAYE (Yatırım) GİDERLERİ	6.070.786,52	% 40
TOPLAM	15.218.103,60	% 100

DIŞ KAYNAK HARCAMALARI İCMALİ		
PERSONEL GİDERLERİ	9.942.022,28	% 32
CARİ GİDERLER	8.545.209,76	% 28
SERMAYE (Yatırım) GİDERLERİ	12.428.895,37	% 40
TOPLAM	30.916.127,41	% 100

NOT: Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünden devredilen memur ve işçi personellerin giderlerinin tamamı Maliye Bakanlığı tarafından dış kaynaktan karşılanmayıp, 1/3 oranında İl Özel İdaresi tarafından öz kaynaktan karşılanmaktadır.

NOT: İlköğretim Kurumları ile Ortaöğretim Kurumlarının taşınmalı eğitim giderleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dış kaynaktan karşılanmakta ve cari giderler içerisinde yer almaktadır.

TOPLAM HARCAMALARI İCMALİ		
PERSONEL GİDERLERİ	15.773.065,91	% 34
CARİ GİDERLER	11.861.483,21	% 26
SERMAYE (Yatırım) GİDERLERİ	18.499.681,89	% 40
TOPLAM	46.134.231,01	% 100

2011 YILI YAPILAN YATIRIMLAR

SEKTÖR	ÖDENEK	HARCAMA	ORAN (%)
İL ÖZEL İDARESİ	4.218.351,74	1.850.284,00	84
İL ÖZEL İDARESİ (Yol-İçme suyu)	3.991.405,59	3.899.758,26	70
KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ	3.948.499,43	3.670.975,17	93
SPOR HİZMETLERİ	92.320,84	69.086,13	75
EĞİTİM HİZMETLERİ	8.554.495,85	2.374.596,30	28
SAĞLIK HİZMETLERİ	1.279.776,51	296.857,21	23
SOSYAL HİZMETLER	90.000,00	85.904,10	95
ÇEVRE ORMAN HİZMETLERİ	91.740,00	0	0
EMNİYET	161.217,01	161.024,75	100
İL AFET VE ACİL DURUM	73,44	0	0
OSB	500.000,00	0	0
GENEL TOPLAM	22.927.880,41	12.408.485,92	54

3-Mali Denetim Sonuçları:**Dış Denetim:**

İL Özel İdaresinin 2009 mali yılı dönemine ait gelir-gider ve 12 aylık ödeme evrakları Sayıştay Başkanlığınca talep edilmesi sonucu, idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce, denetlenmek üzere 18.06.2010 tarih ve 3574 sayılı yazı ile Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. Denetim sonucu düzenlenen Denetim Raporu idaremize ulaşmış, ilgililerce savunma yapılmış ve temyize gidilmiştir.

İç Denetim:

5302 sayılı yasanın Denetim Komisyonu başlıklı 17 inci maddesi gereğince, 2010 mali yılı gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemleri İL Genel Meclisi Denetim Komisyonu tarafından 2011 yılı içerisinde denetlenerek, 14.03.2011 tarihli denetim raporu İL Genel Meclis Başkanlığını bilgilendirilmek ve görüşülmek üzere Nisan 2011 ayı toplantı oturumuna sunulmuştur.

Ayrıca; 2011 mali yılına ait gelir-gider, hesap iş ve işlemlerinin denetimi, İL Genel Meclisi Denetim Komisyonu tarafından devam etmektedir.

Denetim Sonucu:

İL Özel İdaresi iş ve işlemleri ile ilgili yapılan her türlü iç ve dış denetim sonucu düzenlenen denetim raporları ve sorgularda konusu suç teşkil eden herhangi bir olay ile karşılaşılmamıştır.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği gibi diğer yönetmelik, genelge ve tebliğlerle idaremize verilen görev, yetki ve sorumluluklar dan mali konularla ilgili tüm iş ve işlemler, kayıtlar, raporlar ve planlar birimimizce yürütülmektedir. Ayrıca, birimlere talepleri halinde yazılı ve sözlü olarak görüş verilmekte ve yine talepleri üzerine mali konularda gereken destek gösterilmektedir.

Birimimiz; Muhasebe, Bütçe ve Gelir bölümlerinden teşkil etmekte ve birimimizde tüm işler ve verilen hizmetler 1 müdür, 1 şef ve 5 personel olmak üzere 7 adet personel tarafından yürütülmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Mali Hizmetler Birimi başlıklı 60 ıncı maddesinde Mali Hizmet Biriminin görevleri aşağıda sıralanmıştır.

- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

- Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

- İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

- Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

- Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

- Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

- İl Özel İdaresi 2010 Mali Yılı Yönetim Dönemi Hesabı birimimizce düzenlenerek, 11.02.2011 tarihinde Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur.
- İl Özel İdaresi 2010 Mali Yılı Kesin Hesabı İl Genel Meclisinin 06.05.2011 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Kesin Hesap Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur.
- İdareimiz harcama birimlerinde düzenlenen Birim Faaliyet Raporları, konsolide edilerek İl Özel İdaresi 2010 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu düzenlenmiş, İl Genel Meclisinin 07.03.2011 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilerek, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur.
- İl Özel İdaresi 2009-2013 yıllarını kapsayan 5 Yıllık Stratejik Planı hazırlanmış ve İl Genel Meclisinin 09.10.2009 tarih ve 67 karar sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Ancak, yürürlükteki Stratejik Planda güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan, üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine katkı ve görüşleri alınarak güncelleme yapılmış ve İl Genel Meclisinin 22.11.2011 tarih ve 73 Sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.
- İl Özel İdaresi 2012 Mali Yılı Performans Planı düzenlenerek, İl Genel Meclisinin 29.11.2011 tarih ve 75 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
- İl Özel İdaresi 2012 Mali Yılı İl Özel İdaresi Bütçesi hazırlanarak, İl Genel Meclisinin 30.11.2011 tarih ve 76 sayılı kararı ile de kabul edilmiş ve 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
- İl Özel İdaresi 2012 Mali Yılı İl Özel İdaresi Yatırım ve Çalışma Programı birimimizce hazırlanarak, 26.11.2011 tarih ve 74 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile kabul edilmiştir.
- Birimimizce, idareimiz harcama birimlerinden gelen tüm gelir-gider iş ve işlemleri ile diğer mali iş ve işlemler Maliye Bakanlığı Say-2000i sistemine aylık olarak girilmektedir.
- 2011 mali yılı içerisinde mevzuat gereği 435.129,98 TL.'lik kanuni pay ödemesi yapılmıştır.
- İlimiz Merkez ve İlçelere bağlı toplam 311 adet köy ve mahalle muhtarlarına ait ödenekler birimimizce bordroları düzenlenmek suretiyle banka hesap numaralarına yatırılmıştır.
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak çıkarılan "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar" gereğince birimimizce tüm harcamalara ilişkin Ödeme Emri Belgeleri ve Muhasebe İşlem Fişleri ile eki kanıtlayıcı belgeler üzerinde harcama öncesi "Ön Mali Kontrol" görevi birimimizce yerine getirilmektedir.
- Mali Hizmetler Birimince, 2011 mali yılı sonu itibariyle 5.085 adet yevmi yenin kaydı yapılmıştır.
- Ödenek Gönderme Belgesi düzenlenerek, mali yıl sonu itibariyle merkez ve ilçelere gönderilen ödenek tutarı 46.188.242,01 TL'dir.
- Ay sonu, mali yılbaşı, mali yılsonu, devreden ve imha edilen ödenek iş ve işlemleri, aktarılan ve gönderilen ödenekler, gelir kayıtları, gelir-ödenek kayıtları, taşınır mal iş ve işlemleri, emanet hesaplarına alınma ve reddi yatlar, teminat mektubu alınma ve iadeleri, avans verilmesi ve mahsup işlemleri, icra, temlik ve haciz işlemleri, vergilerin ve diğer kanuni kesintilerin ödenmeleri gibi tüm mali iş ve işlemler birimimizce yürütülmekte ve elektronik ortamda çalışmakta olduğumuz bakanlık programına girilmektedir.

- YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Yerel yönetimlerin öneminin artmasıyla mahalli müşterek nitelik olmak kaydıyla vatandaşlara en yakın noktada hizmet götürmeyi en uygun yöntemlerle kendine ilke edinmiş olan müdürlüğümüz devlet ve il yolları dışında kalan köy yollarını, bağlı yerleşim birimlerinin yollarının yapımını, bakımını, onarımını, gerektiğinde asfaltlayarak standardının yükseltilmesini, sanat yapılarını, köprülerini yapmak ve yaptırmakla görevlidir.

Müdürlüğümüzce 2011 yılı içerisinde;

- İl Genelinde İl Özel İdaresi ve KÖYDES Programı kapsamında, 99,05 km. ve geçen yıldan devreden 24,3 km. olmak üzere toplam 123,35 km. I. Kat Asfalt Kaplama işinin tamamı,

- 14 km. 2. Kat Asfalt Kaplama işinin 7 km.'lik bölümü tamamlanmıştır. Gerekli olan mal ve malzeme temin edilerek ambarlarımızda muhafaza edilmektedir.

- 500 km. Stabilize Greyderli Reglaj işi tamamlanmıştır.

- 2.000 km. kar mücadelesi programı ilimizde fazla kar yağışı olmadığından İl Genel Meclisi kararı ile programdan çıkarılmıştır. Ancak kar yağışı nedeniyle 880 km. kar mücadelesi yapılmıştır.

- 302,3 km asfalt tamiri işinin 250,3 km'si tamamlanmıştır. Gerekli olan mal ve malzeme temin edilerek ambarlarımızda muhafaza edilmektedir.

- 6 km. Sıcak Asfalt Kaplama işi tamamlanmıştır.

- 182,85 km. Stabilize yapım işinin 178,05 km. si tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Gerekli olan mal ve malzeme temin edilerek ambarlarımızda muhafaza edilmektedir.

- Stabilize Malzemeli Bakım 32 km. tamamlanmıştır.

- Büz-Sanat Yapıları 2x2x0,75 ebatında 32 adet Bax, 1.100 m Q 60' lık, ve 1.200 m Q 40' lık geçme muflu beton büz alınarak köy yolları alt yapısında kullanılmıştır.

- Köy Yollarına Trafik Levha Yapımı işi tamamlanmıştır.

- Hanyeri Menfez Yapımı işi tamamlanmıştır.

- Münferit İşler kapsamında 59 köyde mevsimsel ve bölgesel şartlar nedeniyle meydana gelen acil bakım işleri (heyelan, çökme v.b.) yapılmıştır.

- Ulukaya Köyü köprü yapım inşaatı % 70 seviyesinde tamamlanmıştır. DSİ teknik raporu ve komisyon kararına göre iş fesh edilmiştir.

- Acil Eylem Planı çerçevesinde programa alınan 2 km lik 0+000 – 2+000 km arası Bartın-Safranbolu Double Yol Toprak Tesviye İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri işi tamamlanmıştır.

- Organize Sanayi Bölgesi Köprü Yapımı işi % 45 oranında tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

- Ulupınar Buğurlar Yediocak Değirmenyanı Köprü Tabyası işi İl Genel Meclisi kararı ile programdan çıkarılmıştır.

- Yol Çizgi Makinası Alımı işi tamamlanmıştır.

- Akbaş Köyü Yol yapım çalışmaları tamamlanmıştır.

- Köprü ve Tünel Etüt ve Proje Giderleri İhale işlemleri 2012 yılına devredildi.

İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM ÇALIŞMALARI

İLÇE	MERKEZ	ULUS	AMASRA	KURUCAŞİLE	TOPLAM (KM)
1. Kat Asfalt	44,5	13,4	2,5	1,5	61,9
Sıcak Asfalt	3	1			4
Münferit İşler	Münferit İşler kapsamında 59 köyde mevsimsel ve bölgesel şartlar nedeniyle meydana gelen acil bakım işleri (heyelan, çökme v.b.) yapıldı.				
OSB. Köprü Yapımı	Organize Sanayi Bölgesi Köprü Yapımı işi % 45 oranında tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.				
Stabilize Greyderli Reglaj	500 km Stabilize Greyderli Reglaj işi yapılmıştır.				500
Stabilize	96,2 km. Stabilize yapım işinin 91,4 km. si tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Gerekli olan mal ve malzeme temin edilerek ambarlarımızda muhafaza edilmektedir.				
Kar Mücadelesi	2.000 km kar mücadelesi programı ilimizde fazla kar yağışı olmadığından İl Genel Meclisi kararı ile programdan çıkarılmıştır. Ancak kar yağışı nedeniyle 880 km. kar mücadelesi yapılmıştır.				880
Büz Sanat Yapısı	200 m Q 60' lık, ve 300 m Q 40' lık geçme muflu beton büz ve 12 adet Bax alınarak yol altyapı ve standardının yükseltilmesinde kullanılmıştır.				
Ulukaya Köyü Yaya Köprüsü Yapımı	Ulukaya Köyü Betonarme Köprü İnşaatı % 70 seviyelerine gelmiş olup, DSİ 'nin yazılarına istinaden durdurulmuş ve fesih işlemi gerçekleştirilmiştir.				
Bartın-Safranbolu 0+000-2+000 Km Double Yol Yapım İş	Acil Eylem Planı çerçevesinde Bakanlık ödeneği ile yapımına başlanan Bartın Safranbolu Double Yolu km 0+000 – 2+000 arası toprak tesviye ileri, sanat yapıları ve üst yapı işleri tamamlanmıştır.				

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜ N ADI	PRO JE NO	PROJENİN ADI	PROJENİ N YERİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
								NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerçl. %	FİZİKİ Gerçl. %	
1	Ulaştırma	1	1.Kat Asfalt Yapımı (63,8 km.)	İl Geneli	2.679.600,00		2.679.600,00	2.679.600,00	100	100	66 proje kapsamında; 63.8 km. 1.Kat asfalt yapım işi planlanmış olup, yıl içinde yapılan revizeler sonucunda 63 proje kapsamında 62,3 km. I.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır.
2	Ulaştırma	2	Stabilize Yapımı (95,7 km.)	İl Geneli	2.058.675,00		2.058.675,00	2.058.675,00	100	94	98 proje kapsamında; 95.7 km Stabilize yapım işinin 89.7 km. si tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
3	Ulaştırma	3	Stabilize Malzemeli Bakım (3,2 km.)	İl Geneli	9.600,00		9.600,00	9.600,00	100	100	Tamamlanmıştır.
4	Ulaştırma	4	Asfalt Tamiri Yapılması (150 km.)	İl Geneli	600.000,00		600.000,00	-	0	0	İl Genel Meclisi kararı ile programdan çıkarılmıştır.
5	Ulaştırma	5	Stabilize Greyderli Reglaj Yapımı (500 km.)	İl Geneli	75.000,00		75.000,00	75.000,00	100	100	Tamamlanmıştır.
6	Ulaştırma	6	Kar Mücadelesi (2000 km.)	İl Geneli	450.000,00		450.000,00	-	0	0	İl Genel Meclisi kararı ile programdan çıkarılmıştır. Ancak 880 km. kar mücadelesi yapılmıştır.
7	Ulaştırma	7	Büz-Sanat Yapıları	İl Geneli	50.000,00		50.000,00	38.733,00	78	100	Tamamlanmıştır.
8	Ulaştırma	8	Münferit İşler	İl Geneli	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100	100	Tamamlanmıştır.
9	Ulaştırma	9	Köy Yollarına Trafik Levha Yapımı	İl Geneli	50.000,00		50.000,00	14.800,00	30	100	Tamamlanmıştır.
10	Ulaştırma	10	Hanyeri Menfez Yapımı	İl Geneli	50.000,00		50.000,00	23.307,44	47	100	Tamamlanmıştır.
11	Ulaştırma	11	Ulupınar Buğurlar Yediocak Değirmenyanı Köprü Tabyası	İl Geneli	50.000,00		50.000,00	-	0	0	İl Genel Meclisi kararı ile programdan çıkarılmıştır.

12	Ulaştırma	12	Yol Çizgi Makinası Alımı	İl Geneli	60.000,00		60.000,00	56.911,40	95	100	Tamamlanmıştır.
13	Ulaştırma	13	Ulukaya Köyü Betonarme Köprü Yapımı	İl Geneli	150.000,00	103.873,40	46.126,60	-	0	70	Ulukaya Köyü köprü yapım inşaatı % 70 seviyesinde tamamlanmıştır. DSİ teknik raporu ve fesih komisyonu kararına göre iş fesh edilmiştir.
14	Ulaştırma	14	Akbaş Köyü Yol yapımı	İl Geneli	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100	100	Tamamlanmıştır.
15	Ulaştırma	15	Organize Sanayi Bölgesi Köprü Yapımı	İl Geneli	3.000.000,00		3.000.000,00	640.845,16	35	45	Çalışmalar devam ediyor.
16	Ulaştırma	16	Bartın Safranbolu Duple Yolu Yapımı	İl Geneli	1.199.000,00	681.240,19	669.135,19	669.135,19	95	100	Tamamlanmıştır.
17	Ulaştırma	17	Köprü ve Tünel Etüt ve Proje Giderleri	İl Geneli	200.000,00		200.000,00	-	0	0	2012 Yılına devretti.

2011 YILI KÖY-DES ÇALIŞMALARI

İLÇE	1. KAT ASFALT (Km)	2. KAT ASFALT (Km)	STABİLİZE (Km)	SICAK ASFALT (Km)	ASFALT TAMİRİ (Km)	BETON PARKE (Km)	TOPLAM (Km)
MERKEZ	30,7	0	45,4	0	141	0	217,1
ULUS	4,7	0	40,5	0	63	0	108,2
AMASRA	0	7	0	2	26,3	0	35,3
KURUCAŞİLE	1,75	0	0,75	0	20	0	22,5
TOPLAM	37,15	7	86,65	2	250,3	0	383,1

Ayrıca; Sanat Yapıları 2x2x0,75 ebatında 20 adet Bax, 900 m Q 60' lık, geçme muflu beton büz ve 900 m Q 40' lık geçme muflu beton büz alınarak köy yolları alt yapısında kullanılmıştır. **Bu projelerden; 7 km. lik II. Kat Asfalt yapımı mevsim şartlarının uygun olmaması nedeniyle durdurulmuş olup, hava şartlarının uygun hale gelmesine müteakip tamamlanacaktır.**

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI DİĞER FAALİYETLERİ

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
SIRA NO	FAALİYET	MİKTARI	AÇIKLAMALAR
1	Kurtarma Botu Kızağı İmalatı.	1 adet	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 1 adet Kurtarma Botu Kızağı İmal edilmiştir.
2	Hurda Lastik Tasfiyesi	Muhtelif	İlgili kanun hükümleri doğrultusunda, mevcut hurda lastikler tasfiye edilmiştir.
3	Hurda Araç Teslim Alınması	112 adet	5838 Sayılı Kanunun Geçici 2.maddesi ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre 2011 yılı sonu itibariyle şahıslardan 112 adet hurda araç müdürlüğümüz tarafından teslim alınmış olup hurda araç teslimi ile ilgili başvuru formu idaremiz web sitesinde vatandaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.
4	Araç Kiralanması	1 adet	1 Adet personel servis aracı kiralanmıştır.
5	Müşterek Çalışmalar	Muhtelif	Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile müşterek çalışmalar yapılmıştır.
6	OSB Yeni Köprü Yapımı	1 adet	Organize Sanayi Bölgesine yeni köprü yapım işine başlanılmıştır.
7	Araç Muayene İşleri	Araç Parkı	Müdürlüğümüz makine parkına kayıtlı olan tüm araçların trafik muayene işlemleri yapılmıştır.
8	Araç Sigorta İşleri	Araç Parkı	Müdürlüğümüz makine parkına kayıtlı olan tüm araçların trafik sigorta işlemleri yapılmıştır.
9	Çöp Toplama Hizmetleri	Muhtelif	Müdürlüğümüz makine parkında kayıtlı olan çöp toplama aracımız mutat toplama işlemlerini imkanlar çerçevesinde devam ettirmektedir.
10	2011 Yılı Makine Ekipman Kira Bedelleri	Muhtelif	İl genel meclisince karar altına alınan makine ve ekipman kira bedellerine göre kiralama işlemleri yapılmıştır.
11	Makine Maliyet	Muhtelif	Müdürlüğümüz araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve yedek parça giderlerini gösterir tablolar Aylık ve Üç Aylık olarak makine maliyet biriminde düzenli olarak kontrol altında tutulmaktadır.
12	Madencilik	Muhtelif	Hammadde Üretim Belgesi verilme iş ve işlemleri yapılmıştır.



ÖZBAŞI - HASANKADI YOL ÇALIŞMASI



AHMETPAŞA YOL ÇALIŞMALARI



KARAMAZAK KÖYÜ GENİŞLETME VE STABİLİZE ÇALIŞMALARI



KARAMAZAK KÖYÜ GENİŞLETME VE STABİLİZE ÇALIŞMALARI



**BAĞDATLI KONAK GRUP YOLU
SICAK ASFALT ÇALIŞMASI**



HURDA ARAÇ TEMİZLİĞİ



GERİŞ PARKE YOL ÇALIŞMASI



**BAĞDATLI KONAK GRUP YOLU
SICAK ASFALT ÇALIŞMASI**



ASFALT TAMİRİ ÇALIŞMALARI



KALECİK SEL YOLU TAHKİMATI



KALECİK SEL YOLU TAHKİMATI



O.S.B. KÖPRÜ İNŞAATI



KAR MÜCADELESİ



HANYERİ MENFEZ YAPIMI



FEN LİSESİ KANALİZASYON ÇALIŞMASI



O.S.B. KÖPRÜ İNŞAATI

- İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

- İnşaat İzni ve Ruhsat İşlemleri :

2011 yılı içerisinde 386 kişi inşaat yapımı için müracaatta bulunmuş olup başvuruların 228 adedi İmar Mevzuatı çerçevesinde inşaat yapmaya uygun görülmüş 158 adedi ise inşaat yapmaya uygun bulunmamıştır.

228 adet proje isteme yazısı yazılmış ve 270 proje onayı yapılmıştır. 55 adet müracaata ise 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre uygun olmadığından yapılabilmesi için gereken iş ve işlemler müracaat sahiplerine, yazı ile bildirilmiştir.

İnşaat izni verilen yapı sahiplerinden 196 adedi inşaatlarını tamamladığına dair müracaatta bulunmuş olup, müracaat sahiplerinden 135 adedine yapı kullanım izni verilerek alt yapı hizmetlerinden faydalanması uygun görülmüştür. Müracaat sahiplerinden 61 adedine ise, inşaatın projesine uygun yapılmadığı veya iskâna hazır olmaması gerekçesi ile yapı kullanım izni verilmemiştir.

İnşaat Ruhsatı

10

İskan Ruhsatı

15

İnşaat İzni

228

Yapı Kullanma İzni

196

- Yıkım Kararları :

3194 sayılı kanun hükümlerine aykırı olması nedeniyle izinsiz ve kaçak yapılan iş ve işlemler

Alınan Yıkım Kararı

38

İmar Para Cezası

58

- Hali Hazır Harita Yapımı :

2011 Yılında hayvancılık amaçlı tesis yapılabilmesi için gerekli olan imar planına altlık teşkil etmek üzere 3 adet yerin Halihazır haritası tamamlanmıştır.

- Çevre Düzeni Planı Çalışmaları :

Müdürlüğümüzde 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı ihale edilmiş olup, 2010 yılı içerisinde fiziki gerçekleştirmesi tamamlanmıştır. Ancak, 1/25.000 ölçekli ÇDP çalışmaları neticesinde, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında revizyon yapılması gerektiği tespit edilmiş, ÇDP revizyonu Çevre ve Orman Bakanlığına sunulmuş olup, revize onaylanarak 05.07.2011 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Yapılan itiraz konularının tamamlanmasından sonra 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onayına geçilecektir.

- Güzelcehisar Köyü Hisar Mahallesi 1. der. Arkeolojik ve 1. der. Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı :

Güzelcehisar Köyü Hisar Mahallesi 1. der. Arkeolojik ve 1. der. Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı'nın Fiziki gerçekleştirmesi tamamlanmış olup onaylanmak üzere ilgili kurumlara gönderilmiştir.

- Orman İzin Haritaları :

Akçamescit, Hocaoglu, Ören, Dizlermezeci, Arpacık köylerinin içme suyu boru hattı ve şebeke yapımları ve Gürgeçpınarı ve Şiremirçavuş Köylerinde bulunan okul yollarının yapımları için orman izin haritası tamamlanmış olup, ilgili idarelere gönderilmiştir.

- Adrese Dayalı Kayıt Sistemi :

Bartın İli'ne bağlı Tüm Köylerin Adres/Numaralandırma işlemleri tamamlanarak, kapı Numaraları Köy Muhtarlarına teslim edilerek Köylerde bulunan yapıların numaralanması sağlanmıştır.

2011 Yılı içerisinde yeni yapılan 211 Adet Konut ve müstemilatına kapı numarası verilmiş olup, Adres Veri Kayıt sistemine dahil edilmiştir. Yapılan yeni konut ve kayıtlarına göre sistem sürekli güncellenmektedir.

- Parsel Çalışmaları :

2011 yılı sonu itibariyle; toplam

**64 adet ifraz,
15 adet tevhit,
1 adet yola terk
157 adet hisseli satış ve
24 adet imar durumu işlemleri** yapılmıştır.

- Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı İle İlgili Çalışmalar:

2011 yılında 166.223,57 olmak üzere toplam 390.480,89 TL tahsilat yapılmıştır. 2007 yılında Bartın Belediye Başkanlığına Samancıoğlu Kent Müzesi Sokak İyileştirme Projesine 44.735,00 TL kullandırılmış olup, 31.12.2011 tarihi itibariyle 345.745,89 TL mevcut bulunmaktadır.

Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı Tablosu

YILLAR	MİKTAR
2005	38.505,16
2006	41.497,39
2007	23.546,34
2008	19.227,20
2009	35.289,35
2010	66.191,88
2011	166.223,57
TOPLAM	390.480,89
KULLANILAN	44.735,00
KALAN	345.745,89

- Mülkiyeti İdaremize Ait Taşınmazların Kiralama İşleri

a) Merkez İlçede Yer Alan Taşınmazlar:

- 1- Mülkiyeti İdaremize ait, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan ve İl Encümenince İhale edilen 6 Adet İşyeri, sözleşmeleri imzalanarak kiraya verilmiştir.
- 2- Mülkiyeti İdaremize ait Büyükkıran Köyü 558 parsel nolu taşınmaz 3 yıllığına kiralanmıştır.
- 3- Mülkiyeti İdaremize ait, Kozcağz Beldesinde bulunan Kozcağz Aile ve Toplum Sağlığı Merkezinin 1inci katı kiraya verilmiştir.
- 4- Mülkiyeti İdaremize ait, Güzelcehisar Köyü İnkum Mevkiinde bulunan İnkum Dinlenme Tesisleri, Bartın Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğüne 3 aylığına kiraya verilmiştir.
- 5- Mülkiyeti İdaremize ait, İl Özel İdaresi Zemin katta bulunan Çay Ocağının kira artışı yapılmıştır.
- 6- Mülkiyeti İdaremize ait, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 8 adet işyerinin kira artışı yapılmıştır.

b) İlçelerde Yer Alan Taşınmazlar

- 1- Mülkiyeti İdaremize ait, Ulus İlçesi Özel İdare İşhanı binası 1.katta bulunan 2,3,5 ve 7 nolu işyerleri kiraya verilmiştir.
- 2- Mülkiyeti İdaremize ait, Kurucasıle İlçesi Özel İdare Binası zemin katta bulunan 1,2,3 nolu işyerleri kiraya verilmiştir.
- 3- Mülkiyeti İdaremize ait, Ulus İlçesi Eldeş Köyünde bulunan BAMS Gıda (Özsüt Süt İşletmesinin kira artışı yapılmıştır.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

SIRA NO	PROJE NO	PROJE / FAALİYET ADI	MALİ YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ + KDV	ÖZKAYNAK / DIŞ KAYNAK	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME TARİHİ	İŞE BAŞLAMA TARİHİ	FİZİKİ GERÇEKL %	MALİ GERÇEK %	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	SORUNLAR VE AÇIKLAMALAR
1	14.01.2.1	1/25000 ÇDP	147.108,79	22.066,00	147..108,79	23.02.2010	05.04.2010	06.04.2010	100	60	12.11.2010	Fiziki Gerçekleştirme tamamlanmış olup, 1/100.000 ÇDP revizyonu onaylanmıştır. 1/100000 ölçekli ÇEVRE Düzeni Planına yapılan itiraz konularının tamamlanmasından sonra plan onayına geçilecektir.
2	14.1.2.2	Köy Yerleşik Alan Tespiti				22 köy yerleşik alan ve civarı tespiti yapıldı.			99		30.12.2011	Onaylanması konusunda bakanlıktan görüş istenmiştir. Görüş müteakip onaylama aşamasına geçilecektir.
3	14.01.2.3	Güzelcehisar Koruma Amaçlı İmar Planı	14,000.00	11.535.00	14.000.0,0	05.03.2011	Doğrudan Temin	05.03.2011	100		23.12.2011	Fiziki gerçekleştirme tamamlanmış olup onaylanmak üzere ilgili kurumlara gönderilmiştir.

- TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

- Yem Bitkileri Tohum Desteği:


Bartın ilinde Hayvancılığa destek amacıyla İl Özel İdaresi olarak üreticilere yem bitkisi tohum desteği sağlanması amaçlanmıştır. Buna göre;

-Yonca Tohumu:


10.000 kg. alınmış olup 246 adet çiftçiye dağıtımı yapılmıştır.

İLÇE ADI	ÇİFTÇİ SAYISI	MİKTARI (Kg.)
MERKEZ	127	5.825
AMASRA	-	-
KURUCAŞİLE	2	100
ULUS	117	4.075
TOPLAM	246	10.000

2011 YILI YONCA TOHUM MİKTARI

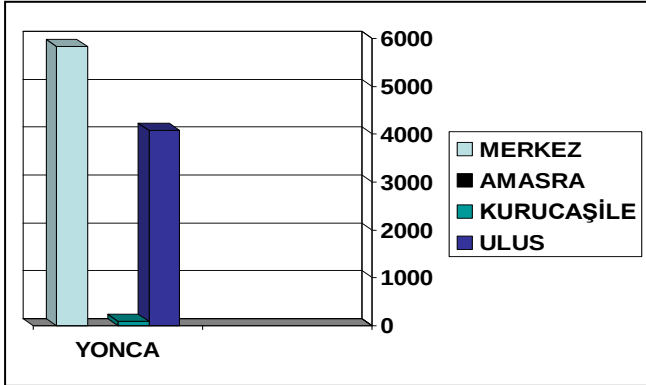

2011 YILI YONCA ÇİFTÇİ SAYISI




- Silajlık Mısır Tohumu


14.100 kg. alınmış olup, 236 adet çiftçiye dağıtılmıştır.

İLÇE ADI	ÇİFTÇİ SAYISI	MİKTARI (Kg.)
MERKEZ	226	1.3650
AMASRA	-	-
KURUCAŞİLE	-	-
ULUS	10	450
TOPLAM	236	14.100

2011 YILI SİLAJLIK MISIR TOHUM



2011YILI SİLAJLIK MISIR ÇİFTÇİ



- Çocuk Oyun Parkı Kurulması:

Merkez ilçede 17 adet, Amasra İlçesinde 3 adet, Kurucaşile İlçesinde 2 adet , Ulus İlçesinde 6 adet olmak üzere il genelinde **toplam 28 adet çocuk oyun parkı** hizmete sunulmuştur. Sonraki yıllarda da uygulamalarımız devam edecektir.



- İçmesuyu Hizmetleri:

2011 YILI İÇMESUYU BORUSU YARDIMI YAPILAN KÖYLER



İLÇE ADI	KÖY SAYISI	VERİLEN MİKTAR (mt.)
MERKEZ	36	25.703
AMASRA	4	2.900
KURUCAŞİLE	2	2.400
ULUS	18	14.066
TOPLAM	60	45.069



İçmesuyu amaçlı Keson kuyu Çalışmaları



İçmesuyu Kanal Kazısı Çalışmaları



İçmesuyu Şebeke borusu döşemesi çalışmaları



İçmesuyu Deposu Çalışmaları

İlimize bağlı Ulus İlçemizde 3 adet köyümüzde içmesuyu tesis geliştirme ve yenileme işlemi yapılmıştır.

İÇMESUYU TESİS GELİŞTİRME VE YENİLEME İŞİ YAPILAN KÖYLER		
İLÇE ADI	KÖYÜN ADI	YAPILAN İŞİN CİNSİ
ULUS	Dodurga Köyü	ENH. Motopomp, Terfi Binası, Terfi Hattı
ULUS	Isırganlı Köyü	2 adet depo, Şebeke Hattı, İsale Hattı, Kaptaj
ULUS	Hisar Köyü	Depo, Motopomp, Terfi Binası
TOPLAM	3	



- Klorlama Cihazı Montaj İşleri:

İl Özel İdarelerinin hizmet alanı içerisindeki yerleşim yerlerinin içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için gerekli cihaz ve klorlu bileşikler temin edilerek içme ve kullanma sularının düzenli ve sürekli olarak dezenfeksiyonunun sağlanması için Klorlama cihazlarının alımı yapılmıştır.

Merkez ve İlçe köylerimiz olmak üzere il genelinde **toplam 96 köye klorlama cihazlarının** montajları yapılmıştır.

- Hayvan Hastalıkları Ve Zararlıları İle Mücadele:

Hayvanları Koruma Kurulu Kararı gereği Mücavir alan dışındaki sahipli köpeklerin kayıt altına alınması için Tıbbi malzeme ve Ambulans teçhizi için çalışmalar başlatılmıştır.

-İşyeri Ruhsatı Hizmetleri :

2011 yılı sonu itibarı ile **48 adet işyerine iş yerine ruhsatı** verilmiştir.

-İşyeri Denetim Hizmetleri :

İdareimizce ruhsat verilen işyerlerinin denetimleri yapılmaktadır. İdareimizce denetimler **Ruhsat vermeden önce 1.Denetim, ruhsat verdikten sonra 2.Denetim** olmak üzere yapılmaktadır.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

SIRA NO	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJE BEDELİ TL.	ÖNCEKİ YILLAR HARCA MASİ	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL)	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
							NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1	39.00.01	Yem Alımları	İl Geneli	119.276,00		119.276,00	107.236,75	0,90	100	Yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirildi
2	39.00.02	Meyvecilik Ve Çilekciliği Geliştirme	İl Geneli	40.000,00		40.000,00	12.134,34	0,30	100	1) Valilik hizmet binası bahçesine torf ve çim alımı yapıldı. 2)Keten tohumu çim tohumu alımı gerçekleştirildi 3)Sılahık mısır ve yonca tohumu alımı gerçekleştirildi. 4)Süs bitkisi alımı gerçekleştirildi.
3	39.00.03	Deneme Demonstrasyon Ve Organik Tarım Projesi	İl Geneli	21.000,00		21.000,00	--	--	--	Proje aşamasında
4	39.00.04	Canlı Hayvan Alım, Bakım Ve Diğer Giderleri	İl Geneli	10.000,00		10.000,00	300,00	0,03	100	1) Çevre ve orman müdürlüğünden tahsis edilecek seyyar ameliyat aracı beklenmektedir 2) Çevre sağlığı açısından hizmet binası ve sosyal tesislerin ilaçlanması gerçekleştirildi.
5	39.00.05	Çocuk Oyun Parkı Kurulması	İl Geneli	162.551,90		162.551,90	115.338,24	0,71	100	Çocuk Parklarının Kurulumu tamamlandı
6	39.00.06	İçme Suyu Ve Kanalizasyon Tesis Yapım Giderleri	İl Geneli	199.020,60		199.020,60	132.233,40	0,66	100	1) Klorlama cihazı alım işi gerçekleştirildi 2) Muhtelif çaplı içmesuyu ve kanalizasyon borusu alım işi gerçekleştirildi. 3) Beko loder çalıştırılması işi gerçekleştirildi. 4) Drenaj borusu alımı gerçekleştirildi.
7	39.00.07	Ulus Hisar Köyü Hisar Mahallesi İçmesuyu Tesisi Geliştirme İşi	Bartın-Ulus-Hisar Köyü	17.500,00		17.500,00	14.036,10	0,80	100	Ulus Hisar Köyü hisar mahallesi içmesuyu tesisi geliştirme işi gerçekleştirildi.

SIRA NO	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCA MASİ	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL)	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
							NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1	Diger Kamu Hizmetleri	Bartın Ulus Isırganlı Köyü İçmesuyu Tesis Geliştirme Ve Yenileme İşi	İl Geneli	58.937,44		58.937,44	58.937,44	100	100	Bartın Ulus Isırganlı Köyü İçmesuyu Tesis Geliştirme Ve Yenileme İşi Gerçekleştirildi.
2	Diger Kamu Hizmetleri	Bartın Merkez Arıönü Ve Güzelcehisar Köyü Sahil Yolu Düzenlemesi	İl Geneli	154.698,94		154.698,94	154.698,94	100	100	Bartın Merkez Arıönü Ve Güzelcehisar Köyü Sahil Yolu Düzenlemesi Kapsamında Parke Taş Ve Bordür Alımı Gerçekleştirildi
3	Diger Kamu Hizmetleri	Bartın Şaban Kadı Köyü İçmesuyu Tesisinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı Yenileme İşi	İl Geneli	9.097,80		9.097,80	9.097,80	100	100	İçmesuyu Hattında Kullanılmak Üzere Boru Alımı Gerçekleştirildi
4	Diger Kamu Hizmetleri	Bartın Ulus Dodurga Köyü İçmesuyu Tesis Geliştirme Ve Yenileme İşi	İl Geneli	59.000,00		59.000,00				Bartın Ulus Dodurga Köyü İçmesuyu Tesis Geliştirme Ve Yenileme İşi Devam Ediyor.
5	Diger Kamu Hizmetleri	Bartın Karamazak Köyü İçmesuyu Tesisinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı Yenileme İşi	İl Geneli	8.230,50		8.230,50	8.230,50	100	100	İçmesuyu Hattında Kullanılmak Üzere Boru Ve Motopomp Alımı Gerçekleştirildi

- PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

- Hizmet Binası ve Lojmanlarımızın Bakım ve Onarım Çalışmaları:

- İdareimiz Hizmet Binasının Çatı Onarımı
- İdareimiz Hizmet Binasının Elektrik Tesisatının Yenilenmesi Çalışmaları
- İdareimiz Hizmet Binasının Giriş Merdivenleri ve Otopark Alanı Duvarlarına Alüminyum Doğrama Yapılması İşi
- İdareimiz Hizmet Binası Lojmanının Kanalizasyon Onarım İşi
- Genel Sekreter ve Yönetici Odasına Bakım ve Onarım Yapılması İşi
- İdareimiz Hizmet Binası Çok Amaçlı Salonu ve Kongre Salonunun Asma Tavanın Yenilenmesi İşi
- İdareimiz Hizmet Binası Kaloriferlerine Brülör Satın alınması İşi
- İdareimiz Hizmet binası Çay Ocağının Yenilenmesi işi yapılmıştır.

- Vali Konağı Lojman Bakım ve Onarım Çalışmaları:

- Vali Konağı Personel Lojmanı Binasının Bakım ve Onarım Çalışmaları yapılmıştır.
- Vali Konağı Personel Lojmanı Kanalizasyon Onarım Çalışmaları yapılmıştır.

- İdareimiz Hizmet Binası Lojmanına Asansör Yapılması Çalışmaları :

- İdareimiz Hizmet Binası Lojmanına Asansör Yapılması İşi İhalesi 03/05/2011 tarihinde gerçekleşmiş ancak evrak eksikliği nedeniyle ihale yetkilisi tarafından 10/05/2011 tarihinde iptaline karar verilmiştir. İkinci ihale 14/07/2011 tarihinde gerçekleşmiş, ancak K.İ.K' nunu 39.Maddesi (tüm teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olması) nedeniyle 20/07/2011 tarihinde ihale yetkilisi tarafından iptaline karar verilmiştir.

- Bartın Merkez ve İlçe Köylerine Beton Parke Yol Yapım İşi Çalışmaları:

- Kayadibi Kavlak Köyüne 3.500 m2 Beton Parke Yol,
- Eskiemiirler Köyüne 3.087 m2 Beton Parke Yol,
- Geriş Köyüne 1 km Kaldırım Çalış. (1489 m2 Beton Parke ile 2023 m. Bordür),
- Çanakçılar Köyüne 3.420 m2 Beton Parke Yol,
- İyasgeçidi-Kapısıuyu-Yeniköy 6.160m2 Beton Parke Yol,
- Kapısıuyu Başköyüne 12.408 m2 Beton Parke Yol yapılmıştır.

- Paydaş Müdürlüklere Yapılan Teknik Hizmetler:

- 199 adet Yaklaşık Maliyet çalışması yapılmıştır.
- 91 adet Yapı Denetim çalışması yapılmıştır.
- 47 adet Geçici Kabul çalışması yapılmıştır.
- 31 adet Kesin Kabul çalışması yapılmıştır.

- Köylerimize Yapılan Yardımlar:

- | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------|
| - Bartın Merkez İlçesi | 85 adet Köye | 194.250,00 TL. |
| - Bartın Ulus İlçesi | 37 adet Köye | 48.750,00 TL. |
| - Bartın Amasra İlçesi | 8 adet Köye | 20.500 ,00 TL. |
| - Bartın Kurucaşile İlçesi | 9 adet Köyüne | <u>15.750,00 TL.</u> |

olmak üzere **TOPLAM 139 adet Köye**

279,250,00 TL 'lik nakdi yardım yapılmıştır.




İdaremiz Hizmet Binası Merdiven Korkuluklarının Yenilenmesi İşı Yapılmıştır.



İdaremiz Hizmet Binası Çok Amaçlı Salonunun Duvar Kaplanması işi ile Asma Tavanın Yenilenmesi İşı Tamamlanmıştır.



İller Bankası Köy Katkı Payından Artan Ödeneklerle Gerçekleştirilen Bartın Merkez ve İlçe Köylerine Beton Parke Yol Yapım İşİ Tamamlanmıştır.

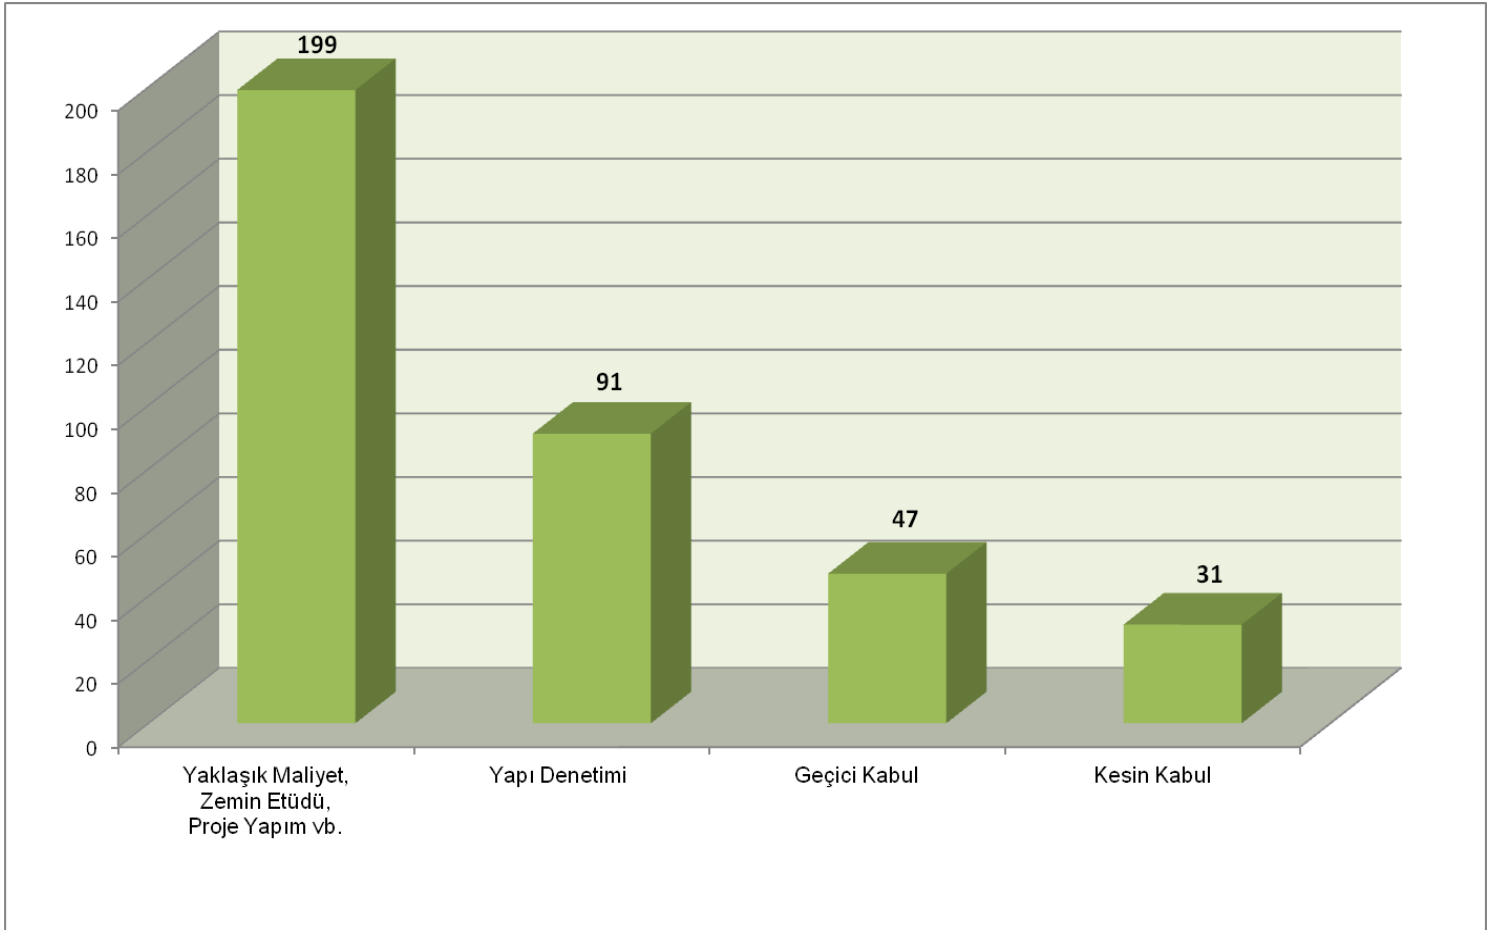

Yaklaşık Maliyet Çalışmaları

Sıra No	Proje Adı ve Yeri	Sıra No	Proje Adı ve Yeri
1	Cumhuriyet İ.Ö.O.Bodrum katının On.İşi	18	75 Yıl Huzurevi Müdürlük Binasının Onarım İşi
2	Bartın OSB Köprüsü Prj.İşi.	19	Kurucaşile Toplum Sağ.Merk.Tadilat ve Onarım İşi
3	Amasra Turizm Otelcilik karma Öğr.pans.trafo İşi	20	Verem Savaş Dişpanseri Tadilat ve Onarım İşi
4	Hendekyanı İ.Ö.O. Kalorifer Kazanı On.İşi	21	Bartın Mrk.Sent. Çim Yüzeyli Saha ve Atletizm Pisti Işık.Yp.
5	Anadolu İmam Hatip Lisesi Ek Binası Kalorifer,Çatı, ve öğrenci öğr. WC onarım İşi	22	Bartın İl Jandarma Komutanlığı Kozcağız Beldesi Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminali Güv.kamera Sis. İşi
6	Ahmetler İ.Ö.O. Kalorifer On.İşi	23	Amasra Anaokulu yapımı
7	Hasanefendi B.S.İ. Okulu Onarım İşi	24	Yuva Anaokulu Onarımı
8	Kumluca Mehmet Akif ERSOY İ.Ö.O. Kalorifer kazanı Onarım İşi	25	7 Eylül Anaokulu
9	Köksal Toptan Lisesi Onarım İşi	26	Gökkuşağı Anaokulu Onarımı İşi
10	Akçamescit İ.Ö.O. Kalorifer kazanı Onarım İşi	27	Bartın Öğretmenevi Onarım İşi
11	Kıranpazarı İ.Ö.O.Kalorifer kazanı Onarım İşi	28	Amasra Anadolu Turizm.otelcilik Mes.Lisesi Onarım İşi
12	Akbaş İ.Ö.O.Kalorifer kazanı Onarım İşi	29	Ulus ÇPL Onarım İşi
13	Fatih İ.Ö.O.Onarım İşi	30	Bartın Merkez Teknik Lise Onarım İşi End.mes.Lisesi
14	23 Nisan Anaokulu Onarım İşi	31	Kız Meslek Lisesi Onarım İşi
15	Bedil İ.Ö.O.Kalorifer kazanı Onarım İşi	32	Bartın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi On.İşi
16	Epçiler İ.Ö.O.Kalorifer kazanı Onarım İşi	33	Kurucaşile Öğretmen Evi Onarım İşi
17	Kız Teknik ve Kız Mes.Lisesi Müd.nün İ.BANKOĞLU Kız Öğr.Pans.İşi	34	Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İşi

Sıra No	Proje Adı ve Yeri	Sıra No	Proje Adı ve Yeri
35	Yanaz İ.Ö.O.İnşaatı İşi	52	Kumluca M.A.ERSOY İ.Ö.O.İşi
36	Şehit Necdet Orhan YİBO Onarım İşi	53	Epçiler İ.Ö.O.Onarım İşi
37	Ulus Kumluca YİBO Onarım İşi	54	Atatürk İ.Ö.O.İnş.Zemin Etüdü ve Proje
38	Ahmetler İ.Ö.O.Onarım İşi	55	Aydınlar İ.Ö.O.Onarım İşi
39	Akçalı İ.Ö.O.Onarım İşi	56	Hendekyanı İ.Ö.O. İşi
40	Akpınar İ.Ö.O.	57	Ecikler İ.Ö.O.
41	Fatih İ.Ö.O.Onarım İşi	58	Zafer İ.Ö.O.
42	İnönü İ.Ö.O.Onarım İşi	59	Çanakçılar İ.Ö.O.İşi
43	Karahüseyinli İ.Ö.O.Onarım İşi	60	Kurucaşile Hisar Piri Reis İ.Ö.O.İşi
44	Uğurlar BSİ Onarı m İşi	61	Kurucaşile Merkez İ.Ö.O.İşi
45	Kemal Sabriye OCAKÇI İ.Ö.O.Onarım İşi	62	Çocuk Trafik Eğitim Parkı
46	Köksal TOPTAN İ.Ö.O.Onarım İşi	63	İstiklal İ.Ö.O.İşi
47	Amasra Fatih Sultan MEHMET İ.Ö.O.Onr.	64	Abdipaşa İ.Ö.O.İşi
48	Kaleşah İ.Ö.O.Onarım İşi	65	Kurucaşile Sarıderesi İ.Ö.O. İşi
49	Akçamescit İ.Ö.O.Spor Salonu Yapımı İşi	66	İ.M.K.B.İ.Ö.O. Onarım İşi
50	Kozcağız İ.Ö.O.İşi	67	Mrk.Cumhuriyet Anadolu Lisesi Öğ Binası ve bahçesinde On.İşi
51	Budakdüzü İ.Ö.O.İşi	68	Ulus Hasandede İ.Ö.O.Kalorifer Kazanı Alev Borularının Onarımı

Sıra No	Proje Adı ve Yeri	Sıra No	Proje Adı ve Yeri
69	Kızılelma İ.Ö.O. Onarımı	87	Şiremirçavuşköyü İ.Ö.O. Kalorifer kazanı Onarım İşi
70	Amasra İlçesi Otelcilik Tur.Mes.Lisesi Müd.Öğr.Pans.	88	Gazi İ.Ö.O. Onarım İşi
71	İl Çevre ve Orman Müd.bakım Onarım İşi	89	Ulus Öğretmenevi ve Akşam sanat Okulu Ödeneğe keşif İsteme
72	Kaman İ.Ö.O.bakım Onarım	90	Hanyeri menfez Yapım İşi
73	Evde bakım ve Geriatri Bin.pencereleri cam çitası ve ferforje on. işi	91	Ulus Kaymakamlık Lojmanı Bakım ve Onarımı
74	Bartın İMKB İ.Ö.O. Top.sal.kapı ve pencere onarım işi	92	Kozcağız Ahmetler İ.Ö.O. İstinat Duvarı için Öd.eses Keşif
75	Hıdırlar İ.Ö.O.Müd.Bodrum Zeminkat WC kalorifer On.İşi.	93	Cumhuriyet Anadolu Lisesi Onarım İşi
76	Bilim sanat Merkezi Onarım İşi	94	Merkez İ.Ö.O. Kanalizasyon Hattı yapımı işi
77	İller bankası köylerin altyapı,proje ve yapım işleri	95	İller Bankası katkı paylarından beton parke yol yapım işi
78	Kozcağız ÇPL Onarım İşi	96	İl sağlık Md.nün iç ve dış boyası
79	Kumluca Atatürk YİBO Müd.Okul Binası Güv.Kamerası İşi	97	İstiklal İ.Ö.O. Elk.tesisatı Onarım İşi
80	Bedil İ.Ö.O.çevre düzenlemesi işi	98	Alibaş İ.Ö.O.Onarım İşi
81	Umut İ.Ö.O. Bakım Onarım İşi	99	Kumluca Atatürk yatılı İ.Ö. Bölge Okulu Kalorifer sistemi İşi
82	Şehit Ahmet SEÇEN Reh.Arş.Mrk.Onarım İşi	100	Hasankadı Toplum ve Aile Sağlığı Merkezi yapım işi
83	Anadolu Öğretmen Lisesi bakım onarım işi	101	bartın Merkez Çim Yüzeyli saha ve Atletizm Pisti Yapım İşi
84	Kurucaşile ÇPL Bakım Onarım işi	102	Kurucaşile futbol sahası Işıklandırma Yapım İşi
85	Bartın Ticaret Mes.Lisesi bakım Onarım işi	103	Emniyet Md.nün Çocuk şb.Md.hiz.bin.çatı onarımı İşi
86	Bartın halk eğitim merkezi onarım işi	104	kemer polis Mrk. Amirliği loj.çatı dış cephe,kalorifer ve montalama işi

Sıra No	Proje Adı ve Yeri	Sıra No	Proje Adı ve Yeri
105	Kozcağız,kumluca,hasankadı Jan.Komutanlıklarına Nez.Güv.kam.İşi	123	Şehit Gürdal ÇAKIR İ.Ö.O.
106	Kızılelma Çok Prog.Lisesinin Onarım İşi	124	Şükürler İ.Ö.O.
107	Ulus Atatürk İ.Ö.O.	125	Çanakçılar İ.Ö.O.
108	Ağaköy İ.Ö.O	126	Ellibaş İ.Ö.O. Kal.kaz.Onarım İşi
109	Zafer İ.Ö.O	127	Öğretmenevi Lokali Onarımı İşi
110	75 Yıl İ.Ö.O.	128	Sarıderesi İ.Ö.O.
111	Abdipaşa İ.Ö.O.	129	İlyasgeçidi İ.Ö.O.
112	Kıranpazarı İ.Ö.O.	130	İmam Hatip Lisesi Ek Bina Onarım İşi
113	Kemal Sabriye OCAKCI İ.Ö.O.	131	Hasankadı İ.Ö.O.Onarım İşi
114	Kızılelma İ.Ö.O.	132	Merkez Kozcağız Yuva anaokulu Kal.Kaz.On.İşi
115	Gazi İ.Ö.O.	133	Vali evinde buluna elk.trafosunun teknik işlemleri için
116	İMKB İ.Ö.O.	134	Abdipaşa İ.Ö.O.Zemin etüd ve proje yapımı işi
117	Fatih İ.Ö.O.	135	Amasra İlçesi karaevler mevkiinde anaokulu zemin etüdü proje işi
118	Gökkuşığı İ.Ö.O.	136	200 kişilik Öğr.yurdu Binası zemin etüdü prj.hazırlama işi
119	Akpınar İ.Ö.O.	137	Bilim sanat merkezi Zemin etüdü ve prj.hazırlama işi
120	Şehit A.POYRAZ İ.Ö.O.	138	Vilayetler Hiz.Birliği Anaokulu zem.etüdü ve prj.yapımı
121	Şehit Üst.Aydın AYDOĞMUŞ İ.Ö.O.	139	Amasra Anaokulu Binası zemin etüdü ve prj.yapımı işi
122	Kocareis İ.Ö.O	140	Ulus Öğremenevi Onarım İşi

Sıra No	Proje Adı ve Yeri	Sıra No	Proje Adı ve Yeri
141	Ulukaya Köyü Küre Dağları Ziyaretçi Top.Mrk.Ulukaya şelalesi arasında kalan 1,5 km.lik yerin çevre düzenlenmesi işi	158	Turgut Işık sağlık Meslek Lisesi Onarım İşi
142	Ulus zafer Kötü Futbol sahası yapım İşi	159	Bedil İ.Ö.O. Elk.tes.meydana gelen arıza için onarım işi
143	Vali Konağı Lojmanlarının bakım Onarım İşi	160	hasankadı toplum ve Aile sağlığı merkezi yapım İşi
144	Özbaşı İ.Ö.O Onarım İşi	161	Umut İ.Ö.O.Ödenek Tem.esas keşif
145	Çaydüzü İ.Ö.O. Kanalizasyon Boruları Onarım işi	162	Akçalı İ.Ö.O. Su dep.bozukolan hid.onarımının yap.
146	Karahüseyinli Köyü Bina taşıyıcı sisteminin güvenilirliği işi	163	Anadolu İmam hatip Lisesi Müd.ait ek bin.dep.güç.ödenek temini
147	İl Çevre Orman Müd.Hiz.Binası Onarımı	164	Gazi İ.Ö.O.elk.sis.
148	Kozcağz Yuva Anaokulu kalorifer kazanının bakım onarımı	165	Şiremieçavuş İ.Ö.O. Kalorifer kazanı işi
149	Ödenek temini Ulus çok prg.lisesi Müd.	166	Ağaköy İ.Ö.O. Çatısı Onarım İşi
150	Bartın Lisesi Müd.Kalorifer Kazanı Onarım İşi	167	Milli Eğitim Lojmanı Binasının kalorifer ve kanalizasyon işi
151	Ahmetler İ.Ö.O. Kalorifer Kazanı	168	Merkez İ.Ö.O. Onarım İşi
152	Bakioğlu İ.Ö.O. Bahçesinin zeminin onarım işi	169	Kozcağz otobüs Terminali Güv.sistemi
153	Fatih İ.Ö.O. Ödenek teminine esas maliyet hazırlama işi	170	Bedil İ.Ö.O. Bahçesinin Onarım işi
154	Kozcağz Çok programlı Lisesi Müd.okul bin.dep.day. Keşfi yapılması	171	Ulus ÇPL ödemeğe esas keşif hazırlanması İşi
155	Kutlubeydemirciler Bir.sınıf İ.Ö.O. Anasınınfının duvarlarını onarım İşi	172	sosyal tes. Müd. Kamre Güv.Sis.
156	Abdipaşa Çok Prog.Lisesi Müd.dep.karşı dayanaıklı prj.haz.İşi	173	Ulus İlçe J.K. Kamera güv.sis.
157	Anadolu Güzel sanatlar Lis.Ödenek tem esas keşif	174	Kurucaşile İlçesi J.K. Kamera Güv.sis.

Sıra No	Proje Adı ve Yeri	Sıra No	Proje Adı ve Yeri
175	Arit J.K. Kamera Güv.Sis.	192	Akşam sanat Okulu Kalorifer Kazanı İşi
176	Hasankadı J.K.kamera Güv.Sis.	193	Davut FIRINCIOĞLU Anadolu Lisesi Müd.Çatı katı Vana.değ.
177	Kızılelma J.K.kamera Güv.sis.	194	Merkez Gözpınar İ.Ö.Okulu kazan dairesi arızası işi
178	Ağaköy J.K.kamera Güv.sis.	195	Merkez Gökkuşığı Anaokulu Kalorifer arızası işi
179	Serdar İ.Ö.O bakım Onarım İşi	196	Merkez bakioglu İ.Ö.O.Onarım İşi
180	Çaydüzü İ.Ö.O.bakım Onarım İşi	197	Merkez Alibaş BS.İ.Ö.O Onarım İşi
181	Hacıosmanoğlu İ.Ö.O.Hidrofor İh.	198	Köksal Toptan Anadolu Lisesi Kız Öğr.Onarımı
182	Kumluca M.Akif ERSOY Elk.Arıza işi		
183	Bedil İ.Ö.O. Bahçesinin Onarım işi		
184	Şehit Ahmet TELLİ İ.Ö.O.Müd.nün elk.tes.onarımı		
185	Ulus kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müd.değiş.		
186	Kumluca Atatürk YİBO Klaorifer alev boru.değiştirilmesi		
187	Amasra otel.Tur.Mes.Lisesi Ödenek temini		
188	Kozcağız Çok Prog.Lisesi Müd.Onarım		
189	vali Konağı ısıtma Sistemi Onarımı		
190	İl Kültür ve Tur.Müd.devir teslim işi		
191	Merkez Halk eğitim Merkezi Klaorifer Kazanı işi		

Yapı Denetimi Çalışmaları

S.NO	İŞİN ADI	S.NO	İŞİN ADI	S.NO	İŞİN ADI
1	Derbent- i.ö.o. on.ışı	31	4 adet onarım işleri	62	Amasra fatih sultan mehmet i.ö.o:onarım işi
2	Terkehaliller i.ö.o.onarım işi	32	Cumhuriyet anadolu lisesi onarım işi	63	Amasra tur.ot.mes.lisesi pans.onarım işi
3	Kaleşah i.ö.o.on.ışı	33	Kurucaşile hisarpirireis i.ö.o.onarımı	64	Çanakçılar i.ö.o.
4	Kent güv.sis.(mobese) işi	34	Kurucaşile sarıderesi i.ö.o.	65	Akpınar i.ö.o.onarım işi
5	Bedil i.ö.o. onarım işi	35	Kurucaşile merkez i.ö.o.onarım işi	66	Bilim sanat merkezi onarım işi
6	Akçamescit i.ö.o.onarım işi	36	Kurucaşile öğretmenevi onarımı	67	Kemal sabriye ocakçı i.ö.o.onarım işi
7	Kıranpazarı i.ö.o.onarım işi	37	Karahüseyinli i.ö.o.onarım işi	68	İmam hatip anadolu lisesi onarımı
8	Bartın evde bakım ve geriatri birim binası	38	Akçalı i.ö.o.onarım işi	69	Fatih i.ö.o. kapalı spor salonu onarımı
9	İdareimiz hiz.binası çatı katının onarım işi	39	Hendekyanı i.ö.o.onarım işi	70	Ulus hasandede i.ö.o.onarımı
10	Epçiler i.ö.o.onarım işi	40	7 eylül anaokulu onarımı	71	Aydınlar i.ö.o. onarımı
11	Akbaş i.ö.o.onarım işi	41	Budakdüzü i.ö.o.onarım işi	72	Şehit necdet orhan yibo onarımı
12	Gözde birsöz çocuk yuvası binası onarım işi	42	Epçiler i.ö.o.onarım işi	73	Verem savaş dişpanseri onarım işi
13	3 adet futbol sahası yapım işi	43	Kumluca yibo onarım işi	74	Kozcağız yuva anaoulu onarım işi
14	Kurucaşile ilçe emn.amirliği hizmet bin bak.onarım	44	Zafer i.ö.o.onarım işi	75	Kozcağız ahmetler i.ö.o.kalorifer onarım işi
15	Amasra ilçe emn.amirliği hizmet bin bak.onarım	45	Ulus çpl	76	Kemer polis karakolu kal kazanı onarım işi
16	Ulus ilçe emn.amirliği hizmet bin bak.onarım	46	Kurucaşile toplum sağlığı onarım işi	77	Ellibaş i.ö.o kalorifer onarım işi
17	Kemer polis merkezi hiz.binası bak.on	47	Hizmet binası ve çay ocağının onarım işi	78	Akçalı i.ö.o. onarım işi
18	75 yıl huzurevi müd.binasının onarım işi	4849	Köksal toptan lisesi onarım işi	79	Ulus ağaköy i.ö.o.onarım işi
19	Mustafa kemal i.ö.o.dep.güç.onarım işi	50	Merkez i.ö.o. kanalizasyon hatları yapım işi	80	Merkez i.ö.o. yapım işi
20	İmkb:i.ö.o. onarım işi	51	Merkez i.ö.o. Kanalisasyon yapım işi	81	Şehit a.seçen reh.arş.merk.
21	Gözde birsöz çocuk yuvası binası onarım işi	52	Gazi i.ö.o. onarım işi	82	Ulus öğretmenevi onarım işi
22	Gökkuşağı anaokulu onarın işi	53	Yanaz i.ö.o.prj.hazırlama işi	83	K.şile çpl kalorifer onarım işi
23	Kumluca m.a.ersoy onarım işi	54	Kız meslek lisesi onarım işi	84	Atataürk i.ö.o. prj hazırlama işi
24	Çevre orman müdürlüğü hiz.binası onarım işi	55	İnönü i.ö.o.onarım işi	85	Akcomescit kapalı spor salonu prj.haz.ışı
25	Evde bakım ve geriatri hizmet binası onarım işi	56	Umut i.ö.o.onarım işi	86	Ulus kocagöz konağı on.ışı
26	Hıdırlar i.ö.o.onarım işi	57	Merkez tek.lise end.mes.lisesi.	87	Turgut ışık sağlık meslek lisesi onarım işi
27	Kümesler i.ö.o	58	Hsankadı i.ö.o. onarım işi	88	Kemer polis karakolu onarım işi
28	Uğurlar i.ö.o.onarım işi	59	Zafer i.ö.o.futbol sahası	89	Çocuk şube müdürlüğü
29	Hasanefendi i.ö.o. ve kaman i.ö.o. onarım işleri	60	Amasra kaleşeh i.ö.o.onarım işi	90	Haciosmanoğlu i.ö.o. hidrofor yenileme işi

30	Kozcağız ahmetler i.ö.o.ve kozcağız çpl on. işi	61	Amasra köksal toptan i.ö.o.onarım işi	91	Milli eğitim müd. Amasra kaymakamlığı hiz.bin.
-----------	---	-----------	---------------------------------------	-----------	--

Kesin Kabul Çalışmaları	Geçici Kabul Çalışmaları	
İŞİN ADI	İŞİN ADI	İŞİN ADI
Fatih İ.Ö.O. Onarım İşi	Evde Bakım Ve Geriatri Binası Onarım İşi	Bilim Sanat Merkezi
Kozcağz İ.Ö.O.Çevre Düzenlemesi İşi	75. Yıl Huzurevi	Kemal Sabriye OCAKÇI İ.Ö.O.Onarım İşi
Kemer Polis Karakolu Onarım İşi	Kurucaşile,Ulus Amasra İlçe Emn.Amirliği Ve Kemer Polis Mrk.	İmam Hatip Lisesi Onarım İşi
Vali Konağı On.İşi	3 Adet Futbol Sahası İşi	Fatih İ.Ö.O. Kapalı Spor Salonu Onarımı
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Onarım İşi	Emniyet Md.MOBESE Yapım İşi	
Kız Meslek Lisesi Onarım İşi	Kültür Mrk.Güç.İkmal İnş.	Ulus Hasandede İ.Ö.O.Onarımı
Bartın Öğretmen Evi Onarım İşi	Cumhuriyet Anadolu Lisesi Onarım İşi	Aydınlr İ.Ö.O.
Ulus Öğretmen Evi	4 Okul (Paket 2) Onarım İşi	Şehit Necder İ.Ö.O
Mrk.Dalıca B.S.İ.Onarım İşi	Köksal Toptan Lisesi Onarım İşi	Kurucaşile Toplum Sağlığı Merk.Bin.Onarım İşi
Amasra Toplum Sağlığı Onarım İşi	Sarıderesi İ.Ö.O. Onarım İşi	Amasra Kaleşah İ.Ö.O.Onarım İşi
Kocagöz Konağı Onarım İşi	Kurucaşile Merkez İ.Ö.O Onarım İşi	Amasra Fatih Sultan Mehmet İ.Ö.O.Onarım İşi
Amasra Müzesi Onarım İşi	Kurucaşile Öğretmenevi İ.Ö.O Onarım İşi	Amasra Tur.Otel.Mes.Lisesi Onarım İşi
Bartın İl Jan.Kom.Bin.Bağlı Kumluca,Hasankadı, Kozcağz Jan. Kom. Güv. Kamera Ve Kapalı Devre TV Sistemi İşi	Hisarpirireis İ.Ö.O Pnarım İşi	Çanakçılar İ.Ö.O.Onarım İşi
2 Adet Okul Kapsamında Gazi İ.Ö.O On.İşi	Kumluca YİBO Onarım İşi	Amasra Köksal TOPTAN İ.Ö.O.Onarım İşi
Ulus Endüstri Mes.Lisesi Onarım İşi	Zafer İ.Ö.O.Onarım İşi	Amasra Kaleşah İ.Ö.O Onarım İşi
İnönü İ.Ö.O.Onarım İşi	Ulus Çpl Onarım İşi	Kemer Polis Karakolu Onarım İşi
Amasra Halk Eğitim Merkezi	Bartın Merkez Teknik Lise Onarım İşi	Mustafa Kemal İ.Ö.O.Dep.Güç.Ve Onarım İşi
Ahmet Aydede Anaokulu Onarım İşi	Endüstri Meslek Lisesi Onarım İşi	
Ulus Ağaköy İ.Ö.O.Onarım İşi	Karahüseyinli İ.Ö.O Onarım İşi	
Terkehaliller İ.Ö.O.Onarım İşi	Akçalı İ.Ö.O.Onarım İşi	
Arıt Çpl Onarım İşi	7 Eylül Anaokulu Onarım İşi	
Anadolu Öğretmen Lisesi Onarım İşi	Budakdüzü İ.Ö.O.Onarım İşi	
Kıranpazarı İ.Ö.O Onarım İşi	Epçiler İ.Ö.O. Onarım İşi	
Bartın Köksal TOPTAN Lis.Öz.As.Yapım İşi	Kız Meslek Lisesi Onarım İşi	
Kumluca YİBO Futbol Sahası İşi	Umut İ.Ö.O Onarım İşi	
Ulus Kocagöz Konağı On.İşi	İnönü İ.Ö.O Onarım İşi	
Amasra Müzesi Onarım İşi	Sarıderesi İ.Ö.O Onarım İşi	
Bakraçboz İ.Ö.O Onarım İşi	Kurucaşile Merkez İ.Ö.O Onarım İşi	
100 Daireli Polis Loj.Onarım İşi	Kurucaşile Öğretmenevi İ.Ö.O Onarım İşi	
Vali Konağı Dış Cephe Kaplaması İşi	Hisar Pirireis İ.Ö.O Onarım İşi	
4 Adet Onarım İşi (Erdoğan ÇAKIR)	Akpınar İ.Ö.O.	

MERKEZ İLÇE VE KÖYLERİNE NAKDİ YARDIM			
SIRA NO	KÖYÜN ADI	YARDIMIN MİKTARI (TL)	YARDIMIN KONUSU
1	Merkez Tabanözü Köyü	1.300,00	İçme suyu keson kuyusunun elektrik açılışı için
2	Merkez Ellibaş Köyü	2.000,00	Beton kanal yapımı
3	Merkez Hasanefendi Köyü	2.500,00	Beton kanal yapımı
4	Merkez Çaybükü Köyü	2.500,00	Beton kanal yapımı
5	Merkez Eyüpoğlu Köyü	2.000,00	Beton kanal yapımı
6	Merkez Hocaoglu Köyü	2.000,00	Beton kanal yapımı
7	Merkez Güzelcehisar Köyü	2.500,00	Parke Yol Yapım İşİ
8	Merkez Arıönü Köyü	3.000,00	Kanalizasyon Bakım Onarımı İçin
9	Merkez Geçen Köyü	3.000,00	Cami çevre düzenlemesi
10	Merkez Şahne Köyü	3.000,00	Mezar yerine beton çit ve tel çekilmesi
11	Merkez Gözpınar Köyü	2.500,00	Kanal yapım işi
12	Merkez Küçükkızılkum Köyü	2.500,00	Misafirhane kapı ve pencere onarım işi
13	Merkez Şabankadı Köyü	2.000,00	Beton kanal yapılması İşİ
14	Merkez Uluköy Köyü	2.000,00	Kanalizasyon Bakım Onarımı İçin
15	Merkez Yeğenli Köyü	2.000,00	Beton kanal yapılması İşİ
16	Merkez Gökçekıran Köyü	2.000,00	Beton direkli emniyet tel örgüsü yapılması
17	Merkez Karasu Köyü	3.000,00	Beton su kanalı yap.İşİ
18	Merkez Terkehaliller Köyü	2.000,00	Beton çit ve tel çekilmesi işi
19	Mrk.Kutlubeydemirci Köyü	2.000,00	Beton kanal yapılması işi için
20	Merkez Saraylı Köyü	3.000,00	Köy Konağının Bakım Onarımı

SIRA NO	KÖYÜN ADI	YARDIMIN MİKTARI (TL)	YARDIMIN KONUSU
21	Merkez Kızılelma Köyü	2.500,00	Beton büz döşenmesi
22	Merkez Kocareis Köyü	2.900,00	kanal yapımı İşi
23	Mrk. Kutlubeyyazıcılar Köyü	2.900,00	Korige Boru alımı işi için
24	Merkez Hıdırlar Köyü	3.000,00	Beton kanal yapılması işi için
25	Merkez Akıncılar Köyü	2.000,00	Beton kanal yapılması işi için
26	Merkez Karşıyaka Köyü	2.000,00	Beton yol yapılması İşi
27	Merkez Bakioğlu Köyü	3.000,00	Beton yol yapılması İşi
28	Merkez Celilbeyoğlu Köyü	2.500,00	Beton yol yapılması İşi
29	Merkez Başoğlu Köyü	2.000,00	Beton yol yapılması İşi
30	Merkez Akağaç Köyü	2.500,00	Beton parke döşenmesi
31	Merkez Sütlüce Köyü	3.000,00	Beton parke döşenmesi
32	Merkez Sülek Köyü	2.000,00	İstinat duvarı yapılması işi
33	Merkez Köyyeri Köyü	2.000,00	İstinat duvarı yapılması işi
34	Merkez Aşağıdere Köyü	2.500,00	Beton kanal yapılması işi için
35	Merkez kaşbaşı Köyü	1.500,00	İstinat duvarı beton kanal yapılması işi
36	Merkez Hasanlar Köyü	1.500,00	Muhtarlık binasının tamiri için malz. yard.
37	Merkez Şahin Köyü	1.500,00	Eski Okul Binasının tamiri
38	Merkez Geriškaticı Köyü	1.500,00	Şadırvan tamiri için malzeme yardımı
39	Merkez Akçalı Köyü	2.000,00	Mezarlık çevre düzenlemesi işi
40	Merkez Yanaz Köyü	2.000,00	Mezarlık çevre düzenlemesi işi
41	Merkez Epçilerkadı Köyü	2.000,00	Mezarlık çevre düzenlemesi işi
42	Merkez Gürpınar Köyü	1.500,00	Köprü Korkulukları yapılması işi

SIRA NO	KÖYÜN ADI	YARDIMIN MİKTARI (TL)	YARDIMIN KONUSU
43	Merkez Ören Köyü	1.750,00	Muhtarlık Binası Onarımı
44	Merkez Epçiler Köyü	3.000,00	Çömlekçi Mah. Kanal yapılması işi
45	Merkez Yeşilkaya Köyü	2.000,00	haca mah.camisinin şadırvanının çevre düz.
46	Merkez Uğurlar Köyü	2.000,00	Beton kanal yapılması işi için
47	Merkez Fırımlı Köyü	2.000,00	Beton kanal yapılması işi için
48	Merkez Karainler Köyü	2.000,00	Cami bahçesinin bahçesi duvarlarının yap.
49	Merkez Okçular Köyü	2.500,00	Yol kenarına su kanalı ve menfez yap.ışı
50	Merkez Geriş Köyü	2.000,00	İstinat duvarı yapılması işi
51	Merkez Esbey Köyü	1.750,00	Şadırvan tamirâtı için malzeme yardımı
52	Merkez Yıldız Köyü	2.000,00	İstinat duvarı yapılması işi
53	Merk. Karaköyşeyhler köyü	2.000,00	Beton yapılması İşi
54	Merkez Uzunöz Köyü	1.500,00	İstinat duvarı yapılması işi
55	Merkez Gürgenpınarı Köyü	2.500,00	İstinat duvarı yapılması işi
56	Merkez Akmanlar Köyü	3.000,00	Köy Konağı Çatı onarım İşi
57	Merkez Çayır Köyü	3.000,00	Aşağı mah. Ve köy camisinin kanz.ışı
58	Merkez Budakdüzü Köyü	3.000,00	Yol kenarına su kanalı yap.ışı
59	Merkez Çakırkadı Köyü	2.500,00	İstinat duvarı yapılması işi
60	Merkez Çamlık Köyü	2.500,00	İstinat duvarı yapılması işi
61	Merkez Yeşilyurt Köyü	3.000,00	Çeşme yapımı işi için
62	Merkez Bakraçboz Köyü	2.000,00	Eski okul onarımının yapılması işi
63	Merkez Karayakup Köyü	2.000,00	Eski okul onarımının yapılması işi
64	Merkez Akbaş Köyü	2.500,00	Eski okul onarımının yapılması işi

SIRA NO	KÖYÜN ADI	YARDIMIN MİKTARI (TL)	YARDIMIN KONUSU
65	Merkez Ecikler Köyü	3.000,00	Beton yol yapılması işi
66	Merkez Akçamescit Köyü	2.000,00	Beton parke yol yapılması işi
67	Merkez Dırazlar Köyü	2.500,00	Beton kanal yapılması işi için
68	Merkez Şirinköy Köyü	2.500,00	İstinat duvarı yapılması işi
69	Merkez Ustaoglu Köyü	2.500,00	Beton kanal yapılması işi için
70	Mrk.Ulugeçitambarcı Köyü	2.500,00	Köy konağı çatısının mevcut onarım işi
71	Merkez Esenyurt Köyü	3.000,00	Cami duvarı yapım işi
72	Merkez Çeştepe Köyü	3.000,00	Cami duvarı yapım işi
73	Merkez Derbent Köyü	2.500,00	Kanalizasyon borusu alımı işi
74	Merkez Mamak Köyü	2.000,00	Mezarlık etrafına beton direk yapılması işi
75	Merkez Hanyeri Köyü	2.500,00	Mezarlık etrafına beton direk yapılması işi
76	Merkez Çöpbeş Köyü	1.000,00	Köprü korkuluğu yapılması işi
77	Merkez Doğaşı Köyü	1.000,00	Mezarlık çevre düzenlemesi işi
78	Merkez Serdar Köyü	2.500,00	Asfalt kenarlarına su kanalı yapılması işi için
79	Merkez Kayadibikavlak Köyü	3.000,00	Köy meydanına parke taş yapılması işi için
80	Merkez Aydınlar Köyü	2.000,00	Menfez yapılması için
81	Merkez Darıören Köyü	2.500,00	Beton yol yapılması işi için
82	Merkez Akpınar Köyü	3.000,00	Cami yapılması işi için
83	Merkez Gençali Köyü	2.500,00	Cami ve lojman tadilatı yapılması işi için
84	Merkez İmamlar Köyü	1.750,00	Köprü korkuluğu yapılması işi için
85	Merkez Çukurbük Köyü	1.400,00	Su deposu yapılması işi için
TOPLAM :		194.250,00	

2011 YILI ULUS İLÇE VE KÖYLERİNE NAKDİ YARDIM			
SIRA NO	KÖYÜN ADI	YARDIMIN MİKTARI (TL)	YARDIMIN KONUSU
1	Ulus Konuklu Köyü	1.500,00	Serdaroğlu mah.beton büz döşemesi
2	Ulus Hisar köyü	1.000,00	Beton kanal yapımı
3	Ulus Ulukaya Köyü	1.500,00	Budamiş Mah.Cami şadırvanı için Malz.Yard.
4	Ulus Küllü Köyü	1.000,00	Sarıcağaç Mah.şadırvanı için Malz.Yard.
5	Ulus Hasanören Köyü	1.000,00	İstinat Duvarı Yapılması İçin
6	Ulus Dorucaşahince Köyü	2.500,00	İstinat Duvarı Yapılması İçin
7	Ulus Kirsinler Köyü	1.750,00	Beton yol yapılması İşi
8	Ulus Yenikışla Köyü	1.250,00	Beton kanal yapılması işi için
9	Ulus Öncüler Köyü	1.000,00	Cami avlusuna duvar yapımı işi
10	Ulus Kalecik Köyü	1.000,00	Cami çevresi bakım onarımı
11	Ulus Yukarıdere Köyü	1.500,00	Menfez yapılması işi
12	Ulus Eldeş Köyü	2.750,00	camii çevresi düz.ışı ve çeşmenin bak.on.
13	Ulus Bahçecik Köyü	1.250,00	Cami şadırvanının bakım onarımı
14	Ulus Düz Köyü	1.000,00	Cami şadırvanının bakım onarımı
15	Ulus Karadiken Köyü	1.000,00	Cami şadırvanının bakım onarımı
16	Ulus Gökpınar Köyü	1.250,00	Cami şadırvanının bakım onarımı
17	Ulus Eseler Köyü	2.000,00	Eski okulun bakım onarımı işi
18	Ulus Alıçlı Köyü	2.750,00	Beton parke döşenmesi
19	Ulus Aşağıdere Köyü	1.250,00	İstinat duvarı yapılması işi
20	Ulus Şirinler Köyü	1.250,00	Şadırvan tamiri İşi için
21	Ulus Güneyören Köyü	1.000,00	Köy konağı bakım onarım işi
22	Ulus Aşağıçamlı Köyü	1.250,00	Köy konağı alt katına ıslak hacim yapılması
23	Ulus Abdurrahman Köyü	1.000,00	Cami alt katındaki yemekhane onarım işi

SIRA NO	KÖYÜN ADI	YARDIMIN MİKTARI (TL)	YARDIMIN KONUSU
24	Ulus Çubukbeli Köyü	1.000,00	Köy konağı bakım onarım işi
25	Ulus İbrahimderesi Köyü	1.250,00	Köprü ayakları için beton
26	Ulus Konak Köyü	1.750,00	Kapalı kanal için İnş. Malz. alınması
27	Ulus Çavuş Köyü	1.250,00	Su kanallarının beton ile kaplanması işi için
28	Ulus İğneciler Köyü	2.500,00	Beton yol yapımı işi için
29	Ulus Hoca Köyü	750,00	Toprak alana beton yapılması işi için
30	Ulus Zafer Köyü	1.750,00	Su şebekesinin bakım ve onarımı işi için
31	Ulus Üçsaray Köyü	1.000,00	Kanal çalışması yapılması işi için
32	Ulus Ceyüpler Köyü	500,00	Yeni Mah. kanalizasyon borusu işinde kullanılmak üzere
33	Ulus Uluköy Köyü	1.250,00	Boru ihtiyacı için
34	Ulus Akörensöküler Köyü	1.000,00	Su şebekesinin bakım ve onarımı işi için
35	Ulus Döngeller Köyü	1.000,00	Köy konağının tamirati için
36	Ulus Keçideresi Köyü	1.250,00	Merkez cami onarımı işi
37	Ulus Dibektaş Köyü	1.000,00	Menfez yapımı için
TOPLAM :		48.750,00	

2011 YILI AMASRA İLÇE VE KÖYLERİNE NAKDİ YARDIM

SIRA NO	KÖYÜN ADI	YARDIMIN MİKTARI (TL)	YARDIMIN KONUSU
1	Amasra Yahyayazıcılar Köyü	2.500,00	Okul binasının bakım onarımı
2	Amasra Acarlar Köyü	2.500,00	camii ve mezarlık çevre düzenlemesi
3	Amasra Esenler Köyü	2.500,00	istinat duvarı için
4	Amasra Kazpınar Köyü	3.000,00	İstinat duvarı yapılması işi
5	Amasra Makaracı Köyü	2.500,00	Beton yol yapılması İş
6	Amasra Kocaköy Köyü	2.500,00	Çeşme inşaatına malzeme alımı
7	Amasra İnciğez Köyü	2.500,00	Cami çevre düzenlemesi işi
8	Amasra Yukarısal Köyü	2.500,00	Köy konağının kapı ve pencere doğ.yap. İş
TOPLAM :		20.500,00	

2011 YILI KURUCAŞİLE İLÇE VE KÖYLERİNE NAKDİ YARDIM

SIRA NO	KÖYÜN ADI	YARDIMIN MİKTARI (TL)	YARDIMIN KONUSU
1	Kurucaşile Kapısuyu Köyü	3.000,00	İstinat duvarı için
2	Kurucaşile Karaman Köyü	2.000,00	Köprü Betonarme tabliye işi
3	Kurucaşile Elvanlar Köyü	2.000,00	Çayırılı Mah. mezarlık duvarı
4	Kurucaşile Aydoğmuş Köyü	1.000,00	Beton yol yapılması İş
5	Kurucaşile Demirci Köyü	1.250,00	Sosyal donatılarının bakım onarımı
6	Kurucaşile Hacıköy Köyü	2.000,00	Beton yol yapımı
7	Kurucaşile Paşalılar Köyü	1.500,00	Beton kanal yapılması işi
8	K.Şile Dizlermezeci Köyü	1.500,00	Beton yol yapılması işi
9	Kurucaşile Şeyhler Köyü	1.500,00	
TOPLAM :		15.750,00	

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

SIRA NO	PROJE NO	PROJE/ FAALİYET ADI	MALİ YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	ÖZKAYNAK/ DIŞ KAYNAK	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME TARİHİ	İŞE BAŞLAMA TARİHİ	FİZİKİ GERÇ. %	MALİ GERÇ. %	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	SORUNLAR VE AÇIKLAMALAR
1	44.74.37/01.3.9.01/5/06.7	Hizmet Binası ve Lojmanların Onarımı Giderleri	100.000,00						100	94		94.854.32TL. harcama yapılmış olup , bakım ve Onarım İşi Tamamlanmıştır.
2	44.74.37/01.3.9.05/5/06.5	İl özel İdaresi Lojmanına Asansör Yapımı	70.000,00						-			Birinci yapılan ihale 03/05/2011 tarihinde evrak eksikliği nedeniyle iptal edilmiştir. İki nci yapılan ihale 20/07/2011 tarihinde K.İ.K. 39.maddesi gereğince iptal edilmiştir.
3	44.74.37/01.3.9.06/5/06,7	Vali Konağı Lojman bakım Onarımı	25.000,00						100			2.938,20 Tl. kanalizasyon onarım işi yapılmıştır. 14.868,00 Vali Konağı Lojman Onarım İşi tamamlanmıştır.

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU


SIRA NO	PROJE NO	PROJE/ FAALİYET ADI	MALİ YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	ÖZKAYNAK/ DIŞ KAYNAK	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME TARİHİ	İŞE BAŞLAMA TARİHİ	FİZİKİ GERÇ. %	MALİ GERÇ. %	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	SORUNLAR VE AÇIKLAMALAR
4	44.74.37/01.3.9.07/8/06.5	Merkez Kayadibi Kavlak beton parke Yol yapım İşi	61.537,00	52.150,00 TL. ihale bedeli (Keşif artışı dahil)	İller Bankası	11/08.2011	09.09.2011	09.09.2011	100	100	27.09.2011	3500m2 beton parke yol yapılarak iş Tamamlanmıştır.
5	44.74.37/01.3.9.07/8/06.5	Merkez Eskiirmirler Köyü Beton Parke Yol yapım İşi	57.736,16	48.928,95 TL. İhale bedeli (Keşif artışı dahil)	İller Bankası	11/08..2011	09.09.2011	09.09.2011	100	100	06.10.2011	3087 m2 beton parke yol yapılarak iş tamamlanmıştır.
6	44.74.37/01.3.9.07/8/06.5	Amasra Çanakçılar Köyü Beton Parke Yol Yapım İşi	67.999,86	57.627,00 TL. İhale bedeli (Keşif artışı dahil)	İller Bankası	11/08..2011	09.09.2011	09/09.2011	100	100	24.10.2011	3420 m2 beton parke yol yapılarak iş tamamlanmıştır.
7	44.74.37/01.3.9.07/8/06.5	Kurucaşile İlyasgeçidi kapısuyu yeniköy Beton parke Yol yapım İşi	170.089,91	144.144,00 TL. İhale bedeli (Keşif artışı dahil)	İller Bankası	11.08.2011	12.09.2011	13.09.2011	100	100	31.10.2011	6.160 m2 beton parke yol yapılarak iş Tamamlanmıştır.
8	44.74.37/01.3.9.07/8/06.5	Bartın Geriş Köyü Beton Parke ve Bordür yapım İşi	57.613,50	48.825, 00 TL ihale bedeli ‘ (Keşif artışı dahil)	İller Bankası	11.08.2011	09/09.2011	09/09.2011	100	100	28.11.2011	1489 m2 parke yol ile ve 2023 mt. Bordür yapılarak iş Tamamlanmıştır
9	44.74.37/01.3.9.07/8/06.5	Kurucaşile Kapısuyu Başköy Köyü Beton parke Yol yapım İşi	34.260,97	29.034,72 Tl. ihale bedeli (Keşif artışı dahil)	İller Bankası	03.11.2011	22.11.2011	23.11.011	100	100	01.12.2011	1240,8 m2 beton parke yol yapılarak iş tamamlanmıştır.

- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İl Özel İdaremizde 3 İlçe Müdürlükleri ile birlikte toplam 119 adet memur kadrosu mevcut olup, bu kadroların 65 adedi Genel İdare Hizmetleri, 1 adedi Avukatlık Hizmetleri, 28 adedi Teknik Hizmetler, 10 adedi Sağlık Hizmetleri ve 15 adedi Yardımcı Hizmetler sınıfındadır. Dolu kadro sayısı 46 adet ve boş kadro sayısı ise 73 adettir.

İdaremizde 46 adet memur, 118 daimi işçi 16 sözleşmeli personel kadro karşılığı çalıştırılmaktadır. Memur, işçi ve sözleşmeli personel statüsünde **idaremizde toplam çalışan 180 kişi** olup, İl Özel İdaresinde görev yapmakta olan personellere ait tablosu aşağıda gösterilmiştir.

İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUM CETVELİ



- Memur Alımı:

İdareimizce Devlet Personel Başkanlığı'ndan personel talebinde bulunulmuş , ÖSYM tarafından KPSS sonucuna göre yerleştirilen ve idareimizce;

- 2 adet 6. Derece Memur
- 1 adet 10. Derece Memur
- 2 adet 9. Derece Programcı personelin atamaları yapılmıştır.

- Diğer Kurumlara Ataması Yapılan Personeller:

6111 sayılı yasa gereğince idareimizden ;

- | | |
|---|---------|
| - Amasra Taş Kömürü İşletme Müdürlüğüne | 1 adet |
| - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne | 1 adet |
| - İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne | 1 adet |
| - İl Milli Eğitim Müdürlüğüne | 1 adet |
| - İl Sağlık Müdürlüğüne | 2 adet |
| - İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne | 5 adet |
| - Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne | 40 adet |
- olmak üzere toplam 51adet personelin ataması yapılmıştır.**

Ayrıca; yine 6111 sayılı kanun kapsamında 20 adet daimi işçi personelimizin emeklilik iş ve işlemleri yapılmıştır.

- Hizmet Alımı:

Müdürlüğümüzce 2011 yılı içinde Kamu İhale Kanunu'nun 21/f usulü ile ihale yapılarak ;

- | | |
|-------------------|--------|
| - Sekreter | 1 adet |
| - Temizlik İşçisi | 5 adet |
| - Kaloriferci | 4 adet |
- olmak üzere toplam 10 adet hizmet alımı yapılmıştır.**

- Sözleşmeli Personel:

İdareimize 2011 yılında 1 adet Mimar 1 adet Elektrik Teknikeri Sözleşmeli olarak işe alınmıştır.

- 1 adet Avukat
- 1 adet Mimar
- 1 adet Şehir Plancısı
- 9 adet Mühendis
- 2 adet Tekniker
- 2 adet Programcı olmak üzere **toplam 16 adet sözleşmeli personel** çalıştırılmaktadır

- Mikro Kredi:

5302 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince hazırladığımız Uygulama Yönergesine göre, idareimizce 2011 Yılında bütçemizden 40.000,00 TL ayrılmış olup, 2011 yılı sonu itibariyle **14 kişiye toplam 20.500,00 TL'lik mikro kredi** verilmiştir.



- Hizmet İçi Eğitim:

Hizmet içi Eğitim Yönetmeliğine göre 2011 yılında da eğitime önem verilerek, önceliklere göre hazırlanan hizmet içi eğitim planı doğrultusunda 5 adet Hizmet içi Eğitim Semineri düzenlenmiştir.

Ayrıca idareimizde görevli teknik personeller için 5 gün süreli NETCAD Ulusal CAD ve GİS çözümleri Mühendislik Bilgisayar Tic. A.ş. den çalışan teknik personellere Eğitim Semineri verilmiştir.



Hizmet İçi Eğitimlerimiz



- Sosyal Etkinlikler:

Bartın İl Özel İdaresi olarak 18-22 Mayıs 2011 tarihleri arası Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Renk Renk Türkiye 3. İller Kültür ve Turizm Fuarı'nda ilimize özgü ürünler ile tanıtım materyalleri sergileyerek ilimizin en iyi şekilde tanıtılmasını sağladık.



- Bilgi Edinme:

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
2011 RAPORU

Başvuru Durum	Bartın İl Özel İdaresi BİMER	Bartın İl Özel İdaresi E-POSTA	Bartın İl Özel İdaresi E-Bilgi Edinme	TOPLAM
Olumlu	43	27	22	92
Kısmen Olumlu	35	40	2	77
Olumsuz	10	8	0	18
Yönlendirilen	9	8	0	17
Toplam	97	83	24	204

Cevaplanmayan 1 0 4

- İletişim:



BARTIN İL ÖZEL İDARESİ



Tel : 0(378) 228 50 20 (5 Hat)

Vali

İl Genel Meclisi

İl Encümeni



Menu

[Anasayfa](#)

[İl Özel İdare Organları](#)

[İl Özel İdare Teşkilatı](#)

[Faaliyetler](#)

[Haber Arşivi](#)

[Mevzuat](#)

[Bina ve Tesisler](#)

[Köylerimiz](#)

[Önemli Linkler](#)

[Videolar](#)

[Fotoğraflar](#)

[Önemli Dosyalar](#)

[İhale İlanları](#)

[Doğrudan Temin İlanları](#)

[Bartın](#)

[İletişim](#)



İhaleler CANLI YAYIN'da

Bartın İl Özel İdaresi Canlı Yayın Sistemi kurulmuş olup, bundan sonraki tüm ihalelerimiz web adresimizden "CANLI" olarak izlenebilecektir.

www.bartinozelidare.gov.tr

TOKİ Başvuru Duyurusu



TOKİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

Brifing Raporu

2010 YILI BRİFİNG RAPORU

Performans Programı

2011 YILI KURUMSAL PERFORMANS PROGRAMI

TÜM İHALELER CANLI OLARAK WEB ADRESİMİZDE

76 adet

E-İÇİŞLERİ E-İMZA CETVELİ

Birim	Giden Evrak İmza		e- İmza Oranı %	Giden Evrak Paraf		e-Paraf Oranı %
	Toplam	E-imzalı		Toplam	E-parafı	
Dış İlişkiler Müdürlüğü	1.823	1.519	83,32	2.564	1.595	62,21
Encümen Müdürlüğü	175	168	96,00	179	162	90,50
Hukuk Müşavirliği	106	83	78,30	105	96	91,43
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	2.828	1.966	69,52	2.994	1.050	35,07
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.286	1.080	83,98	1.761	1.102	62,58
Mali Hizmetler Müdürlüğü	558	365	65,41	864	522	60,42
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	880	788	89,55	963	869	90,24
Sağlık İşleri Müdürlüğü	283	215	75,97	321	241	75,08
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	927	810	87,38	1.139	786	69,01
Yazı İşleri Müdürlüğü	473	439	92,81	521	458	87,91
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	1.679	1.580	94,10	2.363	1.613	68,26
Amasra İlçe Özel İdare Müdürlüğü	194	192	98,97	199	186	93,47
Kurucay İlçe Özel İdare Müdürlüğü	138	126	91,30	168	61	36,31
Ulus İlçe Özel İdare Müdürlüğü	688	558	81,10	323	196	60,68
Bartın İl Özel İdaresi	12.038	9.889	82,15	14.464	8.937	61,79

- DIŐ İLİŐKİLER MÜDÜRLÜĐÜ FAALİYETLERİ

1- EĐİTİM:

A) Yeni Okul Yapımı:

Fen Lisesi (Merkez İlköğretim Okulu)Yapımı ve 200 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapımı Bitirilerek 2011–2012 Öğretim Yılında Eğitime Başladı.

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU (FEN LİSESİ BİNASI VE ÖĞRENCİ YURDU)



B) Ek Bina Yapımı :

Yanaz İlköğretim Okulu Ek Bina Proje Yapımı işi tamamlanmıştır.

C) Deprem Güçlendirme:

Mustafa Kemal İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme ve Onarım İnşaatı bitirilerek eğitim ve öğretime başlanmıştır.



D) Onarım :

- İlköğretim Okulu 29 adet
- Ortaöğretim Okulu 11 adet

olmak üzere **TOPLAM 40 adet** okulumuzun onarımları yapılmıştır.

Ayrıca;

- Atatürk İ.Ö.O Yapımı Proje İhalesini gerçekleştirilmiştir.
- Akcamescit Spor Salonu Proje İhalesini gerçekleştirilmiştir.

İLKÖĞRETİM KURUMLARI		ORTAÖĞRETİM KURUMLARI	
1	Şehit Necdet Orhan Yibo Onarımı	1	İ.H.L. Onarımı
2	Ulus Kumluca Yibo Onarımı	2	Köksal Toptan Lisesi Onarımı
3	Ahmetler İlköğretim Okulu Onarımı	3	Bilim Sanat Merkezi Onarımı
4	Akçalı İlköğretim Okulu Onarımı	4	Sağlık Meslek Lisesi Onarımı
5	Akpınar İlköğretim Okulu Onarımı	5	Merkez Teknik Lise ve EML Onarımı
6	Fatih İlköğretim Okulu Onarım	6	Kız Meslek Lisesi Onarımı
7	İnönü İlköğretim Okulu Onarım	7	Ulus ÇPL Onarımı
8	Karahüseyinli İlköğretim Okulu Onarımı	8	Cumhuriyet Lisesi Onarımı
9	Uğurlar BŞİ Onarımı	9	Kurucaşile ÇPL Onarımı
10	Kemal Sabriye Ocakçı İlköğretim Okulu Onarımı	10	Amasra Turizm Otelcilik Pans. Bin. Onarımı
11	Köksal Toptan İlköğretim Okulu Onarımı	11	Kozcağız ÇPL Onarımı
12	Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu Onarımı		
13	Kaleşah İlköğretim Okulu Onarımı		
14	Kozcağız İlköğretim Okulu Onarımı		
15	Budakdüzü İlköğretim Okulu Onarımı		
16	M.A.Ersoy İlköğretim Okulu Onarımı		
17	Epçiler İlköğretim Okulu Onarımı		
18	Aydınlr İlköğretim Okulu Onarımı		
19	Herdekyanı İlköğretim Okulu Onarımı		
20	Ecikler İlköğretim Okulu Onarımı		
21	Zafer İlköğretim Okulu Onarımı		
22	Çanakçılar İlköğretim Okulu Onarımı		
23	Hisar Pirireis İlköğretim Okulu Onarımı		
24	Kurucaşile Merkez İlköğretim Okulu Onarımı		
25	Şehit Ahmet Seçen Rehberlik Araştırma Merkezi		
26	Kurucaşile Sarıderesi İlköğretim Okulu		
27	Umut İlköğretim Okulu		
28	Ulus Hasandede İlköğretim Okulu		
29	Hasankadı İlköğretim Okulu		

E) Okul Öncesi Eğitim:

Merkez İlçede;

- Yuva Anaokulu Onarımı,
- 7 Eylül Anaokulu Onarımı ve
- Gökkuşığı Anaokulu Onarımları olmak üzere **3 adet anaokulu onarımı** gerçekleştirilmiştir.

YUVA ANAOKULU



7 EYLÜL ANAOKULU




F) Öğretmen Evlerinin Onarımı :

- Kurucaşile Öğretmenevi Onarımı
- Ulus Öğretmenevi Onarımı olmak üzere **toplam 2 adet öğretmen evi onarım** tamamlanmıştır.

G) Donatım İhtiyacı

- Tüm Lise ve İlköğretim Okullarının muhtelif donatım ihtiyaçları öz kaynak ve dış kaynaktan karşılanmıştır.
- Yeni açılan ana sınıflarına donatım malzemesi alımı öz kaynak ve dış kaynaktan karşılanmıştır.
- **20 adet İ.Ö.O Okulumuza Akıllı Tahta** alımı yapılmıştır.
- Bilim Sanat Merkezine materyal alımı yapılmıştır.



H) Taşımalı İlköğretim Uygulaması Kapsamında

5539 adet İlköğretim Okulu Öğrencisinin 36 adet Taşıma Merkezi İlköğretim Okuluna 178 iş Günü Taşınması Hizmet Alımını Gerçekleştirdik

369 adet Ortaöğretim Öğrencisinin 8 adet Taşıma Merkezi Lise Müdürlüğüne 178 iş günü taşınması Hizmet Alımını gerçekleştirdik.



Diğer Giderler:

- **956 adet** eskiyen okul sırasını yenileme projesini gerçekleştirdik;
- **İlköğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarımızın elektrik, ADSL ve su sarfiyat bedelleri** ödenerek ihtiyaçları karşılanmıştır.
- İlköğretim ve Anaokullarımıza **874 ton yakacak alımı** gerçekleştirdik.
- **21 adet** İlköğretim Okuluna temizlik personeli hizmeti alımı gerçekleştirilmiştir.



2-SPOR :

- Şehirde ne varsa köyde de o olacak sloganıyla yola çıkarak 2011 yılında **4 adet köyümüze gençlerin oynayabileceği futbol sahaları** yapılmıştır.
- İlimizde faal olan **14 adet Amatör Spor Kulübüne krampon** alınarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
- **Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonuna Jeneratör alımı** yapılmıştır.
- **Atatürk Stadyumuna giriş - çıkışlar için turnike alımı** gerçekleştirilmiştir.



GÜRGENPINARI FUTBOL SAHASI



KOZCAĞIZ FUTBOL SAHASI



SERDAR KÖYÜ FUTBOL SAHASI



3- EMNİYET:

- **Kurucaşile, Amasra, Ulus ve Merkez Polis Karakollarının bakım ve onarımları** gerçekleştirilmiştir.
- **Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE)** yapımı gerçekleştirilmiştir.

- Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (Mobese):

Trafik düzenlemesinde kullanılacak ve güvenlik çalışmalarını da birçok yönden kolaylaştıracak olan Kent Güvenlik Sistemi (MOBESE), İl Özel İdaremiz tarafından yapımı gerçekleştirilmiştir.



4- JANDARMA:

- Bartın Merkez Otobüs Terminali ve Kozcağız Cadde ve Sokaklarına Güvenlik Kamerası kurulması işi ihalesi öncesi hazırlıklar tamamlanmış olup, söz konusu işin ihalesi 2012 mali yılında yapılacaktır.

5- KÜLTÜR TURİZM:

- Amasra İlçesinde bulunan tarihi Bedesten tarihi Bedesten Kalıntılarının gün yüzüne çıkartılması için yapılacak **arkeolojik kazı çalışmalarında** İdareimizce ödenek tahsis edilerek kazı alanının diri bitki örtüsü temizliğine başlanılmıştır.

- 1993 yılında temeli atılan ve atıl durumda bulunan **Bartın Kültür Merkezi İnşaata** proje revize edilerek 30.12.2009 tarihinde başlanılan Deprem Güçlendirme ve İkmal İnşaata İşine 26.07.2011 tarihinde tamamlanarak İlimize kazandırılmıştır.

ESKİ HALİ



YENİ HALİ



YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (YTL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1	Eğitim		5	İlköğretim Okulları Deprem Güçlendirme (Mustafa Kemal İÖO)	Bartın	400.000,00	9.906,64	390.090,36	267..261,88	71	100	Tamamlanmıştır.
2	Eğitim		5	Yanaz İlköğretim Okulu Ek Derslik Yapımı	Bartın	400.000,00		100.000,00	11.800,00	12	100	Yaklaşık Maliyet Hazırlıklarına başlanılmıştır.
3	Eğitim		5	Anaokulu Yapımı	İl Geneli	450.000,00		200.000,00		0		Anaokulu yapımı için bağışlanan arsa için Amasra Belediye Başkanlığınca 21/01/2011 tarih ve 175 sayılı yazı ile Koruma amaçlı imar planı çalışmalarının devam ettiği bildirilerek plan onaylandıktan sonra işlemlere başlanılacaktır.
4	Eğitim		5	Şehit Necdet Orhan Yibo Onarımı	Bartın	90.000,00		52.432,60	42.156,10	80	100	Tamamlanmıştır.
5	Eğitim		5	Ulus Kumluca Yibo Onarımı	Ulus	90.000,00		45.000,00	783,96	2	100	Tamamlanmıştır.
6	Eğitim		5	Ahmetler İlköğretim Okulu Onarımı	Bartın	50.000,00		25.000,00	25.000,00	100	100	Tamamlanmıştır.
7	Eğitim		5	Akçalı İlköğretim Okulu Onarımı	Bartın	30.000,00		20.000,00	18.304,45	92	100	Tamamlanmıştır.
8	Eğitim		5	Akpınar İlköğretim Okulu	Bartın	40.000,00		25.000,00	23.875,16	96	100	Tamamlanmıştır.

YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

9	Eğitim		5	Fatih İlköğretim Okulu Onarım	Bartın	25.000,00		10.000,00	6.412,90	64	100	Tamamlanmıştır.
10	Eğitim		5	İnönü İlköğretim Okulu Onarım	Bartın	30.000,00		15.000,00	15.000,00	100	100	Tamamlanmıştır.
11	Eğitim		5	Karahüseyinli İlköğretim Okulu Onarımı	Bartın	30.000,00		15.000,00	12.413,48	83	100	Tamamlanmıştır.
12	Eğitim		5	Uğurlar BSİ Onarım	Bartın	15.000,00		15.000,00	14.042,00	94	100	Tamamlanmıştır.
13	Eğitim		5	Kemal Sabriye Ocakçı İlköğretim Okulu Onarımı	Bartın	30.000,00		15.000,00	14.940,08	100	80	Tamamlanmıştır.
14	Eğitim		5	Makaracı İlköğretim Okulu Onarımı	Amasra	10.000,00						İl genel Meclisinin 5.10.2011 tarih ve 62 sayılı Kararın ile Programdan çıkartılmıştır.
15	Eğitim		5	Köksal Toptan İlköğretim Okulu Onarımı	Amasra	25.000,00		10.000,00	9.971,00	100	100	Tamamlanmıştır.
16	Eğitim		5	Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu Onarımı	Amasra	40.000,00		20.000,00	19.942,00	100	100	Tamamlanmıştır.
17	Eğitim		5	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapımı	Bartın	50.000,00		35.000,00		0		İl genel Meclisinin 5.10.2011 tarih ve 64 sayılı Kararın ile Programdan çıkartılmıştır.
18	Eğitim		5	Yuva Anaokulu Onarımı	Bartın	50.000,00		25.000,00	20.860,51	83	100	Tamamlanmıştır.
19	Eğitim		5	Kaleşah İlköğretim Okulu Onarımı	Amasra	30.000,00		15.000,00	14.927,00	100	100	Tamamlanmıştır.
20	Eğitim		5	Kozcağz İlköğretim Okulu Onarımı	Bartın	50.000,00		40.000,00	35.840,31	90	100	Tamamlanmıştır.
21	Eğitim		5	Budakdüzü İlköğretim Okulu Onarımı	Bartın	50.000,00		40.000,00	33.994,91	85	100	Tamamlanmıştır.

YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

22	Eğitim		5	Karaman İlköğretim Okulu Onarımı	Kurucaşile	30.000,00						İl genel Meclisinin 5.10.2011 tarih ve 62 sayılı Kararın ile Programdan çıkartılmıştır.
23	Eğitim		5	Mehmet Akif Ersoy Okulu Onarımı	Ulus	30.000,00		16.100,59	12.826,60	80	100	Tamamlanmıştır.
24	Eğitim		5	Ağaköy İlköğretim Okulu Çevre Düzenlemesi	Ulus	40.000,00		20.000,00				İl genel Meclisinin 5.10.2011 tarih ve 62 sayılı Kararın ile Programdan çıkartılmıştır.
25	Eğitim		5	Epçiler ilköğretim Okulu Onarımı	Bartın	40.000,00		30.000,00	28.025,27	93	100	Tamamlanmıştır.
26	Eğitim		5	Atatürk İlköğretim Okulu Zemin Etüdü ve Proje Yapımı	Bartın	20.000,00		20.000,00		0		Devam ediyor.
27	Eğitim		5	Aydınlr İ.Ö.O. Onarım	Bartın	25.000,00		25.000,00	24.902,96	100	100	Tamamlanmıştır.
28	Eğitim		5	Hendekyanı İ.Ö.O Onarımı	Bartın	60.000,00		30.000,00	26.422,45	88	100	Tamamlanmıştır.
29	Eğitim		5	Akbaş Kışla İ:Ö.O Onarımı	Bartın	17.000,00		17.000,00		0		İl genel Meclisinin 5.10.2011 tarih ve 62 sayılı Kararın ile Programdan çıkartılmıştır.
30	Eğitim		5	Ecikler İ.Ö.O Onarımı	Bartın	35.000,00		35.000,00	29.109,93	83	100	Tamamlanmıştır.
31	Eğitim		5	Zafer İ.Ö.O Onarımı	Ulus	15.000,00		15.000,00	10.130,26	68	100	Tamamlanmıştır.
32	Eğitim		5	Çanakçılar İ.Ö.O Onarımı	Amasra	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100	100	Tamamlanmıştır.

YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

33	Eğitim		5	Hisar Piri Reis İ.Ö.O Onarımı	Kurucaşile	20.000,00		20.000,00	19.001,25	95	100	Tamamlanmıştır.
34	Eğitim		5	Kurucaşile Merkez İ.Ö.O Onarımı	Kurucaşile	25.000,00		25.000,00	22.712,03	91	100	Tamamlanmıştır.
35	Eğitim		5	Akıllı tahta Alımı Projesi	İl Geneli	70.000,00		70.000,00	64.223,39	92	100	DMO Aracılığı ile 20 Okulumuza Teslim Edildi
36	Eğitim		5	Bilim Sanat Merkezi Onarımı	Bartın	50.000,00		50.000,00	45.996,54	92	100	Tamamlanmıştır.
37	Eğitim		5	Kozcağz Halk Eğ.Mer.Zemin Etüdü ve Proje Yapımı	Bartın	50.000,00		50.000,00		0		İl genel Meclisinin 5.10.2011 tarih ve 64 sayılı Kararın ile Programdan çıkartılmıştır.
38	Eğitim		5	Kozcağz ÇPL.	Bartın	20.000,00		20.000,00	10.879,60	54	100	Tamamlanmıştır.
39	Eğitim		5	Bilim Sanat Merk. Metaryal alımı	Bartın	15.000,00		15.000,00	14.999,56	100	100	Mal Alımı Yapılarak Teslim Edildi.
40	Eğitim		5	Merkez İlköğretim Okulu İnşaatı	Bartın	3.341.760,38	1.983.117,04	41.977,96	11.741,00	28	100	Tamamlanmıştır.
41	Eğitim		5	İstiklal İ.Ö.O Onarımı	Bartın	20.000,00		17.000,00		0		İhale hazırlıklarına başlandı.
42	Eğitim		5	Ulus Abdipaşa İ.Ö.O Onarımı	Ulus	20.000,00		2.000,00		0		İhale hazırlıklarına başlandı.
43	Eğitim		5	25 adet İlköğretim Okulu küçük onarımları.	Bartın	170.000,00		170.777,71	164.712,89	96	100	Tamamlanmıştır.
44	Eğitim		5	İ.M.K.B İ.ö.o. Onarımı	Bartın	30.000,00		10.000,00		0		İhale hazırlıklarına başlandı.

YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMAR	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARC.	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1	Spor		5	Bartın Sen.Çim.Yüz.Ftb.Sh.Atlz.Pisti Işıklın.	Bartın	100.000,00		100.000,00				İl Genel Meclisine 2012 yılında değerlendirmek üzere teklif edildi.
2	Spor		5	Gürgenpınarı Ftb.Sahası	Bartın	50.000,00		50.000,00	38.943,76	78	100	Tamamlanmıştır.
3	Spor		5	Kurucaşile Ftb.Sh.Işıklandırılması	Kurucaşile	50.000,00		50.000,00		0		16/01/2012 tarihinde ihalesi yapılacaktır
4	Spor		5	Serdar Köyü Futbol Sahası	Bartın	36.854,00		10.690,00	2.890,10	27	100	Tamamlanmıştır.
5	Spor		5	Ömertepesi Kapalı Spor Salonu Jenaratör Alımı	Bartın	37.100,00		37.100,00	34.810,00	94	100	Tamamlanmıştır.
6	Spor		5	Kozcağz Futbol Sahası Çimlendirme Yapımı	Bartın	54.402,00		10.000,00			100	Tamamlanmıştır.

YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1	Kültür		5	Amasra Arkeolojik Kazı Çalışmaları	Amasra	130.000,00		80.000,00				Kazı yapılacak alanın Diri Bitki Örtüsü Temizliği İşi Doğrudan temin Usulu ile yapılmış olup sözleşmesi imzalanarak yer teslim aşamasındadır.
2	Kültür		5	Kütüphanelere Yayın Alımı	Bartın	15.000,00		15.000,00				Kültür ve Turizm Müdürlüğünden kitap Listeleri gelerek İl Özel İdaresi yayın alımı Komisyonunda değerlendirilmek üzere yazısı yazılarak işleme başlanılmıştır.

YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (YTL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1	Eğitim		8	İlköğretim Okulları Deprem Güçlendirme (Mustafa Kemal İÖO)	Bartın	400.000,00		416.157,45	216.157,45	52	99	Tamamlanmıştır.
2	Eğitim		8	Yanaz İlköğretim Okulu Ek Derslik Yapımı	Bartın	400.000,00		450.000,00				Proje ihalesi gerçekleştirilmiş olup.Onaylanmıştır.
3	Eğitim		8	Anaokulu Yapımı	İl Geneli	450.000,00						Anaokulu yapımı için bağışlanan arsa için Amasra Belediye Başkanlığınca 21/01/2011 tarih ve 175 sayılı yazı ile Koruma amaçlı imar planı çalışmalarının devam ettiği bildirilerek plan onaylandıktan sonra işlemlere başlanılacaktır.
4	Eğitim		8	Ulus Kumluca Yibo Onarımı	Ulus	90.000,00		55.000,00	55.000,00	100	100	Tamamlanmıştır.
5	Eğitim		8	Ahmetler İlköğretim Okulu Onarımı	Bartın	50.000,00		10.000,00	6.349,25	63	100	Tamamlanmıştır.
6	Eğitim		8	Akçalı İlköğretim Okulu Onarımı	Bartın	30.000,00		6.000,00	6.000,00	100	100	Tamamlanmıştır.
7	Eğitim		8	Fatih İlköğretim Okulu Onarım	Bartın	25.000,00		70.515,97	70.302,12	100	100	Tamamlanmıştır.
8	Eğitim		8	İnönü İlköğretim Okulu Onarım	Bartın	30.000,00		15.000,00	15.000,00	100	100	Tamamlanmıştır.
9	Eğitim		8	Karahüseyinli İlköğretim Okulu Onarımı	Bartın	30.000,00		15.000,00	15.000,00	100	100	Tamamlanmıştır.
10	Eğitim		8	Kemal Sabriye Ocakçı İlköğretim Okulu Onarımı	Bartın	30.000,00		35.000,00	35.000,00	100	100	Tamamlanmıştır.

YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

11	Eğitim		8	Köksal Toptan İlköğretim Okulu Onarımı	Amasra	25.000,00		15.000,00	13.111,22	87	100	Tamamlanmıştır.
12	Eğitim		8	Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu Onarımı	Amasra	40.000,00		10.000,00	7.825,57	78	100	Tamamlanmıştır.
13	Eğitim		8	Kaleşah İlköğretim Okulu Onarımı	Amasra	30.000,00		10.000,00	8.317,94	83	100	Tamamlanmıştır.
14	Eğitim		8	Hendekyanı İ.Ö.O Onarımı	Bartın	60.000,00		20.000,00	20.000,00	100	100	Tamamlanmıştır.
15	Eğitim		8	Akçamescit İlköğretim Okulu Spor Salonu Yapımı	Bartın	496.500,00		497.841,00	19.175,00	4		Proje İhalesi gerçekleştirilmiş olup Proje teslimi yapılmıştır.
16	Eğitim		8	Yuva Anaokulu Onarımı	Bartın	50.000,00		15.000,00	15.000,00	100	100	Tamamlanmıştır.
17	Eğitim		8	Şirinler Anaokulu Onarımı	Bartın	10.000,00		10.000,00	8.893,03	89	100	Tamamlanmıştır.
18	Eğitim		8	Merkez İlköğretim Okulu İnşaatı	Bartın	3.341.760,38	467.421,27	849.244,11	207.555,38	79	97	Tamamlanmıştır.
19	Eğitim		8	Amasra Ç.P.L. Pansiyon İkmal İnşaatı	Amasra	76.753,00		76.753,00	54.116,55	71	100	Tamamlanmıştır.
20	Eğitim		8	Köksal Toptan Lisesi Onarımı	Bartın	7.740,00		167.740,00	119.256,61	71	100	Tamamlanmıştır.
21	Eğitim		8	Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Onarımı	Bartın	58.027,86		58.027,86		0		İl Genel Meclisinin 06.12.2011 tarih ve 80 sayılı kararı ile 2011 Yılı Yatırım Programından Çıkarılmıştır.
22	Eğitim		8	İmam Hatip Lisesi	Bartın	414.000,00		449.593,45	119.716,23	27	100	Tamamlanmıştır.
23	Eğitim		8	Merkez Teknik Lise ve E.M.L. Onarımı	Bartın	109.111,00		183.981,97	182.253,20	99	100	Tamamlanmıştır.
24	Eğitim		8	Kız Meslek Lisesi Onarımı	Bartın	61.000,00		60.000,00	59.999,99	100	100	Tamamlanmıştır.
25	Eğitim		8	Bartın Öğretmenevi Onarımı	Bartın	32.443,80		32.443,80		0		Milli Eğitim Müdürlüğünün yazıları ile Deprem Güçlendirme yapılacağı bildirildiğinden Onarımın ertelenmesi talep edilmiştir.

YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

26	Eğitim		8	Davut Fırıncioğlu Anadolu Lisesi Onr.	Bartın	25.000,00		24.082,60		0		İl Genel Meclisinin 06.12.2011 tarih ve 80 sayılı kararı ile Yatırım Prog. Çıkarılmıştır.
27	Eğitim		8	Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi Onr.	Bartın	15.614,00		45.614,66		0		İhale Hazırlıklarına başlanmıştır
28	Eğitim		8	Ulus Ç.P.L. Onarımı	Ulus	32.000,00		31.405,66	25.400,36	81	100	Tamamlanmıştır.
29	Eğitim		8	Ulus Öğretmenevi Onarımı	Ulus	50.000,00		10.238,63	9.558,00	93	100	Tamamlanmıştır.
30	Eğitim		8	Kurucaşile Sarıdersi İ.Ö.O Onarımı	Kurucaşile	20.000,00		20.000,00	17.543,39	88	100	Tamamlanmıştır.
31	Eğitim		8	Kurucaşile Öğretmenevi Onarımı	Kurucaşile	20.000,00		20.000,00	14.493,30	72	100	Tamamlanmıştır.
32	Eğitim		8	Gökkuşluğu Anaokulu Onarımı	Bartın	9.868,00		9.868,00	9.204,00	93	100	Tamamlanmıştır.
33	Eğitim		8	Umut İ.Ö.O Onarımı	Bartın	18.000,00		25.329,22	14.555,84	57	100	Tamamlanmıştır.
34	Eğitim		8	Amasra Turizm Otelcilik Pans. Bin. Onarımı	Amasra	112.000,00		131.000,00	62.271,74	48	100	Tamamlanmıştır.
35	Eğitim		8	Ticaret Meslek Lisesi Onarımı	Bartın	40.000,00		40.000,00		0		İhale Hazırlıklarına başlandı.
36	Eğitim		8	Sağlık Meslek Lisesi Onarımı	Bartın	38.000,00		28.491,77		0		İhale Hazırlıklarına başlandı.
37	Eğitim		8	Bartın Halk Eğitim Merkezi	Bartın	33.000,00		28.000,00		0		İhale Hazırlıklarına başlandı.
38	Eğitim		8	Şehit Ahmet Seçen Rahb. Araştırma Merk. Onar.	Bartın	25.000,00		25.000,00	10.148,00	41	100	Tamamlanmıştır.
39	Eğitim		8	Kurucaşile Çok Programlı Lisesi Onarımı	Kurucaşile	40.000,00		10.000,00	9.676,00	97	100	Tamamlanmıştır.
40	Eğitim		8	İstiklal İ.Ö.O Onarımı	Bartın	20.000,00		3.000,00		0	100	İhale Hazırlıklarına başlandı.
41	Eğitim		8	Ulus Aptipaşa İ.Ö.O Onarımı	Ulus	310.000,00		10.000,00		0	100	İhale Hazırlıklarına başlandı.

YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

42	Eğitim		8	İ.M.K.B İlköğretim Okulu Onarımı	Bartın	30.000,00		20.868,20		0	100	İhale Hazırlıklarına başlanıldı.
43	Eğitim		8	Çanakçılar İ.Ö.O Onarımı	Amasra	34.000,00		34.000,00	33.893,53	100	100	Tamamlanmıştır.
44	Eğitim		8	Cumhuriyet Lisesi Onarımı	Bartın	200.000,00		208.000,00	189.907,46	91	100	Tamamlanmıştır.
45	Eğitim		8	Ağaköy İ.Ö.O Çevre düzenlemesi İşi	Ulus	20.000,00		6.990,00		0	100	İl genel Meclisinin 5.10.2011 tarih ve 62 sayılı Kararın ile Programdan çıkartılmıştır.
46	Eğitim		8	Bilim Sanat Merkezi Binası Yapımı	Bartın			500.000,00		0		Arsa Tahsis Çalışmaları Devam Etmekte
47	Eğitim		8	Apdipaşa İ.Ö.O. Ekbina ve Proje Yapımı	Ulus			200.000,00		0		Arsa Tahsis Çalışmaları Devam Etmekte
48	Eğitim		8	Merkez Öğrenci Yurdu Binası Yapımı	Bartın			20.000,00		0		Arsa Tahsis Çalışmaları Devam Etmekte
49	Eğitim		8	Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Onarımı	Bartın							İl genel Meclisinin 5.10.2011 tarih ve 64 sayılı Kararın ile Programdan çıkartılmıştır.
50	Eğitim		8	Hasankadı İ.Ö.O Onarımı	Bartın	15.000,00		15.000,00	13.452,00	90	100	Tamamlanmıştır.
51	Eğitim		8	Vilayetler Hizmet birliği Anaoklu Yapımı	Bartın							Ödenek Bekleniyor

YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (YTL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1	Spor		8	Serdar Köyü Futbol Sahası Yapımı	Bartın	36.854,00		26.164,00	26.137,00	100	100	Tamamlanmıştır.
2	Spor		8	Kozcağz Futbol Sahası Çimlendirme Yapımı	Bartın	54.402,00		44.402,10	42.949,13	97	100	Tamamlanmıştır.
3	Spor		8	Spor Tesisleri Yapımı	Merkez Ve İlçeler	150.000,00						İl Genel Meclisinin 06/12/2011 tarih ve 80 Sayılı Kararı ile programdan Çıkarılmıştır.
4	Spor		8	Spor Tesisleri Bakım Onarımı	Merkez Ve İlçeler	75.000,00						İl Genel Meclisinin 06/12/2011 tarih ve 80 Sayılı Kararı ile programdan Çıkarılmıştır.
5	Spor		8	Gençlik Merkezi Binası Yapımı	Bartın	75.000,00						İl Genel Meclisinin 06/12/2011 tarih ve 80 Sayılı Kararı ile programdan Çıkarılmıştır.
6	Spor		8	Kumluca Spor Sahası Çim.Işık.	Ulus	50.000,00						İl Genel Meclisinin 06/12/2011 tarih ve 80 Sayılı Kararı ile programdan Çıkarılmıştır.

YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (YTL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1	Kültür		8	Amasra Bedesten Röleve Rest.İnş.Elk. Prj.Yapımı	Amasra	230.000,00		20.000,00				2009 yılında Kültür Bakanlığınca hazırlanan yaklaşık maliyet ve mevcut ödeneği ile ihale işlemlerine başlanıp başlanamayacağı ile ilgili Kültür Müdürlüğüne görüş soruldu.
2	Kültür		8	Kültür Merkezi Deprem Güçlendirme ve İkmal İnşaatı	Merkez	6.000.000,00	2.930.574,10	3.540.923,09	3.540.923,09	100	100	Tamamlanmıştır.
3	Kültür		8	Arkeolojik Kazı Çalışmaları	Amasra	130.000,00		80.000,00				Kazı yapılacak alanın Diri Bitki Örtüsü Temizliği İşİ Doğrudan temin Usulü ile yapılmış olup sözleşmesi imzalanarak yer teslim aşamasındadır
4	Kültür		8	Arıt Belediyesine Kilit Parke Alımı	BARTIN	50.000,00		50.000,00	49.960,37	100	100	Tamamlanmıştır.

- ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Encümeni başlıklı 25 inci maddesi gereğince oluşturulan İl Encümeni; Encümenin Görev ve Yetkileri başlıklı 26 hıncı maddesi hükümleri gereğince, görev ve yetkisinde bulunan konularda karar almak amacıyla ve yine kanunun İl Encümeni başlıklı 27 inci maddesinde belirtildiği üzere haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanmıştır.

Vali tarafından hazırlanan gündem gereği, görev ve yetkisinde bulunan muhtelif konularda görüşülerek kararlar alınmış ve alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanmıştır.



5'i İl Genel Meclisi Üyelerinden, 5'i ise Vali tarafından İdaremiz Birim Müdürleri arasından seçilerek oluşan, Başkanlığını Sayın Valimizin, yokluğunda da Genel Sekreterimizin yürüttüğü İl Encümeni 2011 yılı içerisinde **toplam 364 adet konuyu görüşerek karara bağlamıştır.**

İİ ENCÜMENİ KARARLARINA AİT DAĞILIM CETVELİ

Sıra No	BİRİMİ	İdari Para Cezası	Kiralama ve Satış	Genel Konular	İfraz Tevhid Yola Terk	Kaçak İnşaat Yıkımı	İnceleme	Yardımlar	Ödenek Aktarımı	Yatırım Programı	TOPLAM
1	İmar ve Kent. İyl. Müdürlüğü	69	47	6	57	46	1		2		228
2	Mali Hizmetler Müdürlüğü			3			13		10	14	40
3	Tarımsal Hiz. Müdürlüğü	9	17	3			1	14			44
4	Dış İlişkiler Müdürlüğü			13			1		1	2	17
5	İnsan Kayn. ve Eğt. Müdürlüğü			2							2
6	Encümen Müdürlüğü			5				1			6
7	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			1				10			11
8	Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğü		1	8					2		11
9	Yazı İşleri Müdürlüğü		1				1	1	1		4
10	Sağlık İşleri Müdürlüğü							1			1
11	Hukuk Müşavirliği										
TOPLAM		78	66	41	57	46	17	27	16	16	364


- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İl Özel İdaremiz Yazı İşleri Müdürlüğü 2008 Yılında 12.11.2008 tarih ve 85 sayılı İl genel Meclis Kararıyla Mahalli İdareler Norm Kadro Yönetmeliği kapsamında ihtiyaca binaen kurulmuş, 1 Müdür, 5 Daimi İşçi, 5 Geçici temizlik personeli ile;

- Yazı İşleri
- İl Genel Meclisi
- Evrak Kayıt
- Arşiv
- Bina Tertip ve Temizlik
- Bayrak Mevzuatı
- İletişim
- **Özel Kalem** adı altındaki görevlerini, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Bayrak Kanunu ve Tüzüğü, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği vb. kanun ve ikincil mevzuatlar dahilinde icra etmektedir.

Yazı İşleri Müdürlüğü için 2011 yılında (Özel Kalem hariç) 405.257,00 TL.'lik ödenek tahsis edilmiş ve bu ödenekten yıl sonu itibarıyla 344.810,00 TL.'lik harcama yapılmıştır.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ

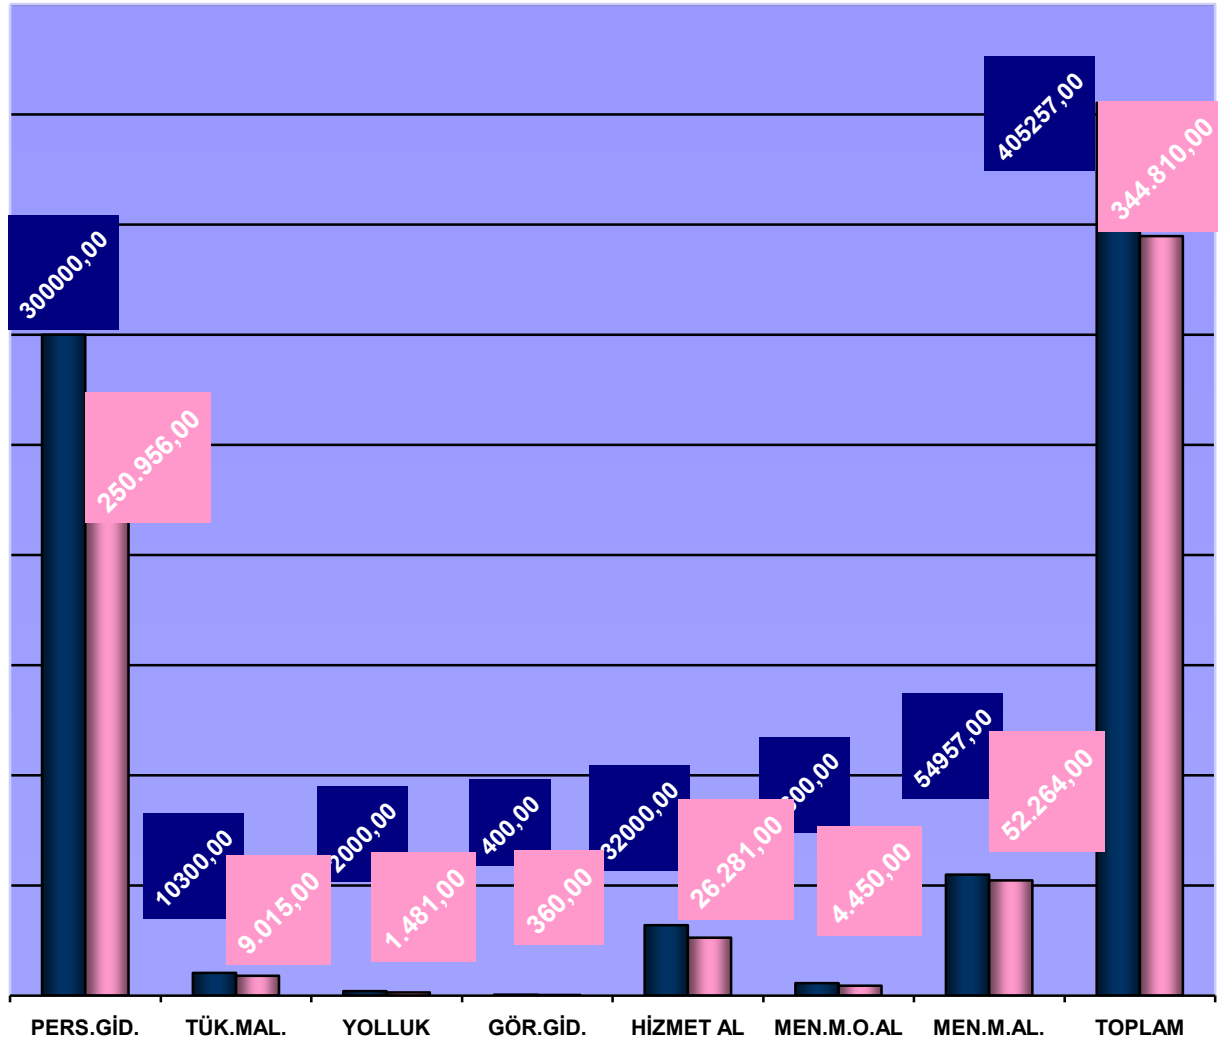

- İl Genel Meclisi:

29 Mart 2009 tarihindeki Yerel seçimlerde seçilerek göreve başlayan İl Genel Meclisi; 11 kişiden oluşmuştur.

- Onbir üyeli ve on adet ihtisas komisyonu bulunan İl Genel Meclisi, Ocak ayı başlangıcı ile Ağustos ayını tatil ilan etmiş Aralık ayı itibari ile de 2011 yılında **70 oturumda** toplam **88 konuyu karara bağlamıştır**.

- İl Genel Meclisinin 2011 yılında Valilik Makamınca geri gönderilen kararı bulunmamaktadır.

İL GENEL MECLİSİ KARARLARINA AİT CETVEL	
Ay İçinde Alınan Karar Sayısı	11 adet
Toplam Karar Sayısı	88 adet
İhtisas Komisyonlarına Havale Edilen	4 adet
Toplam İhtisas Komisyonlarına Havale Edilen	72 adet
İmarla İlgili Karar Sayısı	8 adet
Mali Konularla İlgili Karar Sayısı	33 adet
Eğitim ve Kültür İle İlgili Karar Sayısı	5 adet
Spor ile İlgili Karar Sayısı	1 adet
Tarifelerle İlgili Karar Sayısı	3 adet
İnsan Kaynakları İle İlgili Karar Sayısı	10 adet
Yönetim Hizmetleri İle İlgili Karar Sayısı	16 adet
Müteferrik konular ile ilgili Karar sayısı	12 adet
TOPLAM	88 adet

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin hükümleri doğrultusunda;

- Meclis'in toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ulaştırılması, gündem ve eklerinin divana düzenli bir şekilde sunulması, Meclis Başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrinin takip edilmesi, Komisyonlardan düzenlenen raporların kaydının yapılarak rapor ve eklerinin çoğaltılması sağlanarak Meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılması, Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazları ile kaydının yazılarak zapta geçirilmesi, Zabıtlara, uygun olarak Meclis kararlarının yazılması, kontrolü, Meclis Katip ve Başkanına imzalatılması, Meclis kararlarının Valiliğe süresi içerisinde sunulmasının sağlanması ve takibi, Meclis kararlarının usulüne uygun olarak kamuya ve meclis üyelerine duyurulması, Meclis ve İhtisas Komisyonlarını çalışmalarına müteakip ödenecek huzur hakları ile ilgili puantajların hazırlanması ve ödeme işlemleri ile gerçekleştirme görevliliği ve harcama yetkililiği, Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi ve uygulanmasının sağlanması, Meclis Üyelerinin yoklama cetvellerinin düzenli bir şekilde tutulması,

- Meclis Başkanı tarafından komisyonlara havale edilen önerge, yazı ve benzeri evrakların ilgili komisyon başkanlarına ulaştırılması, Komisyonların diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapacağı yazışmaları düzenleyip koordine edilmesi, Komisyonlarca hazırlanan raporların yazılıp imzalanmasını ve Meclis Başkanlığına ulaştırılması görevler müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir.

- İl Genel Meclisi İmar ve bayındırlık komisyonu üyeleri İmar konuları başta olmak üzere kıyı kenar ve çevre planları mevzuatları konularında, bilgi almak ve uygulamaları yerinde görmek üzere Muğla iline teknik gezi planlanmış ve yerine getirilmiştir.

- Ulaştırma Hizmetleri,

- Kurumumuzun resmi evrak ulaşımında 6.999,10 TL. Pul alımı yapılmış, ulaştırma hizmetlerinin ifasında kullanılmıştır.

- Sosyal Tesisler:

- İlimiz İnkumu mevkiinde bulunan Tesislerimiz 2011 yılında 29.06.2011 tarih ve 184 sayılı İl Encümen kararıyla İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce Milli Eğitim Müdürlüğü Akşam Sanat Okulu ve Öğretmenevi Müdürlüğüne aylık 1.247,00 TL.bedelle işletilmesi karşılığı kiraya verilmiştir.

- Salonlar:

- Müdürlüğümüz görev alanları içerisinde bulunan Salonlar ise yılı içinde 28 kez organizasyon yapılmış, 570 kişiye toplantı, seminer, konferans imkânı sağlanmıştır.

- Denetim:

- 2011 Yılında Vali onayı ile, Merkez ve üç ilçenin Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin mali denetimi gerçekleştirilmiş, ayrıca 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında bir adet de ön inceleme yapılarak makama sunulmuştur.

- Evrak Kayıt:

- 2010 yılı Haziran ayında e-Devlet, e-İçişleri projesi kapsamında elektronik ortama geçilerek platform dahilinde uygulama sağlanmış, 2011 yılında evrak giriş ve çıkış istatistikleri aşağıdaki cetvelde belirtildiği gibi gerçekleşmiştir.

2011 YILI EVRAK KAYIT ÇİZELGESİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
GELEN EVRAK	1.175	914	1.033	1.065	1.181	1.029	1.089	1.025	1.024	1.280	1.896	973	12.684
GİDEN EVRAK	876	705	802	733	902	819	916	781	810	927	702	889	9.862

- İletişim Hizmetleri:

- Kurumumuz iletişim alanındaki harcamalar 2011 yılı hesaplarına 16.096,92 TL olarak geçmiş, anılan bedel telefon, faks ve bilgilendirme SMS hizmetleri için kullanılmıştır.

- Araç Alımı:

- 2011 yılında Yazı İşleri Müdürlüğümüz görev kapsamındaki hizmetlerin ifası için 2012 model Renault marka **1 adet binek aracı** D.M.O kanalıyla alınmış ve hizmet aracı olarak görevlendirilmiştir.

- Dayanıklı Tüketim Malzeme Alımı:

- Müdürlüğümüz yerleşkesindeki odalara **3 adet split klima** DMO kanalıyla alınarak büroların çalışma ortamlarının iyileştirmesi gerçekleştirilmiştir.

- İletişim Hizmetleri:

- Kurumumuz iletişim alanındaki harcamalar 2011 yılı hesaplarına 16.096,92 TL olarak geçmiş, anılan bedel telefon, faks ve bilgilendirme sms hizmetleri için kullanılmıştır.


- Hizmet Binası Temizlik İşleri:

- Kurumumuz hizmet binası temizlik alanında 2011 yılında 4.133,78 TL. bedelle muhtelif malzeme alınmış, İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen personel tarafından görev ifa edilmiştir.

- Özel Kalem:

- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği ilkeleri çerçevesinde İlimiz Üst Yönetiminin gördüğü hizmetlerin bütçede tek kalem de toplanmasını sağlayan sistematigi ile başta temsil, ağırlama ve tören harcamaları olmak üzere üst yönetimin mal, hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirme görevliliğinin yürütümüne devam edilmiş, yapılan iş ve işlemlere dair harcamalar istatistikî olarak aşağıda belirtilmiştir.

02 ÖZEL KALEM BÜTÇE VE HARCAMA İSTATİSTİĞİ

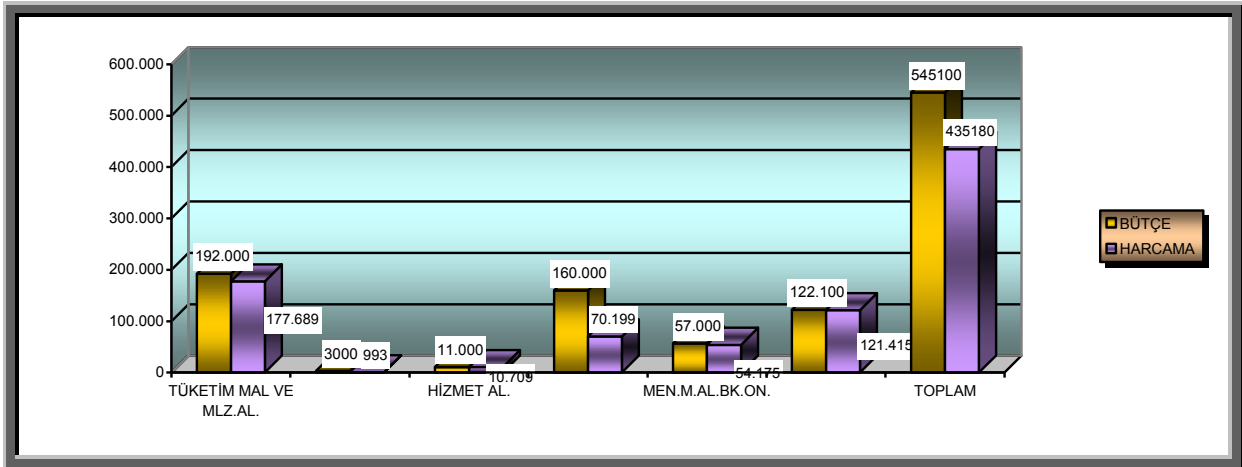

- Üst Yönetim :

- Araç Kiralama:

Üst Yönetim kapsamında kullanılmak üzere **3 adet binek aracı Kiralama** (hizmet alımı) ihalesi gerçekleştirilmiş, 2012 yılı aralık sonuna kadar 28.470,00 TL. sözleşme bedelli ile yüklenme tamamlanmıştır.

- Yklenmeler:

- Mdrlk bnyesinde 2011 yılı kasım ayında, st Ynetime ait aralarda kullanılmak zere akaryakıt, Vali evinde kullanılmak zere Kalorifer yakıtı alımı ihaleleri 117.050,00 TL. szleřme bedeli olarak gerekleřtirilerek 2012 yılı ihtiyalarının karřılanması planlandı.



- Panel:

- 07 Eyll 1991 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yrrlęe giren 3760 sayılı kanunla il olan Bartın'ımızın il oluřunun 20. yılı dolayısıyla Halk Eęitim Merkezi konferans salonunda panel dzenlendi. Panele Bartın'da grev yapmıř Valilerimiz, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Belediye Bařkanlarımız, Sivil Toplum Kuruluřları ve Mesleki Kuruluřların Bařkanları ile Bartın sevdalıları katıldı.

- Bartınımızın il oluřunun 20.yılı dolayısıyla dzenlenen panelin ikram, organizasyon ve aęırlama faaliyetleri ile giderleri mdrlęmz bnyesinde gerekleřtirildi.



- 2011 yılında Ankara da gerçekleştirilen Ankara 3. İller Kültür ve Turizm Fuarına katılıma esas nel giderleri ve stant bedelinin finansı Üst Yönetim giderlerinden karşılandı.



- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FALİYETLERİ

2011 yılı çalışma ve performans programında bulunan 11 adet projeden, Hasankadı Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi Projesi ihale aşamasında olup, Ulus İlçesi Kumluca Beldesi Toplum ve Aile Sağlığı Merkezi yapım işi Sağlık Bakanlığınca merkezden yapılacağından, İl Genel Meclisinin 03.03.2011 tarih ve 13 sayılı kararı ile programdan çıkarıldı. 1.724.024,50 TL'lik 2011 Mali yılı ödeneğimizden, toplam proje tutarı 1.704.597,50 TL olup, dönem sonuna kadar yapılan harcama tutarımız 439.485,15 TL. dir.

- Bartın 20 Ünitelik Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Yapımı :

Bartın 20 Ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkez Yapım işi için proje ve zemin etüdü işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19'ncü maddesine göre 27.000,00 TL. İhale bedeli ile 06.12.2010 tarihinde yüklenici ile sözleşme yapılmış 23.02.2011 tarihinde %100 fiziki gerçekleşme tamamlanmıştır. (24.05.2011 tarih ve 5512 sayılı Bakanlık Talimatı gereği bina yapımı ihalesi İl Sağlık Müdürlüğünce yapıldı).

- Evde Bakım Ve Geriatri Birimi Onarımı :

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19'ncü maddesine göre 128.700,00 TL. İhale bedeli ile 15.02.2011 tarihinde yüklenici ile sözleşme yapılmış 16.04.2011 tarihinde %100 fiziki gerçekleşme tamamlanmıştır. Ayrıca, İl sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine, proje içerisinde olmayan pencere korkulukları da 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince doğrudan temin (22/d) yoluyla usulüne göre 8.900,00 TL.+KDV İhale bedeli ile 29.06.2011 tarihinde yüklenici ile sözleşme yapılmış 13.07.2011 tarihinde %100 fiziki gerçekleşme tamamlanmıştır.

ESKİ HALİ



YENİ HALİ



İÇ GÖRÜNÜM





- Acil Sağlık Hizmetlerine Malzeme Alımı :

Acil Sağlık Hizmetlerimde kullanılmak üzere 3 Adet Otomatik Eksternal Defibrilatör (Taşınabilir kalp şok cihazı) alım işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince doğrudan temin (22/d) yoluyla usulüne göre 9.240,00 TL.+KDV İhale bedeli ile 02.08.2011 tarihinde tamamlanmıştır.



- Verem Savaş Dispanseri Bakım Ve Onarımı :

Verem Savaş Dispanseri bakım ve onarım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun doğrudan temin (22/d) yoluyla 6.900,00 TL.+KDV İhale bedeli ile 11.09.2011 tarihinde yüklenici ile sözleşme yapılmış 27.09.2011 tarihinde %100 fiziki gerçekleşme tamamlanmıştır.





- Kurucaşile Toplum Sağlığı Merkezi Bakım Ve Onarımı:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19'ncu maddesine göre 61.000,00 TL. İhale bedeli ile 05.07.2011 tarihinde yüklenici ile sözleşme yapılmış 04.10.2011 tarihinde %100 fiziki gerçekleşme tamamlanmıştır.

ESKİ HALİ



YENİ HALİ



İÇ GÖRÜNÜM



- Hasankadı Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi:

Hasankadı beldesinde Maliye hazinesine ait 2.563,85 m2 arsanın Bartın Defterdarlığının 15.09.2011 tarih ve 317 sayılı yazıları üzerine kullanım hakkı İl Özel İdaresi adına yapılmasını müteakip ihale işlemlerine başlandı.09.02.2012 tarihinde saat 10.30 ihalesi yapılacaktır.

- Gözde Birsöz Çocuk Yuvası Onarımı:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19'ncü maddesine göre ihalesi yapıldı. 55.000,00 TL. İhale bedeli ile 21.03.2011 tarihinde yüklenici ile sözleşme yapılmış 09.05.2011 tarihinde %100 fiziki gerçekleşme tamamlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince doğrudan temin (22/d) yoluyla usulüne göre 12.370,00 TL.+KDV İhale bedeli ile 03.06.2011 tarihinde yüklenici ile sözleşme yapılmış 09.06.2011 tarihinde %100 fiziki gerçekleşme tamamlanmıştır.

ESKİ HALİ



YENİ HALİ



İÇ GÖRÜNÜM



- Kimsesiz Ve Muhtaç Kişilere Yardım Yapılması:

Sosyal Hizmetler Çocuk Yuvasına kayıtlı takipli öğrenci, cezaevinde kalan genç erkek ve koruma altındaki çocukların ihtiyacı olan 28 kalem kıyafet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince doğrudan temin (22/d) yoluyla usulüne göre gerçekleştirildi.1.919,00 TL. İhale bedeli ile 13.04.2011 tarihinde alınarak Çocuk Yuvası Müdürlüğüne teslim edildi.

- Huzurevi Binası Bakım Ve Onarımı:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince doğrudan temin (22/d) yoluyla 4.100,00 TL.+KDV İhale bedeli ile 04.04.2011 tarihinde yüklenici ile sözleşme yapılmış 09.05.2011 tarihinde %100 fiziki gerçekleşme tamamlanmıştır.



- Sahillerimizi Temiz Tutarım Projesi:

İlimiz Merkez Arıönü köyü Mugada plajı, Hatipler köyü plajı, Büyükkızılkum köyü plajı, Güzelcehisar köyü Hisar plajlarında turizmin desteklenmesi ve çevrede çöp toplama bilincinin geliştirilmesi için kilitli çöp poşeti olan ayaklı tabela yapıldı, yine bu plajlara 12 adet çöp konteynırı alınarak,77 gün süreyle çöpleri Bartın merkezde bulunan çöp alanına taşıma işi yaptırıldı ve toplam 23.383.88 TL harcama yapıldı.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

SIRA NO	Proje No	PROJE/FAALİYET ADI	MALİ YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ (+KDV)	ÖZKAYNAK / DIŞ KAYNAK	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME TARİHİ	İŞE BAŞLAM A TARİHİ	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	SORUNLAR VE AÇIKLAMALAR
1		Verem Savaş Dispanseri bakım ve onarımı	12.000,00 TL	9.600,00	Dış Kaynak	Doğrudan Temin	11.09.2011	13.09.2011	100	100	27.09.2011	Tamamlanmıştır.
2		20 Üniteli Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi Yapımı	1.000.000,00	Proje ve zemin etüdü işi 31.860,00	Dış Kaynak	23.11.2010	06.12.2010	06.12.2010	100	100	23.02.2011	Proje ve zemin etüdü idaremizce yaptırıldı. Sağlık Bakanlığı(İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı)'nın 24.05.2011 tarih ve 5512 sayılı Talimatı gereği Bina yapımı ihalesi iş ve işlemleri İl Sağlık Müdürlüğünce yapıldığından ,İl Genel Meclisinin 08.09.2011 tarih ve 49 sayılı kararı ile performans programından çıkarılmıştır.
3		Evde Bakım ve Geriatri binası onarımı	147.000,00	128.700,00	Dış Kaynak	04.02.2011	15.02.2011	16.02.2011	100	100	16.04.2011	Tamamlanmıştır.
4		Gözde Birsöz Çocuk Yuvası onarımı	90.000,00 +5.00,000	55.000,00	Dış Kaynak + Öz Kaynak	31.01.2011	21.03.2011	21.03.2011	100	100	09.05.2011	Tamamlanmıştır.
5		Hasankadı beldesine Toplum ve Aile Sağlığı Mek.Yapımı	500.000,00+ 50.000,00		Dış kaynak + Öz kaynak							Arsanın kullanımı İl Özel idaresine verilmesi uygun görüldü. İhale işlemlerine başlandı.09.02.2012 tarihinde saat 10.30 ihalesi yapılacaktır.
6		Ulus İlçesi Kumluca Beldesine Toplum ve Aile Sağlığı Mek.Yapımı	250.000,00		Öz Kaynak							Sağlık Bakanlığınca Merkezden yapılacağından, İl Genel Meclisinin 03.03.2011 tarih ve 13 sayılı kararı ile programdan çıkarılacak.
7		Acil Sağlık Hizm.malz.alımı	10.000,00	9.979,20	Öz Kaynak	Doğrudan Temin	-	-	100	100	12.09.2011	3 adet taşınabilir kalp şok cihazı alındı. İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi

- İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

- 99/13681 Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik ve 25208 sayılı Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin uygulanacağı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2005/9 sayılı Genelgesi ve 27.12.2004 tarih ve 82169 sayılı yazılarıyla bildirilen Belediye sınırları dışında kalan ve ruhsat almak isteyen ilgili işyerlerinin ruhsatlandırılmasında, yangınlara karşı alınması gereken önlemlerin kontrolü Müdürlüğümüzce yapılmakta, işyeri açmak isteyen vatandaşlarımıza ruhsat aşamasında Yangın Güvenlik Raporu Müdürlüğümüzce verilmektedir.

2011 Yılında 75 Adet “Yangın Güvenlik” Raporu verilmiştir.

- İlimiz hassas bölgesi içinde olup yıllık personel ortalaması 100 veya daha fazla olan ve bunların dışında kalıpta Valilik Makamınca planlama kapsamına alınması uygun görülen birimler tespit edilmiş, tespiti yapılan toplam **39 birimin Sivil Savunma Planlarını hazırlamaları sağlanmıştır.**

- Müdürlüğümüz envanterinde bulunan Arama ve Kurtarma aracımız ve 8 Arama Kurtarma Teknisyenimiz ile sıkışmalı trafik kazalarına müdahale edilmektedir. **Arama Kurtarma Aracımız ve Personellerimiz ile**

2011 yılında toplam 40 olaya müdahale edilmiştir.

- Çeşitli kurumlarca hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının inceleme ve onay aşamasında Müdürlüğümüz personelleri görev yapmaktadır. 2011 yılında toplam 6 adet Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının inceleme ve onayı tamamlanmıştır.

- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2011 Mali Yılı Yatırım Programında bulunması nedeniyle, Evini Yapana Yardım Projesi (EYY) kapsamında ilimize gönderilen ödenekten 1 adet hak sahibi vatandaşımıza ödeme yapılmıştır.

Ödeme Tutarı 9.900,00 TL dir.

- Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-2011/1 ve KPSS-2011/2 Tercih Kılavuzu ile internet yoluyla alınan tercihlere göre ÖSYM tarafından Müdürlüğümüz ihtiyacı doğrultusunda boş kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılmış olup,

Yerleştirme işlemi gerçekleştirilen personel sayısı 24 dır.

- İlimiz Merkezinde 12 Haziran 2011 tarihinde meydana gelen aşırı yağmur nedeniyle Belediye sınırları içerisinde kalan kamu tesisleri (yol, içme suyu isale hattı) hasar gördüğünden, genel hayat etkilenmiştir. Genel Hayatı etkileyen şartların giderilmesi için Valiliğimiz emrine Acil Yardım Ödeneği gönderilmesi amacıyla Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ndan talepte bulunulmuş, Bartın Belediye başkanlığına 50.000,00 TL, İl Özel İdaresine 100.000,00 TL ve Kozcağız Belediyesine 25.000,00 TL, Hasar Tespit Çalışmalarında ev, işyeri ve depoları hasar gören vatandaşlara verilmek üzere 30.000,00 TL Acil Yardım Ödeneği gönderilmiş **konu ile ilgili çalışmalar Müdürlüğümüzce sürdürülmüştür.**

- 2009/27344 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 131. maddesi (a) fıkrasında "Özel yapı, bina tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim elemanları tarafından" (b) fıkrasında "Kamu binaları, kurum amiri ve görevlendireceği kişi veya heyet, mülki amir veya görevlendireceği heyetlerce denetlenir." hükmü mevcuttur. Bu hüküm gereğince İlimizde Yönetmelik esaslarına göre sondajlama usulü ile resmi kurumların yanı sıra öncelikle kalabalık insan yükünün bulunduğu hayati önemi haiz olan hastane, yurt, pansiyon ve anaokullarında **(Toplam 21 Birimde)** yangın denetimleri yapılmış, denetime ilişkin raporlar ilgili birimlere gönderilmiştir.

- 6/624 Karar Sayılı Tüzüğün 28/c maddesi ve 91/1434 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifinin 11/d maddesi doğrultusunda İlimizde Kamu Hizmeti yürüten Kurum ve Kuruluşların Seferberlik ve Savaş Haline yönelik çalışmalarını yerinde görmek, varsa eksik ve aksaklıkların giderilmesi için planlama kapsamına alınan kamu-özel kurum ve kuruluşlarda denetim yapılmış,

(Toplam 28 Birimde) denetime ilişkin raporlar ilgili birimlere gönderilmiştir.

- 88/13543 Sayılı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) fıkrası gereğince; İlimiz Merkez ve bağlı İlçelerinde faaliyet gösteren hayati öneme haiz, kısmen veya tamamen kapanmaları ve yıkılmaları halinde hayati olumsuz yönde etkileyecek Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarından "SABOTAJLARA KARŞI KORUMA VE ÖNLEME" planını yapması gerekenleri tespit etmek ve planı hazırlayan Kurum ve Kuruluşların planlarını tetkik etmek amacı ile,

İl Sabotaj Komisyonu teşkil edilmiş, teşkil edilen bu komisyonca sondajlama usulüne göre sabotaj Planlamasına tabi birimlerin **(Toplam 32 Birimin)** denetimleri yapılmıştır.

- İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmeliğin 26/b maddesinde; Belediye İtfaiye Teşkillerinin gereği gibi işleyip işlemediği ve personelin çalışmaları Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve Valilerin görevlendireceği Vali Yardımcıları veya Sivil Savunma Müdürleri (İl Afet ve Acil Durum Müdürleri) tarafından denetlenir hükmü mevcuttur. Bu hüküm gereğince; İlimiz Merkezi ve Merkeze bağlı Belde Belediye Başkanlıkları İtfaiye Teşkilatları ile Amasra, Ulus, Kurucaşile Belediye Başkanlıkları İtfaiye Teşkilleri denetiminin Müdürlüğümüzce yapılmış, raporlar Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmiştir.

Toplam 9 Belediye Başkanlığının denetimi yapılmıştır.

- MY 5-3 Savaş Hasar Onarım Planları Hazırlanma Yönergesi gereğince, günümüz savaşlarında geri bölgedeki hayati öneme haiz tesis ve yapılarda meydana gelebilecek muhtemel hasarın giderilmesine esas olarak hazırlanması gerekli olan **B Grubu Savaş Hasar Onarım Planlarını** hazırlama sorumluluğu bulunan il birimlerine planlarının gözden geçirilmesini, gerekli güncellemenin yapılmasını, (mali portreler de hem TL, hem de Euro bazında tespit yapılması) planlarda değişiklik olup olmadığı konusunda Müdürlüğümüze bilgi verilmesi amacı ile yazı yazılmış, planlarında değişiklik bulunan

Toplam 28 Birimin birimlerin planlarını güncellemeleri sağlanmıştır.

- Müdürlüğümüze çeşitli sebeplerle (heyelan, evlerinde çatlak vs.) dilekçeli müracaat eden 41 vatandaşımızın dilekçelerine istinaden Teknik Personellerimizce yerinde tespit yapılmış,

Tespit raporları ilgili birimlere gönderilmiştir.

- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 20.04.2011 tarih ve 2512 sayılı yazısı ile olası afetlerde ülke çapında Hasar Tespit Çalışmalarına katılacak Teknik Personellerin tespiti ile her yıl bu tespitlerin güncelliğinin takibi ve ilgili listelerin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilmesi istenilmiştir.

Bu amaçla, Kurumlara ve Belediye Başkanlıklarına yazı yazılmış, İlimiz ve İlçelerimiz birimlerinde görev yapan,

Toplam 36 Adet Mimar, İnşaat Mühendisi ve İnşaat Teknikerlerine ait bilgiler Başkanlığımıza bildirilmiştir.

- Bartın İli sınırları dahilinde, insan yaşamını tehdit eden ve çevreye zarar verebilme potansiyeli taşıyan, doğal, teknolojik veya insan kökenli olan, genel hayata etki edecek düzeyde fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara yol açabilecek olan tüm tehlikelerin belirlenmesi; söz konusu tehlikelerin gelecekte oluşturabileceği afetlere karşı risk olasılığının tespit edilmesi amacıyla İlimiz İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde çalışmalar başlanmış, ilgili birimlerden bilgi ve veri istenilmiştir. Bu çalışma ile, İlimiz sınırlarında afet riski taşıyan alanların haritalara işlenmesinin yanında ilgili kurumlardan istenen sayısal bilgilerden faydalanarak, doğalgaz ve yüksek gerilim hattı gibi önemli geçiş güzergahları ya da depolama alanlarının haritalara işlenmesi planlanmış olup, bu alanlar ya da hatlar üzerinde afete uğraması muhtemel hassas noktaların da tespit edilmesi amaçlanmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

- 2010/1 yılı KPSS Sonuçlarına göre İl Afet ve Acil Durum Yerleştirme Sonuç Belgelerine göre atamaları yapılarak göreve başlamış olan 18 (on sekiz) aday personelden 16 (on altı) sına (İki Personelimiz Raporludur) yönelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 55. Maddesi ve İçişleri Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Müdürlüğümüzce hazırlanan Eğitim Programı doğrultusunda Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitimleri verilmiş, Stajları tamamlanmıştır.

- Van ili ve ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası bölgede çalışmalarda bulunmak üzere Başkanlık Makamının İlgi (a) Olurları ile görevlendirildikleri İlgi (b) yazı ile bildirilen Müdürlüğümüz İnşaat Mühendisi Caner ERDOĞAN ve Mimar Vildan TURCAN” ın 16.11.2011 tarihinde bölgede olacak şekilde görevlendirilmeleri istenilmiştir, Daha sonra İnşaat Mühendisimiz Emrah TÜRKAY” da Van”da görev yapmıştır. Personellerimizden Caner ERDOĞAN ve Emrah TÜRKAY halen Van” da Kesin Hasar tespitleri için görev yapmaktadırlar.

- Van İlinde meydana gelen Depremden dolayı söz konusu bölgeye Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Bartın” da bulunan Çelikerler Firmasından Konteynır alımı yapılmış, alınacak konteynırların Müdürlüğümüzce Muayene Kabul Komisyonu kurularak tesliminin ve takibinin yapılması istenilmiştir. Bu nedenle; Müdürlüğümüzce Muayene Kabul Komisyonu teşkil edilmiş olup, her sevkியatta Muayene Kabul yapılmaktadır.

2011 yılında Muayene ve Kabulü yapılan konteynır sayısı 250 olup, konteynır yapımı ve Muayene Kabul işlemleri devam etmektedir.

- İlimizde Kamu hizmeti yürüten Kurum ve Kuruluşların Seferberlik ve Savaş Haline yönelik çalışmalarını herhangi bir aksaklığa mahal vermeden daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi açısından Kurum ve Kuruluş planlamalarından sorumlu Sivil Savunma Amirlerinin Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıklarına ilişkin eğitimlerinin ilgi (a) Direktifin 9. maddesi doğrultusunda ve ilgi (b) Valilik Oluru ile **28-29 KASIM 2011** günü **10.00 – 12.00** saatleri arasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde yapılması planlanmış ve **30 birim personeline eğitim verilmiştir.**

- 08-27 ARALIK 2011 tarihleri arasında İlimiz Merkezinde bulunan toplam 27 adet İlköğretim, Lise ve dengi okullarda öğrencilerimizin Sivil Savunma ve Afetler konusunda bilinçlendirilmesi, alınacak koruyucu, kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerin öğretilmesi amacı ile eğitim verilmesi planlanmış, **bu okullarımızda yaklaşık 1500 öğrenciye eğitim verilmiştir.**

- 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanununun 11 ve Ek-8 inci maddeleri ile 6/3150 Karar Sayılı "Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü"nün 3 ve 25 inci maddeleri uyarınca hazırlanan ve amacı Sivil toplum örgütleri, özel ve tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin, sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi için devletin resmi güçleri yanında bu hizmetlere, gönüllü olarak katılımlarının sağlanması, gerekli organizasyonların yapılması ve eğitilmelerini sağlamak olan **Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları Yönergesi'** çerçevesinde Müdürlüğümüzde gönüllü olarak kayıtlı bulunan; Lütfullah Kocabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Merkez Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise Ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünde bulunan Toplam 13 gönüllü öğretmene Merkez Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise Ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü Toplantı Salonunda **20.12.2011** günü **16.30-18.30** saatleri arasında eğitim verilmiştir.

- İlimiz Merkez İlçesine bağlı Özbaşı Köyü Hepler Mahallesinde meydana gelen heyelan nedeniyle hak sahibi kabul edilen 19 afetzede ile Aşağıdere Köyü Yağbaltı Köyünde Meydana gelen heyelan nedeniyle hak sahibi kabul edilen 7 afetzede için Merkez İlçeye bağlı Kozcağız Beldesinde yeni yerleşim yeri olarak seçilen tapuda Kozcağız Köyü, Evaltı Mevkii, 488 no'lu parselde kayıtlı 11.580,00 m2 yüzölçümü mülkiyet şahıslara ait taşınmazın **Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.**

-İl Özel İdaresi gider bütçesi ile birimimize **2011 yılında 82.000,00 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, söz konusu ödenek ile cari giderlerimiz karşılanmıştır. Daha sonra İlaveten istenilen ödenekler ile bu rakam 104.573.44 TL ye çıkarılmış, aktarılan bu ödenekten 98.677,88 TL harcanmıştır. 2009 yılı sonunda Müdürlüğümüzün 5902 sayılı Kanun ile yeni bir yapılanmaya girmiş olması ve Ödeneklerin İl Özel İdaresince karşılanıyor olması sebebiyle düne kadar 7 kişi ile çalışmakta olan Müdürlüğümüz yeni personellerin alımı ile 2010 ve 2011 yıllarında İl Özel idaresince Bütçeye konulan kıt kaynaklı ödenekler ile ancak personelin tefrişat ihtiyaçlarını karşılayabilmiş olup henüz bilgisayarı olmayan personellerimiz bile bulunmaktadır.Bu amaçla, 2011 yılında da bütçemizin kıt olması, bütçeye konan ödeneğin çoğunun cari harcamalar için ayrılmış olması sebebiyle Müdürlüğümüzün Teknik Personelleri ve Arama Kurtarma Amaçlı ihtiyaçlarımız karşılanamamıştır.

- Valilik Makamının 28.04.2010 gün ve 478 Sayılı Olurları ile bir Olağan Üstü Hal ve afet durumlarında İl sınırları dahilinde ve gerekirse komşu İl Valilerinin yardım çağrısı üzerine en seri biçimde olay mahalline intikal ederek can ve mal kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım hizmetleri ile bozulan alt yapıyı (elektrik, telefon, su ve kanalizasyon) onarmak ve afet halini alarak yangınları söndürmek amacı ile Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Karayolları 156. şube Şefliği, DSİ, 233. Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Telekom İl Müdürlüğü, BEDAŞ İşletme Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğünün görevlendirdiği personellerden oluşturulan ilimiz Afetler Acil Yardım Ekibi Eğitimi , İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binasında **5-6-7 ARALIK 2011** tarihlerinde **10.00-12.00** saatleri arasında yapılmış, **toplam 91 kişiye eğitim verilmiştir.**

- İlimiz Alarm Kod İşlem Görevlilerine her yıl bir plan dahilinde eğitim yaptırılması gerektiğinden eğitim 21-22 KASIM 2011 tarihlerinde 10.00-12.00 saatleri arasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılmış,

Toplam 31 Kurum personelinin eğitimi gerçekleştirilmiştir.

- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FALİYETLERİ

A-) İDARİ DAVALAR:

- AÇILAN İDARİ DAVALAR :

Devam Eden	: 16
Lehimize Biten	: 0 (SGK idari para cezasının iptali davası)
Aleyhimize Biten	: 0 (SGK idari para cezasının iptali davası)
Temyizde Olan	: 1
TOPLAM	: 17

- GEÇMİŞ YILLARDA AÇILIP 2011 YILINA DEVREDEN İDARİ DAVALAR :

Devam Eden	: 9
Lehimize Biten	: 4
Aleyhimize Biten	: 3
Temyizde Olan	: 2
TOPLAM	: 18

- GEÇMİŞ YILLARDA AÇILIP 2011 YILINA DEVREDEN İDARİ DAVALAR :

Devam Eden	: 10
Lehimize Biten	: 4
Aleyhimize Biten	: 3
Temyizde Olan	: 8
TOPLAM	: 25

- İDARİ DAVALARIN TÜRLERİNE GÖRE SAYILARI :

Para Cezasına İtiraz	: 5
Yıkım Kararının İptali	: 27
Ruhsat Verilmemesi	
İşleminin İptali	: 1
İhalelere Yönelik	
Kararların iptali	: 2
TOPLAM	: 35

B-) ADLİ DAVALAR :

- AÇILAN ADLİ DAVALAR :

Devam Eden	: 7
Lehimize Biten	: 0
Aleyhimize Biten	: 0
Temyizde Olan	: 0
TOPLAM	: 7

- GEÇMİŞ YILLARDA AÇILIP 2011 YILINA DEVROLAN ADLİ DAVALAR :

Devam Eden	: 7
Lehimize Biten	: 0
Aleyhimize Biten	: 1
Temyizde Olan	: 3
TOPLAM	: 11

- GEÇMİŞ YILLARDA AÇILIP 2011 YILINA DEVROLAN VE 2011 YILINDA AÇILAN ADLİ DAVALAR :

Devam Eden	: 14
Lehimize Biten	: 0
Aleyhimize Biten	: 1
Temyizde Olan	: 3
TOPLAM	: 18

- TAKİP EDİLEN ADLİ DAVALARIN TÜRLERİNE GÖRE SAYILARI:

Alacak – Tazminat	: 13
Kira Bedelinin Tespiti	: 1
Mühür Fekki ve 2863 S.lı	
Kanuna Muhalefet	: 2
Özel Belgede Sahtecilik-	
Nitelikli Dolandırıcılık	: 1
İş Akdinin Feshinin İptali	: 1
TOPLAM	: 18

C-) İCRA TAKİPLERİ

- İCRA TAKİPLERİ :

AÇILAN :	DEVAM EDEN :	İNFAZ :
2	1	1

- ÖNCEKİ YILLARA AİT 2011 YILINA DEVROLUNMUŞ İCRA TAKİPLERİ :

DEVAM EDEN :	İNFAZ :	TOPLAM : 28
24	0	

D-) EVRAK KAYIT BİLGİLERİ :

GELEN EVRAK TOPLAMI	: 236	HUKUKİ GÖRÜŞ : 47
GİDEN EVRAK TOPLAMI	: 167	HUKUKİ GÖRÜŞ : 48

2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE YILI :	2011	YILLAR				
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2009 Gerçekleşme	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme	Hedeften Sapma %
HARCAMA BİRİMİ :	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (EĞİTİM)					
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapıp %100 kullanılabilir hale getirmek. Okul binası ve ek derslik ihtiyacının tamamını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak Eğitim Kompleksi yapmak. İlköğretim okullarının mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	Yeni Okul binası yapımı ile mevcut bina, tesislerin, bakım ve onarımını yapıp % 100 kullanılabilir hale getirmek. Eğitim Kalitesini artırmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Her yıl en az 10 okul binası onarmak.	37	43	26	51	
	Her yıl en az 1 okul binasına deprem güçlendirme uygulamak.	2	0	1	1	
	Plan sonuna kadar 1 adet okul yapmak.	0	1	1	0	100
	Her yıl 1 adet anasınıfı yapmak	0	1	1	0	100
	Plan sonuna kadar her ilçeye 1 adet Trafik Eğitim Parkı yapmak.	0	0	1	0	100
Göstergenin Kaynağı	İl Özel İdaresi 2011 Yılı Çalışma (Yatırım) Programı ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Yapım Programı.					
Performans Sonuçlarının Analizi	Okul onarımlarında hedeflenen sayının üzerinde onarım yapılmıştır. Deprem Güçlendirme Onarım hedefi gerçekleştirilmiştir. 1 Adet Okul Binası yapımı tamamlanmıştır. Trafik eğitim parkı yapılamamıştır.					
Sapmanın nedeni	Okul onarımlarında çalışma programına alınan proje sayısı ve dış kaynaktan beklenen ödenekten fazla ödeneğin gelmesi ile projeler % 50 artışla tamamlanmıştır. Trafik Eğitim Parkı yapımı alt yapı sorunu nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Anasınıfı arsa sorunu nedeni ile gerçekleştirilememiştir.					
Sapmaya karşı alınacak önlem	Okul Onarımı performans göstergesinin hedeflenen değeri aşması daha fazla okula hizmet götürüldüğü anlamına geldiğinden ve bu durum kamu yararı sağladığından önlem alınmasına gerek yoktur. Trafik Eğitim Parkı yapılması için bu performans göstergesinin hedeflenen değeri, kaynak ihtiyacı ve alt yapı eksiklikleri giderildiğinde revize edilebilecektir. Anasınıfı yapımı için alt yapı eksiklikleri revize edilebilecektir.					

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU						
BÜTÇE YILI :	2011	YILLAR				
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2009 Gerçekleşme	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme	Hedefften Sapma %
HARCAMA BİRİMİ :	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR)					
STRATEJİK AMAÇ 1 :	İlimizin, folklorik, kültürel ve doğal değerleri ile henüz yeterince değerlendirilemeyen alternatif turizm potansiyelini de harekete geçirerek turizmi çeşitlendirmek; turizm kaynakları ve turistik olanakları sürdürülebilir kullanımla yılın her mevsiminde turizme hizmet verilebilir duruma getirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde etkin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek. Böylece, yerli ve yabancı turist sayısını her yıl % 10 artırarak ve turistlerin ildeki kalış sürelerini uzatarak turizmin gelişmesini sağlamak ve sektörün ekonomiye katkısını artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	Mevcut kültürel ve doğal değerlerin bulundukları ortamları turistik ziyarete uygun hale getirerek turizmde yeterli düzeyde yararlanılmasını sağlamak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Amasra Bedesteni Rolöve Restorasyon Restitüsyon Elektrik Proje Yapımı		-	1	-	100
	Kültür Merkezi Deprem Güçlendirme ve İkmal İnşaatı			1	1	0
	Çakraz Yerleşim Merkezi Kanalizasyon Yapım İş		-	-	-	-
	Ulus Apdipaşa Ovaçayı Kordon Boyu Yürüyüş Projesi		1	-	-	-
	Ulus Kocagöz Konağı restorasyon		1	-	-	-
	Amasra Müzesi Onarımı		1	-	-	-
	Amasra'da Kazı ve Ören Yerleri Yapımı		-	1	-	100
	Arıt Belediyesi Kilit Parke Alımı			1	1	0
	Kütüphanelere Yayın Alımı			1	-	100
Göstergenin Kaynağı	İl Özel İdaresi 2011 Yılı Çalışma (Yatırım) Programı.					
Performans Sonuçlarının Analizi	Kültür Merkezi Deprem Güçlendirme ve İkmal İnşaatı ve Arıt Belediyesi Kilit Parke Alımı işi tamamlanmıştır.					
Sapmanın nedeni	Amasra Bedesteni Rolöve Restorasyon Restitüsyon Elektrik Proje Yapımı Kültür Bakanlığınca yeterli ödenek gönderilmediğinden gerçekleştirilememiştir. Çakraz Yerleşim Merkezi Kanalizasyon Yapım İş için Kültür Bakanlığından herhangi bir kaynak ayrılmadığından gerçekleştirilememiştir. Ulus Apdipaşa Ovaçayı Kordon Boyu Yürüyüş Projesi, Ulus Kocagöz Konağı restorasyonu ve Amasra Müzesi Onarımı 2010 yılında gerçekleştirilmiştir .Arkeolojik kazı çalışmaları 2012 de ihale edilmek üzere temizleme çalışmalarına başlanılmıştır. Kütüphanelere Yayın Alımı için Kültür ve Turizm Müdürlüğünden gelen kitap listesi İl Özel İdaresi yayın alımı Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.					
Sapmaya karşı alınacak önlem	Bu performans göstergesinin hedeflenen değeri, kaynak ihtiyacı ve alt yapı eksiklikleri giderildiğinde revize edilebilecektir.					

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE YILI :	2011	YILLAR				
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2009 Gerçekleşme	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme	Hedefte Sapma %
HARCAMA BİRİMİ :	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (SPOR)					
STRATEJİK AMAÇ 1 :	İlimizde spor faaliyetlerini daha geniş kitlelere yaymak,spor tesisi sayılarını ihtiyaçlar doğrultusunda çoğaltmak,mevcut spor tesislerimizi günümüz şartlarına uygun hale getirmek için bakım, onarım ve tamiratlarının yapılarak hizmete sunup,daha çok federasyon spor faaliyeti organize edip ,ilimize maddi ve manevi spor turizmi girdisini artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	İlimizde her branşta yetişen elit sporcuları teşvik etmek amacıyla ödüllendirmek öncelikli spor dallarını (Futbol Atletizm, Güreş, Voleybol, Basketbol, Tenis, Masa Tenisi, Bocce, ve Uzak Doğu Sporları) önem verilerek Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda İlimizin performansının ve kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Buna göre; 20 olan spor tesisi sayımızı 30'a, 26 olan kulüp sayısını 30'a, 4381 olan lisanslı sporcu sayısını 5.500'e, 150 olan Gençlik Merkezi Aktif üye sayısını 300'e çıkarmayı hedeflemekteyiz.					
	Gürgenpınarı Futbol Sahası yapımı			1	1	0
	Kozcağız Futbol Sahası Çimlendirilmesi			1	1	0
	Kurucaşile Futbol Sahası Işıklar ve Çimlendirilmesi			1	0	100
	Serdar Köyü Futbol Sahası Yapımı			1	1	0
	Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu Jeneratör Alımı			1	1	0
	Kumluca Futbol Sahası Çim.Işık.			1	0	100
	Bartın Sen.Çim Yüz.Futbol Sahası Işıklandırma			1	0	100
	Spor Tesisleri yapımı			1	0	100
	Spor Tesisleri Bakım Onarımı			1	0	100
	Gençlik Merkezi Binası Yapımı			1	0	100
Göstergenin Kaynağı	İL Özel İdaresi 2011 Yılı Çalışma (Yatırım) Programı.					
Performans Sonuçlarının Analizi	Gürgenpınarı,Kozcağız Serdar Köyü Futbol Sahaları yapımları gerçekleştirilmiştir. Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu Jenaratör Alımı gerçekleştirilmiştir Bartın Sen.Çim Yüz.Futbol Sahası Işıklandırma işi İl Genel Meclisince 2012 yılında değerlendirilmek üzere planlanmıştır.					
Sapmanın nedeni	Spor Tesisleri Bakım Onarımı, Spor Tesisleri yapımı, Kumluca Futbol Sahası Çim.Işık., Gençlik Merkezi Binası Yapımı projeleri Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından Ödenek gönderilmemesi nedeni ile gerçekleştirilememiştir.					
Sapmaya karşı alınacak önlem	Bu performans göstergesinin hedeflenen değeri, kaynak ihtiyacı eksiklikleri giderildiğinde revize edilebilecektir.					

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE YILI :	2011	YILLAR				
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2009 Gerçekleşme	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme	Hedefte Sapma %
HARCAMA BİRİMİ :	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (EMNİYET)					
STRATEJİK AMAÇ 1 :	İlimizde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) MOBESE kurmak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	İlin asayiş ve güvenliğine katkı sağlamak, trafik akış ve yoğunluğu izlemek, elde edilen görüntüleri değerlendirerek olabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmek,gerçekleşen olayların çözümüne yönelik geriye dönük kayıtların araştırılarak incelenmesi ve hukuki delillerin temin edilmesi hız ihlali yapan araçların tespiti, trafik kameraları ve görüntü işleme sistemleri aracılığı ile plakaların emniyet bilgi sisteminden sorgulanarak çalıntı vb. konularını değerlendirmek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde polis, halk ilişkilerini zedelemekten yasadışı olayları önlemek ve toplulukların provokasyona yönlendirilmelerine engel olmak gibi uygulamaların tamamını sağlamak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) Kurulumu		-	1	1	0
	Emniyet Müdürlüğü 20 daireli Polis Lojmanı Onarımı		1	-	-	-
	Emniyet Müdürlüğü 100 daireli Polis Lojmanı Onarımı		1	-	-	-
	Emniyet Binaları bakım Onarımı		1	1	1	0
	Jandarma Kamera Güvenlik Sistemi		0	1	1	0
	İlçe Kamera Güvenlik sistemi yapımı		-	1	0	100
Göstergenin Kaynağı	İl Özel İdaresi 2011 Yılı Çalışma (Yatırım) Programı.					
Performans Sonuçlarının Analizi	Kent Güvenlik Sistemi (MOBESE) kurulumu ihalesi gerçekleştirilerek tamamlanmıştır. İlçe Jandarma Karakollarına Kamera Güvenlik Sistemi kurulmuştur. Emniyet Binaları Bakım Onarımları % 100 gerçekleştirilmiştir.					
Sapmanın nedeni	İlçe Kamera Güvenlik Sistemi Yapımı için Dış kaynaktan beklenen ödeneğin gönderilmemesi nedeni ile gerçekleştirilmemiştir.					
Sapmaya karşı alınacak önlem	Bu performans göstergesinin hedeflenen değeri, kaynak eksiklikleri giderildiğinde revize edilebilecektir.					

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2011	YILLAR				
DAİRESİ:	İL ÖZEL İDARESİ	2009 Gerçekleş me	2010 Gerçekleş me	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme	Hedekten Sapma %
HARCAMA BİRİMİ:	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ 1:	Kent ve çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemlerinin oluşturulması, kaçak yapılaşmanın önüne geçerek, mimari özelliklere bağlı estetik kaygı gözeterek yapılaşmanın aynı düzeyde sağlanması, İl Genelinde üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulamasının sağlanması.				1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın Fiziki Gerçekleştirilmesi tamamlanmış olup, 1/100000 ölçekli ÇDP'ye yapılan itiraz konularının tamamlanmasından sonra plan onayına geçilecektir.	
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	İl Merkezini de içine alan 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın tamamlanması. Köy yerleşimlerinin düzenli olması için yapılan köy yerleşik alan tespit çalışmalarının tamamlanması Kırsal yerleşimlerde İmar Planları hazırlanarak yapılaşmanın planlı olması konusunda çalışmalar sürmekte, çarpık yapılaşma ve kaçak yapılaşmanın engellenmesi büyük ölçüde sağlanmış ve mimari estetiğe ve yerel mimariye özen gösterilmesi hedefinin devamlılığı sağlanacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- Güzelcehisar Köyü Koruma Amaçlı İmar Planı 2- Köy Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti(22 adet) 3- 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı				% 100 % 99 % 100	
Göstergenin Kaynağı	İl Özel İdaresi 2011 yılı Stratejik Plan ve Çalışma Programı					
Performans Sonuçlarının Analizi	2011 yılı çalışma programında bulunan 3 adet projenin 2 adedinde hedefe ulaşılmıştır.					
Sapmanın Nedeni	2011 yılında müdürlüğümüzce hazırlanan Köy Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti çalışmaları ile ilgili olarak 22 adet köy yerleşik alanı tespiti yapılmış ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili 7. Maddenin g fıkrası "Belediyelerin mücavir alanları ile köylerin yerleşik alanlarının sınırlarının tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve tespit edilen sınırları onaylamak." Hükmü gereğince bakanlıktan istenen görüşe göre hareket edilecektir.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem						

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU								
BÜTÇE YILI :	2011	YILLAR						
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleştirme	Hedeften Sapma %	
HARCAMA BİRİMİ :	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ							
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliştirmek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmek							
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	Bartın'da yem bitkileri üretiminin artırılması, Yem bitkilerini geliştirme projesi kapsamında elde edilen ot veriminin miktarının arttırılması							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Satın alınan Tohum Miktarı A- Yonca	9.025 kg.	6.500 kg.	10.475 kg.	10.000	10.000		
	B-MısırTohum	23.075 kg.	23.500 kg.	15.575 kg.	14.000	14.100		
	Dağıtılan Kişi Sayısı							
	A-Yonca	269	151	274		246		
	B-Mısır	383	337	241		236		
	2008 yında sahipli hayvanların kontrol altına alınması için tasma yaptırılması	14150	-	-	-	-		
	Gerçekleşen proje sayısı	2	1	-	-	-		
Göstergenin kaynağı	Yıllık çalışma programında yer alan verilerin toplanması sonucu elde edilmiştir.							
performans sonuçlarının analizi	Stratejik Plan ve Çalışma Programında Her yıl için %2-%5 artış uygulanması hedeflenmiş ve bu hedefe ulaşılmıştır.							
Sapmanın nedeni								
Sapmaya karşı alınacak önlem								

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU							
BÜTÇE YILI :		YILLAR					
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2008	2009	2010	2011	2011	Hedeften
HARCAMA BİRİMİ :	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Gerçekleştirme	Sapma %
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artısını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.						
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	Bartın'da İhracata uygun Pazar değeri olan ürünlere önem			100 %	100 %	100 %	
	verilecektir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Satın Alınan Çilek Fidesi ve Meyve Fidanı Miktarı	1.920	1.760	-	-	-	
	A- Kiraz Fidanı	36.000	78.000	78.000		-	
	B- Çilek Fidesi	24	22	-		-	
	Kurulan Bahçe Sayısı (Dekar)					-	
	A- Kiraz	6	13	13		-	
	B- Çilek	2	2	1		-	
Göstergenin kaynağı	Yıllık çalışma programında yer alan verilerin toplanması sonucu elde edilmiştir.						
Performans sonuçlarının analizi	2011 yılında gelen taleplerin tamamı karşılandığından belirlenen hedef kadar fide verilmiştir.						
Sapmanın nedeni							
Sapmaya karşı alınacak önlem							

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU						
BÜTÇE YILI :	2011	YILLAR				
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Gerçekleştirme	2011 Hedef	2011 Gerçekleştirme
HARCAMA BİRİMİ :	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Kent-kır ve sos yo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	Merkez ve ilçe köylerde çağdaş yaşama alanları Çocuk oyun alanları ve Pazar yerleri çalışmaları yapılacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Satın Alınan Çocuk Parkı Miktarı A- Oyun Grubu Kurulan Park Sayısı A-Oyun Grubu Gerçekleşen proje sayısı	10	10	35	10	28
	Kurulan Pazaryeri Sayısı Gerçekleşen proje sayısı					
			4	-		-
Göstergenin kaynağı	Yıllık çalışma programında yer alan verilerin toplanması sonucu elde edilmiştir.					
performans sonuçlarının analizi	Stratejik Plan ve Çalışma Programında Her yıl için 10 adet park kurulması hedeflenmiş ve bu hedefe ulaşılmıştır.					
Sapmanın nedeni						
Sapmaya karşı alınacak önlem						

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU						
BÜTÇE YILI :	2011	YILLAR				
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2008	2009	2010	2011	2011
HARCAMA BİRİMİ :	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleştirme	Hedef	Gerçekleştirme
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Merkez ve ilçe köylerde içme suyu kanalizasyon tesis yapım bakım ve onarımları tesis geliştirme çalışmaları yapılacaktır.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacaktır			100 %	100 %	100 %
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Satın Alınan Boru Miktarı A- İçme suyu Borusu	118.074 mt.	75.515 mt.	72.190 mt		45.069 mt
	Boru Dağıtılan Köy Sayısı A- İçme suyu Borusu	81	62	72		60
	Devlet-Vatandaş İşbirliği ile yapılan Tesis sayısı					
	A- İçme suyu	-	-	4		1
	İhale ile yapılan Tesis sayısı					
	A-İçme suyu	-	-	12		2
Göstergenin kaynağı	Yıllık çalışma programında yer alan verilerin toplanması sonucu elde edilmiştir.					
performans sonuçlarının analizi	Stratejik Plan ve Çalışma Programındaki Her yıl uygulanacak hedeflere ulaşılmıştır.					
Sapmanın nedeni						
Sapmaya karşı alınacak önlem						

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU						
BÜTÇE YILI :	2011	YILLAR				
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2011 Gerçekleşme	Hedeften Sapma %
HARCAMA BİRİMİ :	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu kamunun ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla bina yapımı ve onarımı, tesisat,bakım ve onarım çalışmaları yürütülecektir.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	Hizmet ve Lojman Binaları ile kalorifer jenaratör, asansör ve makinaların bakım ve onarımları yapılarak en iyi şekilde fiziki çalışma koşulları oluşturulacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hizmet Binası ve Lojman Bakım Onarımı				100 %	100 %
	İl Özel İdaresi Lojmanına Asansör Yapım İşi					
	Vali Konağı Lojman bakım Onarım İşi				100 %	
	Bartın Merkez Eskişehir Köyü Beton Parke Yol Yapım İşi				100 %	
	Bartın Merkez Kayadibi Kavlak Köyü Beton Parke Yol Yapım İşi				100 %	
	Amasra Çanakçılar Köyü Beton parke Yol Yapım İşi				100 %	
	Bartın Geriş Köyü Beton Parke Yol Yapım İşi				100 %	
	Kurucaşile Kapısıyü-Yeniköy-İlyasgeçidi Köyü Beton Parke Yol Yapım İşi				100 %	
	Kurucaşile Kapısıyü Başköy Köyü Beton Parke Yol Yapım İşi				100 %	
	Göstergenin kaynağı				İl Özel İdaresi 2011 Yılı Stratejik Plan ve Çalışma Programı	
performans sonuçlarının analizi	2011 Yılı çalışma programında bulunan 9 Adet projenin 8 ' inde hedefe ulaşılmıştır.					
Sapmanın nedeni	İl Özel İdaresi Lojmanına Asansör Yapım İşi için 2 defa ihaleye çıkılmış , ancak ilkinde evrak eksikliği , ikincisinde de K.İ.K' nunu 39.maddesi gereğince ihaleler iptal edilerek proje gerçekleştirilememiştir.					
Sapmaya karşı alınacak önlem						

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU							
BÜTÇE YILI :	2011	YILLAR					
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2008	2009	2010	2011	2011	Hedeften
HARCAMA BİRİMİ :	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Gerçekleşme	Sapma %
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Yoksullara özellikle kadınlara küçük sermayeler vererek gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak						
PERFORMANS HEDEFİ 1.1:	Yoksulların seçimi ve mikro kredi verilmesi	12	39	21	40	14	65
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Finans kaynağı Verilecek Krediler İdare tarafından verilen kredilerle ihtiyaç sahiplerinin ekonomik düzeyde katkı ve üretime yönlendirilmesi. Memnuniyet Oranı						
Göstergenin kaynağı	Öz Kaynak						
Performans sonuçlarının analizi	14 adet kişiye toplam 20.500,00 TL Mikro Kredi verilmiştir.						
Sapmanın nedeni	Başvurular içinde uygun olmayan müracaatların tespit edilmesi.						
Sapmaya karşı alınacak önlem	Basın aracılığıyla daha çok kişiye ulaşılması.						

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU							
BÜTÇE YILI :	2011	YILLAR					
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2008	2009	2010	2011	2011	Hedekten
HARCAMA BİRİMİ :	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Gerçekleşme	Sapma %
STRATEJİK AMAÇ 2 :	Kurumda tüm çalışanların yetkinliklerini, bilinç düzeylerini, organizasyon ve yönetim kabiliyetlerini, kişisel gelişimlerini, araç ve gereç kullanma artırmak, bilinç düzeylerinin Liderlik uygulamalarını üst düzeye çıkarmak amacıyla, işlerin zamanında etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi için yöneticilerin otoritelerini, yaptırım güçlerini ve iş yaptırma yeteneklerini artırmak						
PERFORMANS HEDEFİ 2.1:	Beş yılın sonunda tüm personeli eğitilmiş ve bilgili kişiler haline getirmek,			20	19	10	47
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Eğitim ihtiyaçları, personel önerileri ve personel anket kararı Eğitim planı ve kayıtları, personel memnuniyet anketleri,yönetim beceri seviyesi Eğitimli ve yetkin yönetici, iş kalitesinde artış, memnuniyeti yüksek personel Eğitim planına tam uyum, şeffaf personel anketleri düzenleme Eğitim değerlendirmesi yapmak ve kaliteyi yükseltmek, personel anketler ve önerilerinde iyileştirmeler yapmak,						
Göstergenin kaynağı	2009 – 2013 Yılları Stratejik Eylem Planı						
Performans sonuçlarının analizi	10 adet Hizmet içi Eğitim tamamlanmıştır.						
Sapmanın nedeni	Dış Eğitimcilerin programa katılamaması.						
Sapmaya karşı alınacak önlem							

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE YILI :	2011	YILLAR					
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme	Hedekten Sapma %
HARCAMA BİRİMİ :	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
STRATEJİK AMAÇ 3 :	İdarenin tüm faaliyet ve etkinlikleriyle her türlü yatırım projelerinde halka yakınlaşmasını sağlamak, yapılan faaliyetleri ve yatırımları halka daha etkili bir şekilde duyurmak, kurumun tanıtım ve iletişim etkinliklerini başarıyla gerçekleştirmek						
PERFORMANS HEDEFİ 3.1:	Her yıl il özel idaresini tanıtan broşür hazırlamak.			4	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Halkta tanınırlık durumu Halkta tanınırlığın yüksek düzeyi çıkması Haklat tanınırlık çalışması yapılarak tanınırlığın yükseltilmesi Tanınırlık anketlerinin ve faaliyetlerinin etkin yapılması Tanınırlık faaliyetleri için toplantılarda yönetiminde görüşünü alarak doğru zaman ve süreci belirlemek						
Göstergenin kaynağı	Öz Kaynak						
Performans sonuçlarının analizi	2011 Yılında herhangi bir işlem yapılmamıştır.						
Sapmanın nedeni	-						
Sapmaya karşı alınacak önlem	-						

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU						
BÜTÇE YILI :	2011	YILLAR				
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2009	2010	2011 Hedef	2011	Hedeften
HARCAMA BİRİMİ :	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Sosyal Hizmet)	Gerçekleşme	Gerçekleşme		Gerçekleşme	Sapma %
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Korunmaya,bakıma veya yardıma muhtaç aile çocuk sakat,yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine süratli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	1-Çocuklarımızın il dışı nakillerinin önlenmesi ve aileleriyle ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde devamı için 50 çocuk kapasiteli 7-12 Yaş Çocuk Yuvasının açılması.2-Çocuklarımızın il dışı nakillerinin önlenmesi ve aileleriyle ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması.					
	1-Şiddet gören kadın ve genç kızlar için sığınma evi yapılması 2- Bakıma ve yardıma muhtaç kişilere yardım yapılması(Ulus İlçesi Çerde köyünde evi yanan vatandaşa malz.nakli için yakıt alınması) 3-Huzurevi binası onarımı 4- Gözde Birsöz Çocuk yuvası onarımı	2.039.16 TL	İlk kabul bölümü 2.116.80 TL	5.000,00 TL	2,116,80 TL 4.838,00 TL 85.904,10 TL	100 100 100
Göstergenin kaynağı	Stratejik plan ve çalışma programı					
performans sonuçlarının analizi	2011 yılı çalışma ve performans programında bulunan işler % 100 oranında tamamlanmıştır.					
Sapmanın nedeni						
Sapmaya karşı alınacak önlem						

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU						
BÜTÇE YILI :	2011	YILLAR				
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2009 Gerçekleşme	2010 Gerçekleşme	2011 Hedef	2011 Gerçekleşme	Hedeften Sapma %
HARCAMA BİRİMİ :	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ(Sağlık sektörü)					
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gereklerine uyumlu, kır- kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetlerinde hız ve kaliteyi artırmak,Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için kırsal kesim sağlık birimlerinin (Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri) fiziki ve teknolojik alt yapı eksiklikleri giderilecektir					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Yılı içinde yapılan Toplum ve Aile sağlığı merkezi sayısı 2- İçmesularında denetim yapılan köy sayısı(Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce klorlama cihazı takılmıştır.) 3-Yılı içinde onarım yapılan sağlık merkezi sayısı 4-Acil sağlık malz.alımı	100	19	19	100	100
Göstergenin kaynağı		5414.06	8.478.61		9.979.20	100
performans sonuçlarının analizi	Stratejik plan ve çalışma programı					
Sapmanın nedeni	Projelerden 1 adedinin ihalesi mali yıl sonuna gelmesi nedeniyle 2012 yılı programına alınmıştır.ihale öncesi işlemleri tamamlanmıştır. 1-Kumluca Toplum ve Aile Sağlığı Merkezi yapımı: Sağlık Bakanlığının 14.01.2010 tarih ve 425 sayılı talimatları ile Merkezden yapılacağından, İl Genel Meclisinin 03.03.2011 tarih ve 13 sayılı kararı ile performans programından çıkarılmıştır.. 2- Hasankadı beldesine Toplum ve Aile Sağlığı Mek.Yapımı :Arsanın İl Özel İdaresi adına tahsisi Defterdarlık Makamının 15.09.2011 tarihli ve 317 sayılı olurları ile uygun görüldü.İhale İşlemlerine başlandı.					
Sapmaya karşı alınacak önlem						

3- PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ			
BİRİMİ	HEDEFLenen FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SAYISI	ULAŞILAMAYAN FAALİYET SAYISI
Dış İlişkiler Müdürlüğü	80	79	1

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ			
BİRİMİ	HEDEFLenen FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SAYISI	ULAŞILAMAYAN FAALİYET SAYISI
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	17	17	0

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ			
BİRİMİ	HEDEFLenen FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SAYISI	ULAŞILAMAYAN FAALİYET SAYISI
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	3	3	0

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ			
BİRİMİ	HEDEFLenen FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SAYISI	ULAŞILAMAYAN FAALİYET SAYISI
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	13	10	3

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ			
BİRİMİ	HEDEFLLENEN FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SAYISI	ULAŞILAMAYAN FAALİYET SAYISI
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	9	8	1

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ			
BİRİMİ	HEDEFLLENEN FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SAYISI	ULAŞILAMAYAN FAALİYET SAYISI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	3	0

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ			
BİRİMİ	HEDEFLLENEN FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SAYISI	ULAŞILAMAYAN FAALİYET SAYISI
Sağlık İşleri Müdürlüğü	9	9	0

4- PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

31.12.2011 tarihi itibari ile İl Özel İdaresinin 2011 Yılı Programı ile Ek Programında toplam 154 adet hedefimiz olup, 2011 yılı içerisinde 20 adet hedefimiz ödenek yetersizliği, arsa temin edilememesi, kamulaştırma yapılamaması, zemin etüdü ve proje yapılamaması, Bakanlıktan aktarılan ödeneklerin yıl sonu itibari ile gelmesi gibi sorunlar nedeni ile gerçekleşmesi mümkün olmadığından İl Genel Meclisi Kararıyla programdan çıkarılmıştır.

Sonuç olarak;

İl Özel İdaresi tarafından tüm birimler itibariyle **toplam 134 adet hedef belirlenmiş olup, devam eden işlerle beraber 129 adet hedef gerçekleşmiş, 5 adet hedefe ulaşılamamıştır. Yılsonu itibariyle; devam eden işlerle beraber gerçekleşen hedef oranı % 96 ve gerçekleşemeyen hedef oranı ise % 4 olarak tespit edilmiştir.**

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNİN İCMALİ

BİRİMİ	HEDEFLenen FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN (Devan Edenler Dahil) FAALİYET SAYISI	ULAŞILA MAYAN FAALİYET SAYISI	ORANI %
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	80	79	1	99
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17	17	0	100
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	3	3	0	100
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	13	10	3	77
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	9	8	1	89
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	3	3	0	100
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9	9	0	100
TOPLAM	134	129	5	96

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER

B- ZAYIFLIKLAR

GÜÇLÜ YÖNLER	ZAYIF YÖNLER
❖ Üst Yönetimin (Vali) desteği.	❖ İl Özel İdaresi Gelirleri Yasasının çıkarılmaması nedeniyle kıt bütçe imkanlarıyla hizmet verilmesi.
❖ Kırsal Altyapıya yönelik yatırımlarının, İl Özel İdare kaynakları ile Başbakanlığımız tarafından yürütülen KÖYDES projesi kapsamında uygulanması.	❖ İl Nüfusunun % 66 oranında İl Özel İdaresinin doğrudan hizmet verdiği kırsal alanda yaşaması, dolayısıyla hizmet götürülmesi gereken ünite sayısının ve verilecek hizmet sayısının çok fazla olması nedeniyle maliyetlerin yüksek olması.
❖ Karar alma ve icra yetkisine sahip olunması	❖ Öz gelirlerin yetersiz olması nedeniyle kıt bütçe imkanlarıyla hizmet verilmesi.
❖ Kamusal altyapı için gerekli makine ve ekipmanın bakım onarımlarının yapılarak ve yeni makine ve ekipman alınarak araç ve makine parkının yenilenmesi nedeniyle % 80 oranında ekipmana sahip olunması.	❖ Mülga Köy Hizmetleri Müdürlüğü ile Mülga İl Özel İdare Müdürlüğünün birleşmesinden dolayı, nitelik ve nicelik olarak hizmet alanı ve çeşidi itibarıyla artan giderlere karşılık, İl Özel İdaresi gelirlerinin yetersiz düzeyde olması.
❖ İl Özel İdaresi mevcut kadro sayısının az olmasına rağmen, tüm personelin uyumlu, etkin ve disiplinli bir çalışma sergilemesi .	❖ Bölgedeki iklim ve coğrafi şartların özellikle yol ve içme suyu hizmetlerinin gerçekleşmesindeki olumsuz etkisi.
❖ Karar alma sürecinin kısılması ve karar organları ve yürütmenin uyumlu ve etkin bir çalışma ortamına sahip olması.	❖ Özlük haklar yönünden oluşan adaletsizliğin ortadan kaldırılması
❖ Müdürlüklerin idari ve teknik personel ihtiyaçlarının karşılanması için, sözleşmeli personel pozisyonunda teknik personel alınmış olunması	❖ Mevzuattaki hızlı değişmeye bağlı olarak uygulamada birçok tereddütle karşılaşılmaması

C- DEĞERLENDİRME:

1-) 5302 sayılı yasa ile oluşan İl Özel İdaresi; il sınırları ve belediye sınırları içinde görev ve sorumluluk alanları belli olan hizmetlerini yerine getirilebilmesi için, yasalarla belirtilen gelirlerin nitelik ve nicelik bakımından genişletilmesi zaruri ihtiyaç haline gelmiştir.

2-) 5302 sayılı yasanın 29. maddesi “Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir.” ve 35. maddesi “Genel Sekreter, İl Özel İdaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde düzenler ve yürütür.” ve 3. maddesi “İl Özel İdaresi il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan idari ve mali özelliğe sahip kamu tüzel kişisidir.” hükümleri gereğince, il sınırları içindeki Devlet Su İşleri ve Karayolları gibi kuruluşların yerinden yönetiminin sağlanabilmesi için, gerekli kaynakların temin edilerek ve İl Valisine bağlı olarak, İl Özel İdaresi çatısı altında toplanması hizmetlerdeki verimliliği, kaliteyi ve hızı artırmada oldukça önemli olacaktır.

3-) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin Kurumsal anlamada ilişkilerinin netleştirilmesi uygulamada yaşanan tereddüt, zorluk ve belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır. Görev, yetki ve sorumlulukların hızlı , yerinde ve zamanında yapılabilmesi için konu oldukça çok önem arz etmektedir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

A - ÖNERİLER :

1. Kurumsal stratejik planların, ilin stratejik planına dönüştürülmesi.
2. Performans ve Çalışma Programları hazırlanırken, stratejik planlar göz önünde bulundurulmalı, İl düzeyinde tüm kurum ve kuruluşların katılacağı İl Özel İdaresi odaklı yıllık Performans ve Çalışma Programlarının yapılması.
3. İlimiz sınırları içerisinde görev, yetki ve sorumluluk alanımızda olup, yapılması gereken hizmetlerin daha verimli, rantabl ve hızlı bir şekilde olabilmesi için, tüm sektörlerde il envanterlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve tek merkezde toplanılması, fiziki ve insan kaynakları ile araç ve gereçlerin hizmet alanlarına öncelikler belirlenerek tahsis edilmesi.
4. Norm kadro kriterlerinin gözden geçirilerek, Daire Başkanlıkları kadrolarının ihdas edilmesi.
5. İç Denetçi ve bir adet Genel Sekreter Yardımcısı kadrosunun tahsis edilmesi.
6. İl Özel İdaresi Gelirleri Yasasının çıkarılarak kaynakların artırılması ve idarenin mali açıdan güçlendirilmesinin sağlanması.
7. KÖYDES Projesinin devam etmesi ve ödeneklerin İl Özel İdaresi hesaplarına aktarılması.
8. 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 2 nolu cetvele eklenmesi.
9. Eğitim seminerlerinin artırılması.
10. 5902 sayılı yasa ile kurulan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin kadrolarının, İl Özel İdaresi kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu yasanın 25/e fıkrasında **(II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin 6- Mahalli İdareler ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda bölümüne “Boğaziçi İmar Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Afet ve Acil Durum Müdürü” ibaresi eklenmiştir.** hükmü yer almaktadır. İl Afet ve Acil Durum Müdürü ile İl Özel İdaresi Müdürlerinin gerek ek gösterge, yan ödeme ve gerekse özel hizmet tazminatları arasında ciddi derecede farklar bulunmakta olup, uygulamada eşitlik, adalet ve birlikteliğin sağlanabilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi Müdürleri tazminatları ile ilgili revize yapılması gerektiği düşünülmektedir.

B- TEDBİRLER:

1. Kıt kaynaklarla verilen hizmetlerin etkili, ekonomik ve verimli olabilmesi için ihtiyaçların öncelikli olanlarının belirlenmesi gerekmektedir.
2. Yol altyapısında 1 ve 2 inci grup köy yollarımızın standartlarının yükseltilmesi nedeniyle, İl Trafik Komisyonunca söz konusu yollarda hız ve tonaj tahdidinin belirlenmesi.
3. İlimiz yol ağının bir an önce tespit edilmesi.
4. Köy Yerleşik alanlarının tamamlanarak nüfus yoğunluğu fazla olan köylerimizin imar planlarının bir an önce bitirilmesi.
5. İl Özel İdaresinin, ilimiz yol ağının % 80'ine sahip olması nedeniyle, İl Özel İdaresi personelinin de İl Trafik Komisyonuna üye olarak katılması.
